

---

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



စီမံကိန်းနှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
(၂၀၁၇ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ မတ်လအထိ)

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁ နိဒါန်း	၅
၂ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း	၆
၃ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	၆
၄ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အပြီးသတ်ခြင်း	၉
၅ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ်များ အခြေပြမြေပုံ (MIS)	၁၀
၆ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပဉ္စမနှစ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အခြေပြဇယား(MIS)	၁၁
၇ စီမံကိန်းနှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်များ စာရင်း	၁၂
၈ လူထုသို့ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၃
၉ နှစ်အလိုက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှု	၁၅
၁၀ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေ	၁၆
၁၁ အသိပညာဗဟုသုတနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်းများ	၁၆
၁၂ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ	၂၄
၁၃ အခြေခံအဆောက်အဦးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ	၂၉
၁၄ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်း	၃၁
၁၅ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ	၄၇
၁၆ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၅၃
၁၇ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စီမံကိန်းစာရင်းများအား စစ်ဆေးခြင်း	၅၃
၁၈ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း	၆၃
၁၉ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ဝတ္တရားများ	၆၄
၂၀ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်များ	၆၇

၂၁	သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	၆၈
၂၂	စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၇၄
၂၃	နောက်ဆက်တွဲများ	၇၅
	နောက်ဆက်တွဲ (က) နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (၂၀၁၇) မှရရှိလာသော ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်များ	၇၆
	နောက်ဆက်တွဲ (ခ) လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (၂၀၁၇) မှရရှိလာသော ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်များ	၉၅
၂၄	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	

BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CARE	-	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
GDA	-	General Department of Administration
GWG	-	Gender Working Group
HH	-	Household
INGO	-	International Non-Government Organisation
M : F	-	Male to Female Ratio
M&E	-	Monitoring & Evaluation
MEB	-	Myanmar Economic Bank
MIS	-	Management Information System
MWF	-	Myanmar Women Federation
NCDD	-	National Community-driven Development
NGO	-	Non-Government Organisation
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
O&M	-	Operation and Maintenance
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
SIM	-	Subscriber Identifier Module
SPs	-	Sub Projects
TA	-	Technical Assistance
TOR	-	Terms of Reference
ToT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance

VDP	-	Village Development Plan
VL	-	Village Leader
VT	-	Village Tract
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTDP	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee
WB	-	World Bank

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

## နိဒါန်း

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများမှ အလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိရောက်လျှင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်း ပေးနိုင်စေရန်အတွက် နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၃/၁၄ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ် ၃ မြို့နယ်၊ ၂၀၁၄/၁၅ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်နှင့် ၂၀၁၅/၁၆ တွင် မြို့နယ် ၂၇ မြို့နယ်၊ ၂၀၁၆/၁၇ ခုနှစ် ၄၇ မြို့နယ် တို့ တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာသည် စတုတ္ထနှစ် ရာသီစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးမှ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဧပြီလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ မတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း ၁၂ လဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းရာသီစက်ဝန်းသည် အောက်တိုဘာလမှ စတင်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိ စီမံကိန်းမြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်ပါဝင်သည်။ ထိုမြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်နှင့်အတူ နောက်ထပ် မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်အပါအဝင် စုစုပေါင်း မြို့နယ် ၆၃ မြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၌ မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသာ ဤအစီ ရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည်။

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိရောက်လျှင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်စေရန်အတွက် နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန် တို့ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၃/၁၄ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ် ၃ မြို့နယ်၊ ၂၀၁၄/၁၅ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်၊ ၂၀၁၅/၁၆ တွင် မြို့နယ် ၂၇ မြို့နယ်နှင့် ၂၀၁၆/၁၇ တွင် မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ် တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

၃။ ယခုအစီရင်ခံစာသည် စတုတ္ထနှစ် ရာသီစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးမှ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဧပြီလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ မတ်လ ၂၀၁၈ အထိ စုစုပေါင်း ၁၂ လဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းရာသီစက်ဝန်းသည် အောက်တိုဘာလမှ စတင်ပြီး ခုနှစ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိ စီမံကိန်းမြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်ပါဝင်သည်။ မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်နှင့်အတူ နောက်ထပ် မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်အပါအဝင် စုစုပေါင်း မြို့နယ် ၆၃ မြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထနှစ် ရာသီစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၌ မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်၏

လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဤအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည်။ အစီရင်ခံစာပြုစုချိန်တွင် ကျန်သောမြို့နယ် အသစ် ၁၆ မြို့နယ်၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မစတင်ရသေးပါ ။

- (က) အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ၊
- (ခ) အောင်မြင်မှုများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် စွန့်စားမှုများ၊
- (ဂ) လာမည့်ပဉ္စမနှစ် နှစ်ရာသီစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် တို့ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို အပိုင်း ၅ ပိုင်းအောက်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများ စသည်ဖြင့် စုစည်းထားသည်။

- (က) လူထုသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၊
- (ခ) နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
- (ဂ) ဗဟုသုတနှင့် သင်ယူခြင်း၊
- (ဃ) အကောင်အထည်ဖော်ထောက်ပံ့ခြင်း နှင့်
- (င) အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တို့ပါဝင်ပါ သည်။

**ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း**

၄။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန် အထိ စီမံကိန်းမြို့ (၄၇)မြို့နယ်အတွက် စတုတ္ထနှစ် ရာသီစက်ဝန်းတွင် သတ်မှတ်ရန်ပုံငွေ ၆၇၉၃၀ သန်းတွင် မြို့နယ်များသို့ ၆၇၃၈၀ သန်း လွှဲပေးခြင်းပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် ၉၉% လွှဲပြောင်းပြီး စတုတ္ထနှစ်အတွက် ကျန်ငွေကျပ်မှာ ၁၀၃၀ သန်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကျေးရွာအုပ်စုများအတွက် ပျက်စီးသွားသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား ထပ်တိုးထောက်ပံ့ရန် ရန်ပုံငွေထားရှိပါသည်။

၅။ စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၈၀)နှင့် ခကျေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း(၄၀၀)၊ အီတလီဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအေဂျင်စီ (AICS)မှ Soft Loan ယူရှိသန်း (၂၀)နှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၂)သန်းနှင့် DFD SWAP Programme မှထောက်ပံ့မည့် မြန်မာကျပ်ငွေ (၃.၁၀၆) ဘီလီယံနှင့် နိုင်ငံတော်မှထည့်ဝင်ငွေ (၁)နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅)သန်းနှုန်းဖြင့် (၆)နှစ်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၄၁)သန်း၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၄၆)သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၆) သန်းသုံးစွဲခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၄)ခုအထိ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း**

၆။ PRA-Toolsကို အခြေခံ၍ရေးဆွဲသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (၈၅၆၆)ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၀၀၀)ကျော်ကို ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၇၆၇၀)ခု ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၁၄၇၀၀)ကျော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၇။ စီမံကိန်း(၄၇)မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ခြင်းကကြောင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း(၁.၄)သန်းနှင့် လုပ်အားခအနေဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ (၇.၂)ဘီလီယံကျော် သုံးစွဲခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြု ချက်ပေါင်း (၉၃၄၈)ခု လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး (၉၂၆၀) ကျော် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါ သောကြောင့်ဝံ့ စီမံကိန်းတွင် ကျား/မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကို အဓိကအလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်နိုင်ခွင့်နှင့် တန်းတူ လုပ်အားခများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ စီမံကိန်းမြို့နယ်များမှ ကျေးရွာလူဦးရေ (၂)သိန်းကျော်အား သင်တန်းပေါင်း(၆၀၀၀)ကျော် ပို့ချခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးဦးရေ (၅၀.၂%) ကျော် သင်တန်းများရရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးချိန်၌ ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ၊ ရွေးချယ်ပုံ၊ မကျေနပ်ချက်ဖြေရှင်းပုံများ စသည့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းများနှင့် နောက်လာမည့် စီမံကိန်းနှစ်မှာ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေနပ်အားရမှု (၉၇%)နှင့် မကျေနပ်မှု(၃%)ခန့်ဖြင့် လူထုစစ်ဆေးပွဲ (၇၆၆၄)ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အကူအညီဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကျေးရွာ၏ငွေစာရင်း (၁၀%) ကျော်ကို စာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၉။ စတုတ္ထနှစ် အတွင်းဝေဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်း ၂၀၂၂ အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ ၈၅၆၃ ရွာတွင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည် -

- (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ပေါင်း ၈၅၆၆ ခု ပြီးစီးပါသည်။
- (ခ) သက်မှတ် ထားသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၇၆၈၈ ခုတွင် ၇၆၈၂ ခုအား TPIC ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) ခွင့်ပြုသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၆၈၂ ခု တွင် ၇၆၈၂ခု အား ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၆၇၀ ခု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၇၆၅၇ ခုအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (စ) ပြီးစီးသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၇၆၇၀ ခုမှ လုပ်ငန်းခွဲ ၇၆၆၄ ခုအား လူထုစစ် ဆေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၀။ ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ် ၄၅ မြို့နယ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်ထိ အောက်ပါ လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည် -

- (က) ကျေးရွာ ၈၀၆၄ ရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါသည်။



- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၆၃၆၈ ခုအား TPIC ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၄၇၇၅ ခုအား ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၁၂၁၃ ခု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၁၁။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားမှုအား အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည် -

**နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေပြဇယား**

Milestone / Parameter	ပထမနှစ် (၂၀၁၃/၁၄)	ဒုတိယနှစ် (၂၀၁၄/၁၅)	တတိယနှစ် (၂၀၁၅/၁၆)	စတုတ္ထနှစ် (၂၀၁၆/၁၇)	ပဉ္စမနှစ် (၂၀၁၇/၁၈)		စုစုပေါင်း (ပဉ္စမနှစ်)
					45 old tns	16 new tns	
မြို့နယ်အရေအတွက်	3	၉	၂၇	၄၇	၄၅	၁၆	၆၁
ကျေးရွာအုပ်စု အရေအတွက်	၇၂	၃၄၃	၁၂၀၁	၂၀၂၂	၂၀၂၂	၆၆၂	၂၆၈၄
ကျေးရွာအရေအတွက်	၄၁၀	၁၇၂၇	၅၄၀၀	၈၅၆၃	၈၅၆၂	၃၄၅၂	၁၂၀၁၄
ရန်ပုံငွေ လွှဲပခြင်းပေးမှု							
ရန်ပုံငွေတောင်းခံသည့် ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	၇၂	၃၄၃	၁၁၉၆	၂၀၀၅	၁၉၆၃	၀	၂၀၀၅
ရန်ပုံငွေလက်ခံရရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	၇၂	၃၄၃	၁၁၉၆	၂၀၀၅	၁၉၆၂	၀	၂၀၀၅
ငွေကျပ်သန်း	၁၅၇၀	၁၀၄၆၀	၃၅၇၂၀	၆၇၃၈၀	၆၆၀၅၆	၀	၁၇၄၉၀၀
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ရေးဆွဲထားရှိမှု	၃၉၂	၁၇၀၁	၅၂၆၁	၈၂၄၀	၈၀၆၄	၀	၈၀၆၄
မြို့နယ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီခွင့်ပြုပြီး	၃၆၄	၁၈၃၇	၄၇၆၂	၇၆၈၂	၆၃၆၈	၀	၂၁၀၀၂
ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ရေး ဆွဲမှု	၃၅၇	၁၈၁၅	၄၇၃၅	၇၆၈၂	၄၇၇၅	၀	၁၉၃၅၂
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်မှု							
1-50%					၂၂၂၂	၀	
51-75%					၇၈၇	၀	

76-90%						၁၁၈၀	၀	
100%	၃၅၇	၁၈၁၂	၄၇၃၁	၇၆၇၁	၁၂၁၃	၀		၁၅၇၈၃
စီမံကိန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	၃၅၇	၁၈၁၂	၄၇၂၄	၇၆၅၇	၆၀၄	၀		၁၄၅၁၅
လူထုစစ်ဆေးခြင်း	၁၅၀	၁၆၀၅	၄၆၉၄	၇၆၆၄	၅၇၆	၀		၁၃၈၄၉
မြို့နယ် အဆင့် MSR ဆောင်ရွက်မှု	၃	၉	၂၆	၄၇				၈၅
မြို့နယ် အဆင့် MSR ဆောင်ရွက်မှု	1	1	1	1				4

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အပြီးသတ်ခြင်း**

၁၂။ စတုတ္ထနှစ်ရာသီစက်ဝန်း၏ မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်ခြင်းအခြေအနေကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဇယား တွင်ဖော်ပြထား သည်။ ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-


- (က) လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး(လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ) မှာ ၅၅.၈ %၊
- (ခ) ပညာရေး (ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ကျောင်းအတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အပံ့များ) ၁၃.၈%၊
- (ဂ) ရေရရှိရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ၁၅ %၊
- (ဃ) ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၀.၄၁%၊
- (င) စွမ်းအင် (လျှပ်စစ်မီး၊အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်) ၆.၃၃%၊
- (စ) ကျေးရွာလူထုအသုံးအဆောင် ၅.၃%၊
- (ဆ) အခြားလုပ်ငန်းများမှာ ၃.၁၉%ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၃။ မြို့နယ်အသစ် ၁၆ မြို့နယ်မှ ၇ မြို့နယ်မှာ စီမံကိန်းစတင်မှု နောက်ကျခဲ့ပြီး အခြားမြို့နယ်များထက် လုပ်ငန်းစတင်မှု နောက်ကျခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအပြီးသတ်ရန်အတွက် နမ့်ဆန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ၂၀၁၈ တွင် အပြီးသတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၄။ အစီရင်ခံသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကျန်သောမြို့နယ် အသစ် ၁၆ မြို့နယ်၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ မစတင်ရသေးပေ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို အပိုင်း ၅ ပိုင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်-

- (၁) လူထုသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၊
- (၂) အထောက်အပံ့နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
- (၃) ဗဟုသုတနှင့် သင်ယူခြင်း၊
- (၄) အကောင်အထည်ဖော်ထောက်ပံ့ခြင်း နှင့်
- (၅) အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တို့ပါဝင်ပါ သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်မြို့နယ်များ အခြေပြ မြေပုံ (MIS)

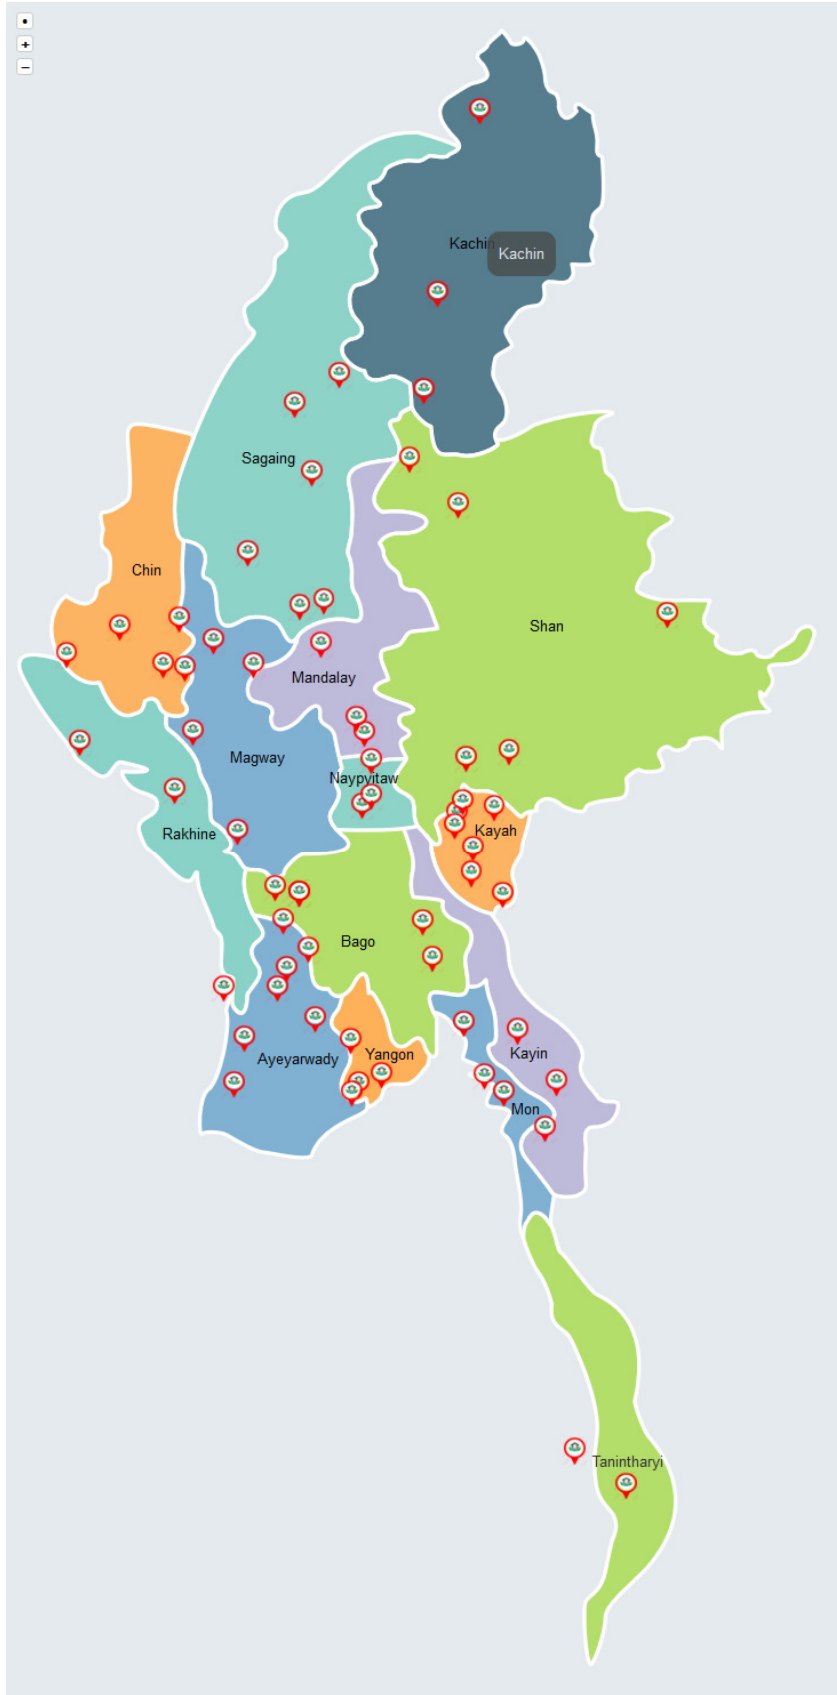

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပဉ္စမနှစ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အခြေပြဇယား (MIS)

	Current Year (2017/2018)	Cumulative
Townships	61	61
Village Tracts	2,755	2,755
Villages	12,279	12,279
Beneficiaries - # million	5.58	5.58
Beneficiaries - % female	51.6	51.3
Block Grants - MMK billion	69.31	184.44
# Sub-Projects - Approved TPIC	6,772	21,385
# Sub-Projects - Completed	2,700	17,264
Community Participation - %	59.08	74.77
Committee Membership - #	101,406	323,633
Committee Membership - % female	48.91	39.85
Grievances - # submitted	1,980	13,570
Grievances - % resolved or addressed	95	98.1
Involvement in CFA - Labour days	1,009,852	3,784,900
Involvement in CFA - Wages - MMK billion	1.87	16.62

စီမံကိန်းနှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်များ စာရင်း

ပထမနှစ် စက်ဝန်း မြို့နယ်	ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း မြို့နယ်	တတိယနှစ် စက်ဝန်း မြို့နယ်	စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း မြို့နယ်	ပဉ္စမနှစ် စက်ဝန်း မြို့နယ်
ကန်ပက်လက်	စေတုတ္ထရာ	ဖရူးဆို	မိုးကောင်း	ပူတာအို
နန်ဆန်	ပင်လည်ဘူး	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	လှိုင်ကော်+ရှားတော	ရွှေကူ
ကျွန်းစု	ထန်းတပင်	မိုးညို	ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ +မယ်စုံ	လှိုင်ဘွဲ့
	တပ်ကုန်း	ခကျောင်းဆုံ	မတူပီ	ကော့ကရိတ်
	လေးမျက်နှာ	ငါန်းဇွန်	ပန်းတောင်း	တွန်းဇံ
		ဒီမောဆို	ဆော	ကျွန်းလှ
		ပလက်ဝ	ထီးလင်း	ကနီ
		မြောင်	ပေါက်	သဲကုန်း
		ဗန်းမောက်	နွားထိုးကြီး	ရွှေကျင်
		တနင်္သာရီ	ပျော်ဘွယ်	မိုင်းခက်
		ကျောက်ကြီး	ရမည်းသင်း	မောက်မယ်
		ဘီးလင်း	ပေါင်	မဘိမ်း
		မင်းတုန်း	ကွမ်းခြံကုန်း	ပုဏ္ဏားကျွန်း
		ညောင်ဦး	ကျောက်တန်း	ဂွ
		ကော့မှူး	ဆီဆိုင်	ဓနုဖြူ
		သာပေါင်း	ငပုတော	အင်္ဂပူ
		ကြံခင်း	ပျဉ်းမနား	
		လယ်စေး		

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေအား အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

	ပထမနှစ်		ဒုတိယနှစ်		တတိယနှစ်		စတုတ္ထနှစ်		ပဉ္စမနှစ်	
	အရေအတွက်	%	အရေအတွက်	%	အရေအတွက်	%	အရေအတွက်	%	အရေအတွက်	%
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၂၆	၃၅%	၇၄၃	၄၁%	၂၃၀၃	၅၀%	၄၂၈၆	၅၆%	၂၄၂၄	၅၁%
ရေပေးရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး	၆၉	၁၉.၃%	၄၁၅	၂၃%	၉၇၇	၂၀%	၁၁၅၄	၁၅%	၅၂၃	၁၁%
ပညာရေး	၁၁၈	၃၃%	၄၃၄	၂၄%	၉၆၁	၁၉%	၁၀၆၁	၁၃%	၈၀၈	၁၇%
လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	၂၆	၇%	၁၄၂	၇.၈%	၂၀၆	၄.၂%	၄၈၆	၆%	၃၃၃	၇%
ကျေးရွာအသုံးအဆောင်	၁၅	၄%	၄၉	၃%	၁၃၅	၂%	၄၁၀	၅%	၄၂၈	၉%
ကျန်းမာရေး					၃၃	၀.၁%	၃၂	၀.၄%	၀	၀%
အခြားအဆောက်အဦး					၅၅	၀	၆၅	၂%	၄၇	၁%
အခြား	၃	၀.၈%	၂၉	၂%	၆၁	၂%	၁၈၀	၃%	၁၉၀	၄%
Total	၃၅၇	၁၀၀%	၁၈၁၂	၁၀၀%	၄၇၃၁	၁၀၀%	၇၆၄၂	၁၀၀%	၄၇၅၃	၁၀၀%

**လူထုသို့ထောက်ပံ့ခြင်း**

၁၆။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းနှင့် ပဉ္စမနှစ်စက်ဝန်း မတ်လကုန်အထိ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သည့် ရန်ပုံငွေ အခြေပြ ဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအရေ	ရန်ပုံငွေ လွှဲပေးခြင်းပြီး ငွေကျပ်(သန်း)
-----	----------	---------------	------------	--

		အရေ အတွက်	အတွက်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်
၁	ကန်ပက်လက်	26	123	572	
၂	ကျွန်းစု	20	163	1606	
၃	နမ့်ဆန်	26	123	264	368
၄	အမ်း	29	229	1140	1,140
၅	ထန်းတပင်	54	245	1670	1670
၆	လေးမျက်နှာ	41	271	1370	1370
၇	ပင်လည်ဘူး	52	266	1444	1444
၈	စေတုတ္တရာ	46	118	1012	1012
၉	တပ်ကုန်း	49	188	1948	1948
၁၀	ကြံခင်း	30	255	920	920
၁၁	သာပေါင်း	67	392	1910	1910
၁၂	ကျောက်ကြီး	25	91	1156	1156
၁၃	မိုးညို	36	214	1444	1,466
၁၄	ပလက်ဝ	96	383	2134	2,112
၁၅	ဒီမော့ဆို	26	172	864	864
၁၆	ဖရူးဆို	14	116	346	346
၁၇	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	51	327	2272	2,488
၁၈	တနင်္သာရီ	19	176	1018	1,034
၁၉	ဗန်းမောက်	47	219	1220	1220
၂၀	မြောင်	48	81	1314	1314
၂၁	မင်းတုန်း	72	179	1584	1584
၂၂	ငါန်းဇွန်	44	158	1592	1,652
၂၃	ညောင်ဦး	74	220	2546	2,598
၂၄	ဘီးလင်း	51	216	2094	1,974
၂၅	ခကျောင်းဆုံ	43	78	1568	1,568
၂၆	လယ်စေး	60	261	2822	2,868
၂၇	ကော့မှူး	55	136	1506	1,506
၂၈	ငပုတော	67	337	2746	2,768
၂၉	ပန်းတောင်း	40	208	1322	1,344
၃၀	မတူပီ	62	150	1364	1,364
၃၁	မိုးကောင်း	36	79	1268	1,290
၃၂	ဖားဆောင်း	18	88	486	486
၃၃	ဘော်လခဲ				
၃၄	မယ်စုံ				

၃၅	လွိုင်ကော်	15	137	848	848
၃၆	ရှားတော				
၃၇	ဆော	63	117	1408	1408
၃၈	ထီးလင်း	71	93	1562	1562
၃၉	ပေါက်	67	257	2306	2,350
၄၀	ပေတော်ဘွယ်	75	317	2674	2,712
၄၁	နွားထိုးကြီး	64	191	2272	2,288
၄၂	ရမည်းသင်း	63	249	2610	2,708
၄၃	ပေါင်	49	155	2042	2,102
၄၄	ပျဉ်းမနား	29	139	1164	1,200
၄၅	ဆီဆိုင်	13	322	1430	1,490
၄၆	ကွမ်းခြံကုန်း	43	130	1220	1,242
၄၇	ကျောက်တန်း	44	78	1318	1,340

**နှစ်အလိုက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှု**

၁၇။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအား ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အထိ သုံးစွဲပြီးစီးမှုမှာ ထောက်ပံ့ငွေအနေဖြင့် ကျပ် (၇၉၄၄၆.၂၆၆)သန်း၊ အခကြေးငွေအနေဖြင့် ကျပ် (၉၄၃၄၅.၇၀၇) သန်း စုစုပေါင်း ကျပ် (၁၇၃၇၉၁.၉၇၃) သန်း ဖြစ်ပါသည်။

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေခေါင်းစဉ်အလိုက် သုံးစွဲမှုစာရင်း**

စဉ်	အပိုင်း	အကခြောင်းအရာ	၂၀၁၂-၂၀၁၃	၂၀၁၃-၂၀၁၄	၂၀၁၄-၂၀၁၅	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၂၀၁၆-၂၀၁၇	စုစုပေါင်း (ကျပ်သန်း)
၁	အပိုင်း (၁)	ကျေးရွာထောက်ပံ့ငွေ	-	၁၅၅၇.၈၃	၁၀၂၂၅.၂၄	၁၆၁၂၃.၂၁၂	၁၇၈၀၀.	၄၅၇၀၆.၂၈
၂	အပိုင်း (၂)	စည်းရုံးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်	၁.၄၁၂	၅၆၅.၉၉	၂၀၃၅.၃၉၆	၅၁၂၂.၄၈၉	၁၀၄၉၄.၃၁၆	၁၈၂၁၉.၆
၃	အပိုင်း (၃)	အထွေထွေဗဟုသုတနှင့် သင်ယူမှု	-	၁၁.၂၇၉	၂၄၀.၀၈၉	၄၆၂.၉၇၇	၅၈၀.၀၄၉	၁၂၉၄.၃၉
၄	အပိုင်း (၄)	အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု	၄၈.၅၉၂	၃၆၉.၄၂၆	၁၅၃၈.၁၀၉	၄၇၀၃.၅၀၉	၇၅၆၆.၃၅၁	၁၄၂၂၅.၉၉
		<b>စုစုပေါင်း (ထောက်ပံ့ငွေ)</b>	<b>၅၀.၀၀၄</b>	<b>၂၅၀၄.၅၃</b>	<b>၁၄၀၃၈.၈၃</b>	<b>၂၆၄၁၂.၁၈၇</b>	<b>၃၆၄၄၀.၇၁၆</b>	<b>၇၉၄၄၆.၂၆၆</b>
၁	အပိုင်း (၁)	ကျေးရွာထောက်ပံ့ငွေ	-	-	-	၅၅၀၀.	၅၈၂၀၈.၂၇၀	၆၃၇၀၈.၂၇
၂	အပိုင်း (၂)	စည်းရုံးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်	-	-	-	၆၇၂.၇၄၉	၁၈၈၀၇.၆၃၆	၁၉၄၈၀.၃၈၅



၃	အပိုင်း (၃)	အထွေထွေဗဟုသုတနှင့် သင်ယူမှု	-	-	-	၃၀.၆၂၁	၉၇၂.၄၈၈	၁၀၀၃.၁၀၉
၄	အပိုင်း (၄)	အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု	-	-	-	၂၈၆.၅၈၄	၉၈၆၇.၃၅၉	၁၀၁၅၃.၉၄၃
	<b>စုစုပေါင်း (ခကျေးငွေ)</b>					<b>၆၄၈၉.၉၅၄</b>	<b>၈၇၈၅၅.၇၅၃</b>	<b>၉၄၃၄၅.၇၀၇</b>
	<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၅၀.၀၀၄</b>	<b>၂၅၀၄.၅၃</b>	<b>၁၄၀၃၈.၈၃</b>	<b>၃၂၉၀၂.၁၄၁</b>	<b>၁၂၄၂၉၆.၄၆၉</b>	<b>၁၇၃၇၉၁.၉၇၃</b>

**ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေ**

၁၈။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖြန့်ဝေပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြစ်သည့်ဘက်ဂျက်နှစ်အသစ်အတွက်လွတ်တော်သို့ အဆိုပြုတင်ပြထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၆ လ ဘက်ဂျက်ဖြစ်သည့် ၂၀၁၈ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အတွင်း ကွာဟချက်များကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခဲ့ ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်ကာလအတွင်း ဘဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံ (၂)ဦးအားခန့်ထားခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးမှာ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင် တာဝန်ဆောင်ပြီး တစ်ဦးမှာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်း (၁၉)ဦးအား နေပြည်တော်တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် လန်ဒန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ (LCCI) စာရင်းကိုင် သင်တန်း တတ်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်အသစ်များအတွက် စုစုပေါင်း သင်တန်းများတွင် ဘဏ္ဍာရေးသင်တန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Accounting Software ၏ Payroll and Asset Management module သင်တန်းအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ထမ်းများအား ပို့ချ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းများတွင် ထည့်သွင်းပို့ချရန်အတွက် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ထားသည့် စီမံကိန်းလက်စွဲ အခန်း(၆)နှင့် နောက်ဆက်တွဲအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးပို့၍ အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အီတလီနိုင်ငံ အခြေစိုက်ငွေအတွက် ဘဏ်အကောင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ပထမအကြိမ် ငွေတောင်းလွှာအား စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

**အသိပညာဗဟုသုတနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်းများ**

၁၉။ ပဉ္စမနှစ် စက်ဝန်းအတွင်း အောက်ပါသင်တန်းများအား ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည် -  
 (က) Project Cycle Management (PCM) သင်တန်းအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်းဆရာများအား နိုဝင်ဘာလအတွင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

- (ခ) Project Management Fundamentals သင်တန်းအား နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ ပခုက္ကူနှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် အောက်တိုဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) NCDD Management Training အား နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလများအတွင်း ပို့ချခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) Gender and Grievance refresher Training အား မြို့နယ်များသို့ ၅ ရက်သင်တန်း ပို့ချခဲ့ပါသည်။
- (င) NCDD Management Training အား မြို့နယ်အသစ် (၁၆)မြို့နယ်သို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လည်းကောင်း၊ Refresher Training များအား ပဉ္စမနှစ် စက်ဝန်းမတိုင်မီ ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (စ) NCDD Startup Training မြို့နယ်အသစ် (၁၆)မြို့နယ်မှ (၁၂)မြို့နယ်အား ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (ဆ) TTF 1 Training ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်တွင် ပို့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ToF 1, ToF 2 Training များအား မြို့နယ် အဟောင်း၄၅ မြို့နယ်တွင် ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ Community Management Training အား မြို့နယ် အဟောင်း (၄၅)မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအဆင့်ကော်မတီဝင်များသို့ ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀။ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း(၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၁၇၊ဇူလိုင်လ အထိ) သင်တန်းပို့ချခဲ့မှုများ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စီမံကိန်း (၄၇)မြို့နယ်လုံး၏ သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ များအား အောက်ဖော်ပြပါဇယားများဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည် -

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း (၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင်လ အထိ ) သင်တန်းပို့ချခဲ့မှုအခြေအနေ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သင်တန်း အကြိမ်ရေ	တက်ရောက်သူဦးရေ								မှတ်ချက်	
			ကျေး လက် ဦးစီး	နည်းပညာ အကြံပေး	လူထု စည်းရုံးရေးမှ ပူး	လက် ထောက် နည်း ပညာမှူး	ကျေးရွာ ကော်မတီ	ကျေးရွာ လူထု	အခြား	တက်ရောက် သူဦးရေ စုစုပေါင်း		ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်း
၁	ပြည်ထောင်စု အဆင့် သင်တန်း	၁	၃၁	၁၈						၄၉	၈၅၁၃၅၀	
၂	ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်သင်တန်း	၂	၂	၁		၂၈				၃၁		
၃	မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်း	၂၁၁	၅၄၉	၅၅၈	၄၇၉၇	၃၃၀၆			၂၁	၉၂၃၁	၅၃၅၈၇၇၃၂	
၄	ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်း	၃၄၆၀	၃၁	၃၄	၁၇၉	၉	၇၆၂၆၈	၄၈၀၀၄		၁၂၄၅၂၅	၉၅၉၀၄၀၆၅	
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၃၆၇၄</b>	<b>၆၁၃</b>	<b>၆၁၁</b>	<b>၄၉၇၆</b>	<b>၃၃၄၃</b>	<b>၇၆၂၆၈</b>	<b>၄၈၀၀၄</b>	<b>၂၁</b>	<b>၁၃၃၈၃၆</b>	<b>၁၅၀၃၄၃၁၄၇</b>	

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**  
**၂၀၁၇ ခုနှစ် စီမံကိန်း (၄၇) ဖြန့်ဖြူးလုံး၏ သင်တန်းပို့ချမှု အခြေအနေ အနှစ်ချုပ်**

စဉ်	သင်တန်းအမည်	သင်တန်းအကြိမ်ရေ				(DRD)		(TTA)		(CF)		(TF)		ကော်မတီ		ကျေးရွာ		အခြား		စုစုပေါင်း			ကုန်ကျစရိတ်
		တိုင်း/ ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	TOF-1	၀	၄၅	၀	၀	၆၁	၁၀၅	၁၀၃	၇၃	၆၃၀	၅၄၅	၂၉၃	၄၁၆	၀	၀	၀	၀	၀	၁	၁၀၈၇	၁၁၄၀	၂၂၂၇	၂၅၇၁၉၅၁
၂	TOF-2	၀	၃၃	၀	၀	၅၆	၈၈	၇၈	၅၃	၄၆၄	၄၄၃	၂၀၄	၃၃၀	၀	၀	၀	၀	၂	၂	၈၀၄	၉၁၆	၁၇၂၀	၁၁၉၁၈၂၅၆
၃	TOF-3	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၄	TTF-1	၁	၁၉	၀	၀	၁၁	၁၇	၁၁	၁၄	၁၂၈	၁၁၀	၁၃၁	၂၁၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၂၈၁	၃၅၁	၆၃၂	၃၁၄၄၇၀၀
၅	TTF-2	၂	၆	၀	၀	၅	၈	၆	၃	၃၈	၅၀	၄၂	၇၇	၀	၀	၀	၀	၁	၁	၉၂	၁၃၈	၂၃၀	၂၉၆၆၀၀
၆	Infra-refresher Training	၀	၃	၀	၀	၃	၁	၀	၂	၂၄	၁၉	၁၈	၂၆	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၄၅	၄၈	၉၃	၁၄၈၇၀၀
၇	EMP/Ecops	၀	၁	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၆	၇	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၆	၇	၁၃	၀
၈	Finance	၀	၂၃	၀	၀	၁၀	၁၃	၁၇	၁၄	၂၁၇	၁၉၁	၁၉၆	၂၁၈	၀	၀	၀	၀	၁	၂	၄၄၁	၄၃၈	၈၇၉	၁၄၂၉၁၅၀
၉	M&E,MIS insert tablet	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၁၀	M&E,MIS	၀	၁၃	၀	၀	၁၂	၁၈	၁၉	၁၅	၁၅၁	၁၃၃	၆၂	၉၄	၀	၀	၀	၀	၁	၂	၂၄၅	၂၆၂	၅၀၇	၈၄၈၇၈၃
၁၁	Gerivance	၀	၁၃	၀	၀	၉	၁၀	၁၁	၁၃	၁၆၉	၁၄၃	၇၆	၁၀၉	၀	၀	၀	၀	၁	၂	၂၆၆	၂၇၇	၅၄၃	၇၆၄၁၂၃
၁၂	Procurement	၀	၂၀	၀	၀	၁၃	၂၆	၂၆	၂၀	၂၄၀	၂၂၄	၁၃၂	၁၇၃	၀	၀	၀	၀	၁	၂	၄၁၂	၄၄၅	၈၅၇	၁၉၇၀၄၅၁
၁၃	Gender	၀	၂၄	၀	၀	၂၈	၃၂	၂၄	၂၉	၃၇၀	၂၇၉	၁၅၆	၂၂၃	၀	၀	၀	၀	၁	၂	၅၇၉	၅၆၅	၁၁၄၄	၃၅၀၃၃၂၈
၁၄	Communication	၀	၆	၀	၀	၁	၉	၁၀	၅	၇၁	၆၇	၃၂	၅၂	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၁၁၄	၁၃၃	၂၄၇	၅၄၄၁၀၀

စဉ်	သင်တန်းအမည်	သင်တန်းအကြိမ်ရေ				(DRD)		(TTA)		(CF)		(TF)		ကော်မတီ		ကျေးရွာ		အခြား		စုစုပေါင်း			ကုန်ကျစရိတ်	မှတ်ချက်		
		တိုင်း/ ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ကျား	မ	ပေါင်း				
၁၅	Auto CAD	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀		
၁၆	Video Editing	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀		
၁၇	PSC	၀	၁၄	၁၇၄	၂၁၇	၆	၀	၃	၂	၈	၇	၀	၀	၄၀၉၄	၃၁၀၉	၄၅၂၃	၂၈၉၃	၀	၀	၈၆၃၄	၆၀၁၁	၁၄၆၄၅	၉၄၄၅၁၇၅			
၁၈	MSC	၀	၆	၇၀	၁၇၇	၆	၁	၁	၇	၃၀	၁၆	၆	၀	၁၇၄၇	၁၄၆၆	၄၅၂၃	၂၈၉၃	၀	၀	၆၃၁၃	၄၃၈၃	၁၀၆၉၆	၃၁၃၄၄၇၅			
၁၉	FSC	၀	၅၄	၁၁၁	၂၀၅	၄	၉	၃	၁၀	၁၀	၁၀	၀	၀	၃၇၅၁	၂၇၃၃	၄၅၂၃	၂၈၉၃	၀	၀	၈၂၉၁	၅၆၅၅	၁၃၉၄၆	၇၉၀၉၀၇၀			
၂၀	O&M	၀	၁	၀	၂၉၄	၀	၀	၀	၁	၈	၁၄	၇	၆	၉၆၉	၇၃၆	၄၅၂၃	၂၈၉၃	၀	၀	၅၅၀၇	၃၆၅၀	၉၁၅၇	၈၉၉၇၀၀			
၂၁	CMT	၀	၀	၄၃၅	၃၆၇	၁	၀	၁	၂	၁၇	၁၅	၂	၁	၁၉၃၈၄	၁၈၂၈၅	၃	၀	၀	၀	၁၉၄၀၈	၁၈၃၀၃	၃၇၇၁၁	၆၄၀၈၆၀၄၅			
၂၂	Gerivance(village)	၀	၁	၅၇	၁၇၇	၁	၀	၀	၁	၈	၇	၀	၀	၁၆၀၉	၁၃၃၈	၄၅၂၃	၂၈၉၃	၀	၀	၆၁၄၁	၄၂၃၉	၁၀၃၈၀	၁၂၀၈၀၀			
၂၃	Gender (village)	၀	၀	၈	၁၀၂၀	၃	၀	၀	၄	၂၂	၂၉	၀	၀	၈၈၀၁	၈၂၄၆	၆၁၄၆	၄၇၇၅	၀	၀	၁၄၉၇၂	၁၃၀၅၄	၂၈၀၂၆	၉၂၀၈၈၀၀			
၂၄	ESMF	၀	၁	၀	၀	၂	၃	၂	၂	၁၆	၁၄	၆	၇	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၂၆	၂၆	၅၂	၅၆၄၀၀			
၂၅	Team Management	၀	၁	၀	၀	၂	၃	၃	၂	၁	၁	၁	၁	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၇	၇	၁၄	၂၀၄၀၄၀၀			
၂၆	EPC	၀	၁	၀	၀	၁	၄	၃	၀	၁၉	၁၈	၁၀	၁၃	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၃၃	၃၅	၆၈	၁၂၀၀၂၀၀			
	စုစုပေါင်း	၃	၂၀၅	၉၂၈	၂၄၅၇	၂၃၅	၃၄၇	၃၂၁	၂၇၂	၂၆၄၁	၂၃၃၅	၁၃၈၀	၁၉၆၃	၄၀၃၅၅	၃၅၉၁၃	၂၈၇၆၄	၁၉၂၄၀	၈	၁၃	၇၃၇၀၄	၆၀၀၈၃	၁၃၃၇၈၇	၁၄၉၄၉၁၇၉၇			

ပဉ္စမနှစ် စက်ဝန်းအတွက် ပို့ချမည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ

15-17 Jan 2018	Start-Up Training (မြို့နယ်ဟောင်းမှ ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက်) - ၃ရက်			
13-28 Feb 2018	Start -Up ပထမအကြိမ် (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၂ မြို့နယ်) - ၁၂ရက်			
2-17 May 2018	Start-Up ဒုတိယအကြိမ် (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၄ မြို့နယ်) - ၁၂ရက်			
6-16 Mar 2018	ToT 1 ပထမအကြိမ်(ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၂ မြို့နယ်) - ၉ရက်			
21-31 May 2018	ToT 1 ဒုတိယအကြိမ် (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၄ မြို့နယ်) - ၉ရက်			
Feb – May 2018	Procurement, Com, Gender, Gri, Infra, Pro, Fin	ဝယ်ယူရေး မွမ်းမံသင်တန်း (၂)ဂုဏ်ဘဏ္ဍာရေး, M & E/MIS, Grievance,		
Mar-June 2018	Communication (၃)ဂုဏ် မွမ်းမံသင်တန်း	ကျားမရေးရာ (၂)ဂုဏ် မွမ်းမံသင်တန်း	ToF 1 (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်) - ၉ရက်	ဝယ်ယူရေး sub committee -၁ ရက်
		Communication (၂)ဂုဏ် မွမ်းမံသင်တန်း	Communication မွမ်းမံသင်တန်း (၁၂) ဂုဏ်	Community Management Training အတွက် ကျားမရေးရာ သင်တန်း နေ့ဝက်
			ကျေးရွာအဆင့် ဝယ်ယူရေးသင်တန်း ၁.၅ ရက်	
			လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အတွက် ကျားမ ရေးရာသင်တန်း (၂)ဂုဏ်	
23-27 Apr 2018	ToT 2 ပထမအကြိမ်(ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၂ မြို့နယ်) - ၅ရက်			
Jun-Aug 2018		အကာကွယ်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခွဲမှု သင်တန်း	ToF 2 (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၆ မြို့နယ်) - ၆ရက်	မြို့နယ်အသစ် (၁၆)မြို့နယ် Community Management Training
13-15 Jun 2018	ToT 3 ဒုတိယအကြိမ်(ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၁၂ မြို့နယ်) - ၃ရက်	Auto CADသင်တန်း(၅)ဂုဏ်	TTF 2- (၅)ဂုဏ်	
25-29 Jun	ToT 2 ဒုတိယအကြိမ် (ပဉ္စမနှစ်	Water quality testing-	Water quality	

2018	မြို့နယ်သစ် ၄ မြို့နယ်) - ၅ရက်	(၂)ရက်	testing-(၂)ရက်	
24-26 Jul 2018	ToT 3 ဒုတိယကြိမ် (ပဉ္စမနှစ် မြို့နယ်သစ် ၄ မြို့နယ်) - ၃ရက်			

**စီမံကိန်းနှစ်အလိုက် ရလဒ်ညွှန်းကိန်းများ(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ)**

1		ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	တတိယနှစ်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်
		၂၀၁၃/၁၄	၂၀၁၄/၁၅	၂၀၁၅/၁၆	၂၀၁၆/၁၇	၂၀၁၇/၁၈
1.1	နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်အကျိုး သက်ရောက်မှု	၂၂၇၀၀၀ ၃ မြို့နယ်	၆၆၉၅၇၀ ၆ မြို့နယ်	၂၁၈၆၄၁၅ ၁၈ မြို့နယ်	၂၂၅၃၆၃ ၂၀မြို့နယ်	၁၆၅၄၂၇၁ ၁၆ မြို့နယ်
	စုစုပေါင်း	၂၂၇၀၀၀ ၃ မြို့နယ်	၈၉၆၅၇၀ ၉ မြို့နယ်	၃၀၈၂၉၈၆ ၂၇ မြို့နယ်	၅၃၃၆၆၁ ၄၇မြို့နယ်	၆၉၉၀၈၈၇ ၆၃ မြို့နယ်
1.2	အမျိုးသမီး အကျိုးပြုဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း	၅၁.၉%	၅၁%	၅၁.၅%	၅၀.၇%	၅၁.၃%
1.3	စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဝန်ဆောင်မှုမှ အကျိုးရရှိသူဦးရေ	၂၀၄၅၂၇	၆၂၁၃၆၁	၂၀၄၂၁၂	၂၁၂၀၃၂	၁၅၇၁၅၅၈
1.4	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ကျေးရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်သည့် အိမ်ထောင်စု ရာခိုင်နှုန်း	၅၆%	၅၈%	၆၅ %	၆၁%	
1.5	လူထုမှ စီမံကိန်းအား ကျေနပ်မှု	၉၀%	၇၈.၈%	၈၂%	၉၄%	
၂.	<b>အလယ်အလတ်ရလဒ်ညွှန်းကိန်းများ</b>	<b>Yr 1</b> 2013/14	<b>Yr 2</b> 2014/15	<b>Yr 3</b> 2015/16	<b>Yr 4</b> 2016/17	<b>Yr 5</b> 2017/8
2.1	ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံ အရေအတွက်	၃၅၇	၁၈၁၂	၄၇၃၁	၇၆၆၈	၅၇၄၅
	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်းဆိပ်ခံ၊ တံတား)	၁၂၆	၇၄၃	၂၃၀၃	၄၂၈၇	၃၃၂၃
	ရေပေးရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး	၆၉	၄၁၅	၉၇၇	၁၁၅၇	၅၀၅
	ပညာရေး	၁၁၈	၄၃၄	၉၆၁	၁၀၅၈	၇၂၉
	မီးလင်းရေး	၂၆	၁၄၂	၂၀၆	၄၈၅	၄၉၂

	လူထုအသုံးအဆောင်	၁၅	၄၉	၁၃၅	၃၉၉	၅၇၁
	ကျန်းမာရေး	၁		၃၃	၃၃	၂၃
	အခြား	၂	၂၉	၁၁၆	၂၄၉	၁၀၂
	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းအရှည်ပေါင်း (ကီလိုမီတာ)	၈၃	၆၁၂	၁၆၄၆	၂၉၅၃	၃၀
2.2	စုစုပေါင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ကုန်ကျစရိတ်:  CDD စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ (ကျပ်သန်း)  လူထုထည့်ဝင်ငွေ  (% စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်)	၁၅၀၀ ၁၀၀	၉၅၅၀ ၈၄၅ (၀.၈%)	၃၂၃၂၀ ၁၈၀၀ (၅.၇%)	၆၀၀၁၀ ၃၃၀၀ ၆.၁%	
2.3	စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ လွှဲပေးခြင်း (ကျပ်သန်း)	၁၅၇၀	၁၀၄၆၀	၃၅၇၀၀	၆၇၃၈၀	၅၄၇၉၅
2.4	ဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို့ရရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်သစ်များ ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုများ၊အင်ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာများ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဦးရေ	၄၈	၁၁၅	၂၃၄	၄၅၂	၄၇၉
2.5	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှ ၎င်းတို့ရရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာဝယ်ယူ ရေးအပိုင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဦးရေ	၄၇၃၁	၁၉၁၆၀	၈၄၇၄၈	၁၁၃၅၈၈	၂၈၇၆၅
2.6	စီမံကိန်းတွင်း မြို့နယ်များ အပြန်အလှန်လေ့လာ ရေးခရီးစဉ်သွားရောက်မှုအရေအတွက်	၂	၄	၄	၀	
2.7	ပြည်ထောင်စုအဆင့် နှစ်ပတ်လည် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမှုအရေ အတွက်	၁	၁	၁	၁	
2.8	စီမံကိန်းသို့လိပ်မူ၍ အကြံပြုစာ ပေးပို့မှုအပေါ် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုဖြေရှင်းပြီးမှုရာခိုင်	၉၉%	၉၈.၅%	၉၉%	၉၉%	၉၆%



		င်နှုန်း					
	A	အဓိကကျသောအကြံပြုစာ	၉၈%	၉၈%	၉၉%	၉၉%	၇၉%
	B	အရေးမကြီးသောအကြံပြုစာ	၉၉%	၉၉%	၉၉%	၉၉%	၉၉%
2.9		အကြံပြုချက်များအား ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြီးကခြားခြင်း အကခြားခြင်းပြန်ကြားခြင်း	၃၁၈	၁၆၀၅	၄၁၁၃	၅၅၅၄	၅၈၉
	A	အဓိကကျသောအကြံပြုစာ	မရှိ	၁၁၉	၂၁၁	၅၈	၁၉
	B	အရေးမကြီးသောအကြံပြုစာ	မရှိ	၁၄၈၆	၃၉၀၂	၅၄၉၆	၅၇၀
2.1 0		နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ် တွေ့ရှိချက်များထုတ်ပြန်မှု (ရန်ပုံငွေ အလွဲသုံးစားမှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုက်နာမှုမရှိခြင်း)	၁၀၀%	၁၀၀%	၁၀၀%	၁၀၀%	

၂၁။ ယခုအစီရင်ခံစာတင်သည့်ကာလအတောအတွင်း မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် Union Training Team မှမြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်အတွက် သင်တန်းများကိုအောင်မြင်စွာပေးပြီး ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်မြို့နယ်အသစ် ၇ မြို့နယ်အတွက်လည်း ၂၀၁၈ မေလမှ ဇွန်လထိပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Unionနှင့် မြို့နယ် အသီးသီးတို့မှ အဆိုပါသင်တန်းများပို့ချပြီးချိန်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုများ၊ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမြို့နယ် ၆၁ မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာများသို့ သင်တန်းပို့ချသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။

၂၂။ သင်တန်းစီမံချက်သည် ၂၀၁၇ဒီဇင်ဘာတွင် မြို့နယ်အသစ်များအတွက် TTA Key Expert များကိုနေရာချထားရန်လိုအပ်ပြီး TOT သင်တန်းများကို တက်ရောက်၍ မိမိတို့မြို့နယ်တွင် TOF သင်တန်းများပြန်လည်ပို့ချခြင်းအားဖြင့် ပဉ္စမနှစ် နှစ်အတွက်အရေးပါသော သင်တန်းအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ ပဉ္စမနှစ်တွင် မြို့နယ် ၁၆ အတွက် TTA အသစ်များစုစည်းခြင်းသည် နှောင့်နှေးခဲ့လျှင်၎င်းနှစ်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ သင်တန်းအချိန်ဇယားတစ်ခုလုံးနှင့်အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများသည် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမည်ဖြစ် ပါ သည်။

**ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ**

၂၃။ စီမံကိန်း စတင်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာပေါင်း (၁၂၂၁၆)စောင်ရေရှိခဲ့ပြီး (၁၂၁၇၉)စောင်အား ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စတင်သည့်

၂၀၁၄ ခု ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အကြံပြုစာများ မြို့နယ်အလိုက် လက်ခံဖြေရှင်းပြီးစီးမှုများ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

စဉ်	မြို့နယ်	လက်ခံရရှိသည့် အကြံပြုစာပေါင်း	ဖြေရှင်းပြီး အကြံပြုစာပေါင်း	ဖြေရှင်းပြီး ရာခိုင်နှုန်း	မှတ်ချက်
၁	ကန်ပက်လက်	691	691	100.0%	
၂	ကျွန်းစု	461	461	100.0%	
၃	နမ့်ဆန်	222	221	99.5%	
၄	လေးမျက်နှာ	423	422	99.8%	
၅	စေတုတ္ထရာ	660	659	99.8%	
၆	အမ်း	241	241	100.0%	
၇	ထန်းတပင်	205	205	100.0%	
၈	တပ်ကုန်း	378	377	99.7%	
၉	ပင်လည်ဘူး	616	616	100.0%	
၁၀	ကျော့မျိုး	665	665	100.0%	
၁၁	ပလက်ဝ	207	207	100.0%	
၁၂	တနင်္သာရီ	120	120	100.0%	
၁၃	မြောင်	515	515	100.0%	
၁၄	ဗန်းမောက်	402	402	100.0%	
၁၅	သာပေါင်း	233	233	100.0%	
၁၆	ကြံခင်း	170	170	100.0%	
၁၇	မင်းတုန်း	544	543	99.8%	
၁၈	လယ်ဝေး	293	291	99.3%	
၁၉	ငါန်းစွန်	111	111	100.0%	
၂၀	ညောင်ဦး	502	501	99.8%	

၂၁	မိုးညို	130	130	100.0%	
၂၂	ခကျောင်းဆုံ	209	209	100.0%	
၂၃	ဘီးလင်း	497	496	99.8%	
၂၄	ဖရူးဆို	136	136	100.0%	
၂၅	ဒီမောဆို	365	365	100.0%	
၂၆	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	550	550	100.0%	
၂၇	ကျောက်ကြီး	413	412	99.8%	
၂၈	ငပုတော	21	21	100.0%	
၂၉	ပန်းတောင်း	54	54	100.0%	
၃၀	မတူပီ	92	84	91.3%	
၃၁	မိုးကောင်း	105	105	100.0%	
၃၂	ဖားဆောင်း၊ဘော်လခဲ၊ မယ်စဲ့	117	117	100.0%	
၃၃	လွိုင်ကော်၊ ရှားတော	150	150	100.0%	
၃၄	ထီးလင်း	265	264	99.6%	
၃၅	ပေါက်	212	212	100.0%	
၃၆	ဆော	173	172	99.4%	
၃၇	နွားထိုးကြီး	62	61	98.4%	
၃၈	ပျော်ဘွယ်	209	209	100.0%	
၃၉	ရမည်းသင်း	109	108	99.1%	
၄၀	ပေါင်	122	121	99.2%	
၄၁	ပျဉ်းမနား	64	64	100.0%	
၄၂	ဆီဆိုင်	220	220	100.0%	
၄၃	ကွမ်းခြံကုန်း	74	66	89.2%	
၄၄	ကျောက်တန်း	207	201	97.1%	

၄၅	ပြည်ထောင်စုအဆင့်	1	1	100.0%
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>12,216</b>	<b>12,179</b>	<b>99.7%</b>

မြို့နယ်များမှ အကြံပြုစာအများဆုံးလက်ခံရရှိသော မြို့နယ်မှာ ကန်ပက်လက်ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုစာပေါင်း ၆၉၁ စောင်ရရှိပြီး ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည့် ကော့မှူးမြို့နယ်မှာ အကြံပြုစာပေါင်း ၆၆၅ စောင်လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်း မြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးတွင် ၁၀% မှာမကျေနပ်ချက်များဖြစ်ပြီး (အဓိကအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ မလျော်ကန်စွာကြားဝင်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပြီး) ကျန်သောစာများမှာ အကြံပြုစာများနှင့်ကျေးဇူးတင်စာများ ဖြစ်သည်။

၂၄။ အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် အဓိကဆောင်ရွက်မှုများမှာ-

- (က) ထိခိုက်လွယ်သော အငြင်းပွားမှုများကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေး ခြင်း၊
- (ခ) လက်ခံရရှိသောအကြံပြုစာ များအား စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီးအကြမ်း ဖျဉ်းအားဖြင့် ၉၉% ကျော်ကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ပါ သည်။
- (ဂ) အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူ များပြင်ဆင်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းလက်စွဲ စာအုပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊
- (င) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပြုစုခြင်း (ဥပမာ - သင်တန်းများအပြိုင်စတင်ခြင်း)၊ နှင့် မြို့နယ်များသို့ကွင်းဆင်းခြင်း
- (၅) ဝေဖန်အကြံပြု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအားတင် ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။

၂၅။ ကျေးရွာများသို့ ဖြန့်ဝေရာတွင် ကျေးရွာအကြံပြုစာတိုက်ပုံးများမှအကြံပြုစာများကို CFများသည် မြို့နယ်ဝေဖန်အကြံပြုဌာနမှ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေး သည်။ မြို့နယ်(သို့)ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရုံးသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆို၍တိုင်ကြားခြင်း နည်းလမ်းမှာ နည်းပါးပါ သည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းခြင်း၌ အားနည်းပါ သည်။ အများစုမှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထို့ပြင်ဝေဖန်အကြံပြုစာများကို M&E Officer (သို့) Grievance Focal Person များထံမှ မြို့နယ် MIS ထဲသို့ရောက်ရှိပါ သည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရုံးသို့ တိုက်ရိုက်လာသော အကြံပြုစာများမှာ ပြည်ထောင်စုMIS သို့ရောက်ရှိပါ သည်။

၂၆။ ဝေဖန်အကြံပြုစနစ်အား အောက်ပါအတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် ကြပါ သည်-

- (က) စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ လူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှု များနှင့် ဆက်သွယ်မှုများအပါအဝင် ဝေဖန်အကြံပြုစီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းစဉ်များဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသင်တန်းများပေးခြင်း

၂၆။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲကိုအခြေခံ၍ CDD သင်တန်းများ အားလုံးရှိသင်ရိုးတွင် ၎င်းစနစ်ပါရှိပါ သည်။

- (ခ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ မှ မြို့နယ်အားလုံးသို့ သင်တန်း ပေးရန်အတွက် ပုံမှန်သွားရောက်ခြင်း၊ CF များနှင့်ကျေးရွာဝေဖန် အကြံပြုဖြေရှင်းခြင်း အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်များ ထံမှတုံ့ပြန်ချက်များရရှိခြင်းနှင့် အမြင်များအား မေးမြန်းခြင်း၊
- (ဂ) Grievance focal နှင့် မြို့နယ် counterpart များအတွက် TOTသင်တန်း များကိုပေးခဲ့ပါ သည်။

၂၇။ စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်းအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းနည်းလမ်းအညွှန်းကိန်း ၆ ခု သည် မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်အတွက် ၁၀၀% ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သည်။

- (က) ကျေးရွာများမှ GHM သတင်း အချက်အလက်များရရှိခြင်း၊
- (ခ) ကျေးရွာများတွင် grievance focal များခန့်အပ်ခြင်း၊
- (ဂ) စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အတိုင်း ပြုလုပ်သည့်ကျေးရွာများ၊
- (ဃ) ကျေးရွာများတွင် အကြံပြုစာတိုက်ပုံးများထားရှိခြင်း၊
- (င) ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ သင်တန်းများရရှိခြင်း၊
- (စ) ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း သတင်း အချက်အလက်ပါရှိသော ကျေးရွာများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၂၈။ မြို့နယ်သစ်များအတွက် ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အထောက်အကူများမှာ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေဖန်အကြံပြုသည့် မူများပါဝင်သည့် ပိုစတာများနှင့် လက်စွဲစာအုပ်များကို စုစည်းပြီးဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအားလုံးကို Communication Team မှ စာအုပ်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ် သည်။ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူများ ( လက်စွဲစာအုပ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် လူထုအတွက် ဖုန်းနံပါတ် စတစ်ကာများ ) ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလတွင်အပြီးသတ်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

၂၉။ ပဉ္စမနှစ်တွင် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းနေရာများ ပဉ္စမနှစ် စက်ဝန်းအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် ဝေဖန်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များမှာ-

- (က) ကျေးရွာမှ ယုံကြည်ရနိုင်မည့်သူအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါကလည်း ကျေးရွာအဆင့် grievance focal person ထားရှိခြင်း
- (ခ) ကျေးရွာ grievance focal person သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း၏ သဘောတရားအတိုင်းပေးပို့ခြင်း၊
- (ဂ) လိုအပ်သောကျေးရွာများသို့ အကြံပြုစာတိုက်ပုံးများနှင့် လိုအပ်သော အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများထားရှိပေးခြင်း

- (ဃ) ကျေးရွာမှ မြို့နယ်ရုံးသို့ အကြံပြုစာများလက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သော နည်းလမ်း ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
- (င) ကော်မတီဝင်များနှင့် ရွာသူ/ရွာသားများသည် အသီးသီးတာဝန်ယူမှုနှင့် ရင်းနှီးမှုရှိသင့်ခြင်း၊
- (စ) ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များသည် စီမံကိန်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်းနှင့် သဘောတူညီမှု ယူထားသည့်အတိုင်းသတိပြုလုပ်ဆောင်သွားရန်၊

၃၀။ ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းခြင်းကဏ္ဍကို အခြားနိုင်ငံများ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းများ တွင်ကောင်းစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဖြစ်ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ဝေးလံခေါင်ပါးသော ဒေသများမှ နိုင်ငံသားဆင်းရဲသားများ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်များကိုလက်ခံ ဖြေရှင်းပေးပြီး အားပေးမှုများပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ ပဉ္စမနှစ်တွင်လည်း ၎င်းကိုဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးအမြတ်များ ရရှိမည်ဖြစ် ပါ သည်။

**အခြေခံအဆောက်အဦးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ**

၃၁။ အစီရင်ခံသည့် စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်နှင့် ပဉ္စမနှစ်အတွင်းရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ် လုပ်ငန်းခွဲများအလိုက် အောက်ပါဇယားအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည် -

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ အုပ်စု အရေအတွက်	ကျေးရွာ အရေအတွက်	ရန်ပုံငွေ လွှဲပေးခြင်းပြီး ငွေကျပ်(သန်း)		စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ	
				စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ် (မတ်လကုန်ထိ)
၁	ကန်ပက်လက်	၂၆	၁၂၃	၅၇၂		၁၀၇	
၂	ကျွန်းစု	၂၀	၁၆၃	၁၆၀၆		၁၇၄	
၃	နမ့်ဆန်	၂၆	၁၂၃	၂၆၄	၃၆၈	၃၈	၃၀
၄	အမ်း	၂၉	၂၂၉	၁၁၄၀	၁၁၄၀	၁၂၄	၃၈
၅	ထန်းတပင်	၅၄	၂၄၅	၁၆၇၀	၁၆၇၀	၂၃၈	၁၉၃
၆	လေးမျက်နှာ	၄၁	၂၇၁	၁၃၇၀	၁၃၇၀	၂၆၀	၂၃၅
၇	ပင်လည်ဘူး	၅၂	၂၆၆	၁၄၄၄	၁၄၄၄	၁၂၀	၉၂
၈	စေတုတ္တရာ	၄၆	၁၁၈	၁၀၁၂	၁၀၁၂	၁၁၉	၄၈

၉	တပ်ကုန်း	၄၉	၁၈၈	၁၉၄၈	၁၉၄၈	၁၅၅	၁၂
၁၀	ကြိခင်း	၃၀	၂၅၅	၉၂၀	၉၂၀	၁၈၂	၅၈
၁၁	သာပေါင်း	၆၇	၃၉၂	၁၉၁၀	၁၉၁၀	၃၁၂	၁၇၀
၁၂	ကျောက်ကြီး	၂၅	၉၁	၁၁၅၆	၁၁၅၆	၁၃၃	၂၂
၁၃	မိုးညို	၃၆	၂၁၄	၁၄၄၄	၁၄၆၆	၁၅၆	၅၇
၁၄	ပလက်ဝ	၉၆	၃၈၃	၂၁၃၄	၂၁၁၂	၂၉၉	၈
၁၅	ဒီမော့ဆို	၂၆	၁၇၂	၈၆၄	၈၆၄	၇၉	၄၄
၁၆	ဖရူးဆို	၁၄	၁၁၆	၃၄၆	၃၄၆	၅၃	၂၁
၁၇	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	၅၁	၃၂၇	၂၂၇၂	၂၄၈၈	၁၇၈	၉၇
၁၈	တနင်္သာရီ	၁၉	၁၇၆	၁၀၁၈	၁၀၃၄	၁၀၀	၁၃
၁၉	ဗန်းမောက်	၄၇	၂၁၉	၁၂၂၀	၁၂၂၀	၁၇၂	၃၃
၂၀	မြောင်	၄၈	၈၁	၁၃၁၄	၁၃၁၄	၁၀၁	၇၆
၂၁	မင်းတုန်း	၇၂	၁၇၉	၁၅၈၄	၁၅၈၄	၁၆၆	၂၈
၂၂	ငါန်းဇွန်	၄၄	၁၅၈	၁၅၉၂	၁၆၅၂	၁၄၁	၃၀
၂၃	ညောင်ဦး	၇၄	၂၂၀	၂၅၄၆	၂၅၉၈	၂၂၆	၁၇၇
၂၄	ဘီးလင်း	၅၁	၂၁၆	၂၀၉၄	၁၉၇၄	၁၉၄	၆၈
၂၅	ချောင်းဆုံ	၄၃	၇၈	၁၅၆၈	၁၅၆၈	၁၈၆	၁၀၄
၂၆	လယ်ဓား	၆၀	၂၆၁	၂၈၂၂	၂၈၆၈	၂၈၃	၂၆
၂၇	ကျော့မှူး	၅၅	၁၃၆	၁၅၀၆	၁၅၀၆	၁၉၆	၁၅၂
၂၈	ငပုတော	၆၇	၃၃၇	၂၇၄၆	၂၇၆၈	၃၂၉	၁၀၁
၂၉	ပန်းတောင်း	၄၀	၂၀၈	၁၃၂၂	၁၃၄၄	၂၀၁	၅၄
၃၀	မတူပီ	၆၂	၁၅၀	၁၃၆၄	၁၃၆၄	၁၇၀	၁၆
၃၁	မိုးကောင်း	၃၆	၇၉	၁၂၆၈	၁၂၉၀	၁၂၀	၆၂
၃၂	ဖားဆောင်း	၁၈	၈၈	၄၈၆	၄၈၆	၅၄	၂၂
၃၃	ဘော်လခဲ						

၃၄	မယ်စွဲ						
၃၅	လွိုင်ကော်	၁၅	၁၃၇	၈၄၈	၈၄၈	၁၃၆	၃၁
၃၆	ရှားတော						၄
၃၇	ဆော	၆၃	၁၁၇	၁၄၀၈	၁၄၀၈	၁၄၅	၁၆
၃၈	ထီးလင်း	၇၁	၉၃	၁၅၆၂	၁၅၆၂	၁၁၁	၃၂
၃၉	ပေါက်	၆၇	၂၅၇	၂၃၀၆	၂၃၅၀	၃၀၂	၈
၄၀	ပျော်ဘွယ်	၇၅	၃၁၇	၂၆၇၄	၂၇၁၂	၃၂၇	၆၈
၄၁	နွားထိုးကြီး	၆၄	၁၉၁	၂၂၇၂	၂၂၈၈	၁၇၀	၂၅
၄၂	ရမည်းသင်း	၆၃	၂၄၉	၂၆၁၀	၂၇၀၈	၂၆၇	၅၁
၄၃	ပေါင်	၄၉	၁၅၅	၂၀၄၂	၂၁၀၂	၁၆၃	၈၃
၄၄	ပျဉ်းမနား	၂၉	၁၃၉	၁၁၆၄	၁၂၀၀	၁၆၉	၁၄
၄၅	ဆီဆိုင်	၁၃	၃၂၂	၁၄၃၀	၁၄၉၀	၁၉၈	၂
၄၆	ကွမ်းခြံကုန်း	၄၃	၁၃၀	၁၂၂၀	၁၂၄၂	၁၁၄	၆၇
၄၇	ကျောက်တန်း	၄၄	၇၈	၁၃၁၈	၁၃၄၀	၂၀၃	၇၄

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်း**

၃၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်း အား ပထမအကြိမ်ကို ပထမနှစ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်သော မြို့နယ်(၃)မြို့နယ်အား လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်သော မြို့နယ် (၉)မြို့နယ်အားလည်းကောင်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် တတိယနှစ် စက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၂၇)မြို့နယ်၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်သော စီမံကိန်းမြို့နယ်(၄၇)မြို့နယ် တို့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို စစ်ဆေးရန် ကျန်ရှိနေသည့်အတွက် နည်းပညာစစ်ဆေးရမည့် မြို့နယ်များအား အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) အငြင်းပွားဧရိယာ၊ တိုင်းရင်းသားအများစုပါဝင်သည့်ဧရိယာ conflict area/ethnic area
- (ခ) ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် တည်ရှိရာနေရာ Physical cultural resources area



- (ဂ) ဝေးလံပြီးတောင်ပေါ်ဒေသများ: Hilly & remote area
- (ဃ) ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိနေရာ(ရေလွှမ်းမိုးသောနေရာ) Flood affected area
- (င) သဘာဝဘေးကျရောက်လေ့ရှိသောနေရာ Disaster affected area
- (စ) အခြား ဧရိယာ

၃၃။ ဧရိယာအလိုက် ရွေးချယ်မှုများအရ အငြင်းပွားဧရိယာ၊ တိုင်းရင်းသား အများစုပါဝင်သည့် ဧရိယာတွင် (၆)မြို့နယ်၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဇုံ တည်ရှိရာ နေရာတွင် (၁)မြို့နယ်၊ ဝေးလံပြီးတောင်ပေါ်ဒေသများတွင်(၃)မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းဘေးတည်ရှိသော ဧရိယာတွင် (၅)မြို့နယ်၊ သဘာဝဘေးကျရောက်လေ့ရှိသော ဧရိယာတွင် စီမံကိန်း(၅)မြို့နယ်၊ အခြားတွင် (၇)မြို့နယ် စုစုပေါင်း(၂၇)မြို့နယ်အား ရွေးချယ်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရွေးချယ်ခဲ့သည့် မြို့နယ်များအနက်မှ ပထမနှစ်စက်ဝန်း၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် မြို့နယ်(၂၀)အား တစ်မြို့နယ်လျင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု နှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် မြို့နယ်(၇)ခုအား တစ်မြို့နယ်လျင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု စုစုပေါင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၂၃၅)ခုအား စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၃၄။ ထို့အပြင် စစ်ဆေးသည့် မြို့နယ်များရှိ CDDပြင်ပ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများမှ ဆောင်ရွက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်း(၃၀)ကို နှိုင်းယှဉ်ချက်ရေးသား ပြုစုနိုင်ရန် အတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

၃၅။ နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းအဖွဲ့အား တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ၎င်းရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ Mr.Neil Neate ၊ ဒေါက်တာသိမ် နှင့် ဦးမိုးနိုင်ဦး တို့မှ ဦးဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် CDD တွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိသည့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာ(၁၂)ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၃၆။ အောက်ပါမြို့နယ်များရှိ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ပထမနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းခွဲ(၂၃၅)ခုအား နည်းပညာစစ်ဆေးခဲ့ပါသည် -

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	လုပ်ငန်းခွဲအမျိုးအစား	မြို့နယ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း	အကွာအဝေး
၁	ဒီမောဆို	ဒေါယောက်ခူ	လေမအမ်းခူ	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၂		နောင်ပလဲ	လောဆီ	လူထုခန်းမ	အဆောက်အဦး	၁	NR

၃		ဒေါဘုကူး	ဒေါဘုကူး	လူထုခန်းမ	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		ထီဖောကလို	ဒေါခူလီ	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၃	NR
၅		ပန်ပက်	ပန်ပက်ကတဲ ကူ	ရေနုတ်မြောင်း၊ ရေထုတ်ပြွန်	တံတား	၁	R
၆		ဘုရားဖြူ	ဖုရားဖြူ	ကျောက်စရစ်လမ်း	တံတား	၁	R
၇		ဆောဒူရွာ သစ်	ဒုန်းခမီ	ကျောက်စရစ်လမ်း	လမ်း	၁	R
၈		နန်းမယ်ခုံ	ခေါခု(ရှမ်း)	ကျောက်စရစ်လမ်း	လမ်း	၂	NR
၉		ဒေါဖု	တဖို	ရေပေးရေး	ရေပေးဝေရေး	၂	R
၁၀		လိုပူ	ချယ်ရီကုန်း	မိုးရေစိုက်ရေလှောင်ကန်	ရေပေးဝေရေး	၂	R
၁	<b>ပျဉ်းမနား</b>	ဘုတ်မ	ခန်လာ	ရေတွင်း/ရေစက်ရုံ	ရေပေးရေး	၁	ER
၂		ကျီးအင်း	ကျီးအင်း	ကုန်သွယ်လမ်း	လမ်း	၁	NR
၃		ဘန်ဘား	သန်းမရီ	ရေထုတ်ပြွန်	တံတား	၁	VR
၄		နှမ်းတော	နှမ်းတော	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ	အဆောက်အဦး	၁	R
၅		သစ်ထွန်း	မရမ်းတောင်	စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၁	ကွမ်းခြံ ကုန်း	မှော်ဘီ	အဒက်	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၁	R
၂		ကရင်ခ ကျောင်း	သာယာအေး	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်း	၁	R
၃		ကန်လျား ရှည်	ကညင်ပင်	လမ်း	လမ်း	၁	R

၄		စုကလက်	စုကလက်	သူနာပြုကျောင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၅		မန်ကလိပ်	ရွာသစ်ကုန်း	ရေလှောင်ကန်	ရေပေးရေး	၁	R
၁	ကော့မှူး	အဖကျောင့်	အဖကျောင့်	လူထုခန်းမ	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		လျှာဘွား	ဖုရားနီ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		စာတိုက်မှူး	စာတိုက်မှူး	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်း	၁	R
၄		ရွာတန်းရှည်	ဒုံးညို	မြဲသားလမ်း	လမ်း	၁	R
၅		သမဲ့	သမဲ့(အထက်)	ရေထုတ်ပြွန်	တံတား	၁	R
၆		အောက် ကျောင်း	တာတင်(ဧ ဧက)	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၂	R
၇		ကမာကနီ	ကမာကနီ	ကျန်းမာရေးဆောင်	အဆောက်အဦး	၂	R
၈		ပြားမှူး	ပြားမှူး	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်း	၂	R
၉		ကြာကန်	ကြာကန်	ရေလှောင်ကန်	ရေပေးရေး	၂	R
၁၀		သရက်တော (တကူပွန်)	သရက်တော(တ တကူပွန်)	Electricity	Electricity	၂	R (or) NR
၁	တပ်ကုန်း	သစ်ဆိပ်ပင်	ချင်းစု	လူထုခန်းမဆောက်လုပ် ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	R
၂		ထုံးဘို	ထုံးဘို	အထက်တန်းကျောင်း	အဆောက်အဦး	၂	R
၃		ရွှေမောင်း ဂွတ်	ရတနာမြေ	ကျေးရွာ ကျန်းမာရေးဌာန	အဆောက်အဦး	၃	VR
၄		ကန်လှ	ဂုတ်ကုန်း	မြဲသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	NR

၅		ကန်ကြီး	လက်ပံပု	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၂	NR
၆		ညောင်တုန်းအိုင်	ညောင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	လမ်း	၂	NR
၇		လက်ပံ	အင်းကုန်း	ကျေးရွာအဓိကလမ်း (ကျေးလမ်း)	လမ်း	၃	R
၈		ကျောင်းကုန်း	ကျောင်းကုန်း	မြဲသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	ER
၉		ခရမ်းဆက်ကုန်း	အင်ဖက်ကုန်း	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	ရေပေးရေး	၂	NR
၁၀		ထန်းထောင့်	ကုန်းရွာ	လျှပ်စစ်မီးလှိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း (မီးစက်)	လျှပ်စစ်မီးလင်းပေး	၃	R
၁၁	ပျော်ဘွယ်	ဘက်တ	ကန်ကောင်း	ရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		ဂီးကြီး	ဂီးကြီး	ဂျင်းကျောက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၃		ခကျောင်းမကျီး	ကုန်းသာ	မြဲသားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၄		ဧကရာဇ်ကုန်း	ရွာသစ်	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	တံတား	၁	R
၅		ထန်းတောကြီး	ဝါစုကြည်	ရေပေးဝေရေး	ရေပေးရေး	၁	R
၁	ကျွန်းစု	ကန်ကြီး	မော်တုန်းကြီး	ရွာဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၃	R
၂		ကပ	ကတန်	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၃	R
၃		မင်းဂုတ်	ပြင်ဝန်း	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၄	R
၄		တောပြား	ပန်းဇင်	ဆိပ်ခံတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၃	VR
၅		ကျွဲခရံ	သဇင်	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၄	VR

၆		ဇေးကမိ	ဇေးကမိ	ကွန်ကရစ် Wheel Track လမ်း	လမ်း	၄	VR
၇		စခန်းသစ်	စခန်းသစ်	ကွန်ကရစ်ဆိပ်ခံတံတား ဇောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၃	ER
၈		ကန့်တလူ	ထိန်ဝေချောင်း	ရေပေးရေး	ရေပေးရေး	၃	R
၉		မင်းဂုတ်	မင်းဂုတ်	ရေပေးရေး	ရေပေးရေး	၄	R
၁၀		မောင်းလှော်	ရတောင်(အတွင်း)	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး (မီးစက်)	လျှပ်စစ်မီးလင်းဇေး	၄	VR
၁	တနင်္သာရီ	ဘန်လမ္ပတ်	ရန်ဖို	စာသင်ကကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ညောင်ပင်ကွင်း	ညောင်ပင်ကွင်း(ရှေ့)	စာသင်ကကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၃		မော်တုန်း(ရှေ့)	မော်တုန်း(ရှေ့)	စာသင်ကကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	R
၄		လယ်သစ်	မြေပြား	ရေပြန်	တံတား	၁	VR
၅		ပဝ	ခွန်းရှည်	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	VR
၆		ဆင်ခမြေဖုန်း	အောက်ခင်(ရှေ့)	ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၇		ဘန်လော	ဘန်လော(ရှေ့)	ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၈		တကူ	အင်းရှည်ကုန်း	ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်း	၂	R
၉		သိန်းဒေါ်	သဋ္ဌေး(ရှေ့)	Spring Water	ရေပေးရေး	၂	ER
၁၀		ဆင်ခမြေဖုန်း	ဘောဓိကန်	၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	လျှပ်စစ်မီးလင်းဇေး	၂	NR
၁	ငါန်းဇွန်	ချင်းသိုက်လက်	ရွှေတွင်းကုန်း	ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR

၂		ကျောက်တလုံးကြီး	သာစည်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		သုနက်စစ်	သာပေါင်း	ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		ရေလယ်သောင်	လေးတောင်	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	R
၅		ကောင်းဇင်	ကောင်းဇင်	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	VR
၆		ပြင်လှတော	ပြင်လှတော	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	VR
၇		သရက်ချိုပင်	ခွန်ဒင်	ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	VR
၈		ဂျိုး	ဂျိုး	ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း	လမ်း	၂	NR
၉		မိုးတောင်	လယ်ချင်းဦး	ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ရေပေးရေး	၂	R
၁၀		ကုန်းလယ်	မြန်	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	R
၁	ညောင်ဦး	ပြန်	ပြန်	ကျေးရွာခန်းမ	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ကန်မ	အိုင်ကြီး	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၃		ညောင်ပင်	အုတ်လှေးကတ	မူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		ပွဲကန်	ပွဲကန်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၅		ကွမ်းခင်ကြီး	ကွမ်းခင်ကြီး	ရေကာတာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၆		လက်ထုတ်	လက်ထုတ်	ကျောက်ခင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	VR
၇		ကူတော	ကြို့ပင်သာ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	R

၈		သောင်းဇင်	ကကြဲ	ရေကာတာလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၉		မြေဝေခို	ဘိုကုန်း	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ရေပေးရေး	၂	VR
၁၀		အထက်ညင်	အထက်ညင်	လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီး	၂	NR
၁	စေတုတ္ထ ရာ	နမ့်ကြူ	ပေါင်ကျောင်း ဝေး	မူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	ER
၂		ချင်းပစ်ခိုင်	ညောင်အိုင်	လူထုနားနေဆောင်	အဆောက်အဦး	၁	NR
၃		မထိမ်	မထိမ်(ရှေ့)	Communication center	Building	၂	NR
၄		မြဲနီ	မြဲနီ	ကျေးလက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၅		သက်လယ်	ကျောက်ဖြူ	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၆		ကျီးဝ	ကျီးဝ	တာရိုးဖောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၂	R
၇		နန်းကြူ	နန်းကြူ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	VR
၈		ရဲတောင်	ရဲတောင်	ကျေးရွာလမ်းနှင့် ခရိုင်ဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၂	VR
၉		မြောင်ဦး	မြောင်ဦး	လက်တူးတွင်းပြုပြင်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	R
၁၀		အလယ်ပုံ	အောက်ပုံ	လျှပ်စစ်မီးကြိုး သွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီး	၁	NR
၁	မင်းတုန်း	တောင်ပတ်	တောင်ပတ်	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ကျောက်ကြီး	ကျောက်ကြီး (ပြင်)	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		အလယ်ခ ကျောင်း	အလယ်ခ ကျောင်း	လူထုနားနေဆောင် ကျေးရွာခန်းမ	အဆောက်အဦး	၂	R

၄		တံတား	တံတား(ညောင်ပင်သာ)	သစ်သားတံတား ပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	R
၅		ထိန်ခင်း	ကွီးဘေး (အထက်)	Circular Metal Surface လမ်း	လမ်း	၁	NR
၆		ပေါက်ခိုင်း	ပေါက်ခိုင်း (အလယ်)	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၇		ကြုတ်ဝ	ကြုတ်ဝ	မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၈		အင်ပျက်	ကျောက်ပြုတ်	ကျေးရွာနှင့် မြို့ဆက်လမ်း	လမ်း	၂	R
၉		လွှာဝ	မိုက်	ရေပေးရေး	ရေပေးရေး	၂	R
၁၀		ချင်းနှစ်	ချင်းနှစ်	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	VR
၁	မြောင်	လက်ယက်မ	အောင်ချမ်းသာ	ကျောင်းဝးဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		ကျိုင်းဖြူ	ကျိုင်းဖြူ	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		ကျိုင်းဖြူ	နီးမူတ်	ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၄		ပေါက်တော	ပေါက်တော (ရှေ့)	ရွာချင်းဆက်မြဲသားလမ်း	လမ်း	၁	NR
၅		မယိုးကုန်း	မယိုးကုန်း	ကွန်ကရစ်တံတား (၁၀၀ပေ)	တံတား	၁	NR
၆		ရွှေဘုန်းသာ	ဆင်မင်း (ဇီးကုန်း)	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	လမ်း	၂	R
၇		မြစ်ဆုံ	မြစ်ဆုံ	ရွာချင်းဆက် ကျောက်ခင်းလမ်း	လမ်း	၂	R
၈		အုန်းနဲ့ဘုတ်	မြစ်	တာရိုးပြုလုပ်ခြင်း	တံတား	၂	R
၉		သီရိဇေယျ	သီရိဇေယျ	ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်း	ရေပေးရေး	၂	R



၁၀		ခင်းရွာ	ခင်းရွာ	Extension of 200KVA Transformer	လျှပ်စစ်မီး	၂	R
၁	ဗန်းမောက်	ခိုနမ်	ပမွန်	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		မန်းလောင်ပေပင်	ဌေးသောက်ချို	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		လေးသီ	လေးသီ	လူထုခန်းမဆောင်	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		ပန်တော်	ပန်တော်	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	R
၅		ပငစင်တဲ	လယ်ကျင်	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၆		ကန်တော်	တောင်လွေး	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၇		အောင်သာကုန်း	ကွေးကော်ကုန်း	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	NR
၈		ပင်ဟင်းခါ	ရွှေကျောင်း	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၂	NR
၉		နောင်ကန်	ဝေးမန်ကော်	ရေတွင်းတူးခြင်း	ရေပေးရေး	၂	VR
၁၀		ဂဏန်းမူသာ	ပင်လိုင်း	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	VR
၁	ငပုတော	ဂုံညှင်းတန်း	သရက်တော	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၂		သက်ကယ်ခကျောင်းဝေး	အောင်ခိုင် (သောတင်းလေး)	ကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၃		သမဒဲဝ	အလယ်ကုန်း	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	R
၄		အုန်းပင်စု	ကျောင်းစု	အဝီစိတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	R
၅		အရိုးဒါ	ကမာလု	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၁	R

၁	သာပေါင်း	ရှမ်းမမြောင်	ဝဲကြီးဒေါင့်	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		ဂုံညှင်းတန်း	ဂုံညှင်းတန်း	ကျေးရွာခန်းမ	အဆောက်အဦး	၂	R
၃		ကြာရဲ	ညောင်ကုန်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	VR
၄		လှေကြီးပျက်	နန်းနန်းပင်က ပုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၅		ဇီးဖြူကွင်း	ကန်ကုန်း	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၆		ဖုရားကုန်း	ဖုရားကုန်း	ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	R
၇		ဆီဆုံ	သပွတ်ခကျေ တင်းငေး	မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	NR
၈		ငဝန်ဒေါင့် ကြီး	ငဝန်ဒေါင့်ကြီး	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၂	R
၉		သစ်ဖြူ	သစ်ဝန်ပု	အဝီစိတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	ER
၁၀		ခွေးကုတ်	ဂမုန်းကျော်	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	VR
၁	ခကျောင်း ဆုံ	ဆောက်ကီ	ဆောက်ကီ	လူထုခန်းမပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		ကရိုက်ဒု	ရေတွင်းကုန်း	စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		ကမာမို	ကမာမို	ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	R
၄		ဒရယ်	ဒရယ်	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၅		မုရစ်ကလေး	တကူဟအိုး	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	NR
၆		ကရင်ဝင်းစိန်	မူဆလင်စု	မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR

၇		ကလော့	ကလော့	ကွန်ကရစ်ရေပြန်တံတား	တံတား	၂	NR
၈		ဟင်္သာကုန်း	ဟင်္သာကုန်း	မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၉		ခနီးဟူ	တော်ပကောက်	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	ရေပေးရေး	၂	R
၁၀		ဖန်ဖ	ဖန်ဖ	လျှပ်စစ်မီးကြိုး သွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီး	၂	NR
၁	ဘီးလင်း	အဟုန်ဝ	ဖိုးကျည်ဆိပ်	ကျေးရွာခန်းမပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ကဒီပု	သစ်ချိုတောင်	လူထုနားနေဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		လိပ်ကုန်း	လိပ်ကုန်းရွာ ဧေး	မူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		အနိုင်းပွန်	ကဘိုက်အုတ် ဖို	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	တံတား	၁	R
၅		နှင်းပလဲ	ရေဖြူကန်	ကွန်ကရစ်လမ်း	လမ်း	၁	NR
၆		မူသင်း	ဝိုင်းပတ်	ရွာချင်းဆက်မြဲသားလမ်း	လမ်း	၁	NR
၇		ကြာကွင်း	အဟုန်ဝအနေ ဘက်	ကွန်ကရစ်တံတားဆောက် လုပ်ခြင်း	တံတား	၂	R
၈		ဂုံညင်းနဲ	ဂုံညင်းနဲ	ကျောက်ချောလမ်းဖောက် လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၉		ပိတိ	ဖိုးကော်ထော	စိုက်ပျိုးရေးကန်	ရေပေးရေး	၂	VR
၁၀		ပိတိ	ဘင်ဘန်	လျှပ်စစ်မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၁	VR
၁	ကြာအင်း ဆိပ်ကြီး	ကြာအင်းရွှေ ဒိုး	မင်္ဂလာကုန်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		လန်ဖား	လန်ဖား	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR

၃		ထိဝါကလု	ထိဟုတ်မော်	ကျေးရွာအစည်းဝေးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	VR
၄		ကြာအင်းရွှေ ဒိုး	ရွှေဒိုး	ကွန်ကရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၅		ခလယ်	ခလယ်ရွာလေး း	ဂျင်းကျောက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	R
၆		နတ်ဂေါင်းက မ်းနား	ဂွန်ဘီ	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	R
၇		ဒန်း	ဆီဆုံ	မြေသားလမ်း	လမ်း	၂	R
၈		ကြာအင်းရွှေ ဒိုး	ဦးချမ်းကုန်း	ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	တံတား	၂	NR
၉		ကျခက်ခ ကျောင်း	ကျခက်ခ ကျောင်း	Gravity Flow Water Supply	ရေပေးစေရေး	၂	NR
၁၀		ထိဝါကလု	ထိဝါကလု	ရေအားလျှပ်စစ်တိုးချဲ့ခြင်း နှင်းမီးတိုင် သွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီး	၂	VR
၁	ကန်ပက် လက်	ငွန်လောင်း	ငွန်လောင်း	မူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၃	R
၂		ကန့်သာရုံ	ပါကွန်း	လူထုနားနေဆောင်	အဆောက်အဦး	၃	NR
၃		ခိတော်	မဆွာတို့	ကျန်းမာရေးဌာန	အဆောက်အဦး	၄	R
၄		ကန့်သာရုံ	ပါကွန်း	ကလေးငယ်စောင့်ရှောက် ရေးအဆောက်အအုံ	အဆောက်အဦး	၄	NR
၅		လွန်းဒွန်	လွန်းဒွန်	မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၃	VR
၆		ကြက်ခြံ	ငါဒို	မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၃	R
၇		ပင်လောင်း	လွီ	တံတားသွယ်တန်းခြင်း	တံတား	၄	ER
၈		လွန်းဒွန်	မဆွာတို့	မြေသားလမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း	လမ်း	၄	VR

၉		မှန်တောင်	လှိုင်းဒုတ်	Gravity Flow Water Supply	ရေပေးရေး	၃	ER
၁၀		ငွန်လောင်း	ချင်းလက်မွန်	Gravity Flow Water Supply	ရေပေးရေး	၄	VR
၁	ဆော	ကျွန်းတော	ကျွန်းတော	အလယ်တန်းကျောင် းပြုပြင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၂		ပုလဲ	ဖျံ	မြေသားလမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း	လမ်း	၁	VR
၃		ရင့်ရဲ	ရင့်ရဲ	ကွန်ရစ်တံတား ဖောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	R
၄		ကျိုင်းကြီး	ပါ ခကျောင်း	စိုက်ပျိုးရေးသွယ်တန်းခြင်း	ရေပေးရေး	၁	R
၅		ယော်လက်ပံ	ဆောလက်ပံ	မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၁	ER
၁	အမ်း	လောင်းဒွန် ကွင်း	မော်ကြီး	ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		စခန်းမော်	အောက်ဆင် ဂေါင်း	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၃		မြန်မာဘုတ် ခကျောင်း	ဘုတ်ခကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၄		တိုက်မော်	တိုက်မော်	ဂျင်းလမ်းခင်းခြင်း	လမ်း	၁	R
၅		တောင်ဖီလာ	လောင်းဆရာ ပြင်	ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	VR
၆		လွန်ကောက်	ပမြောင်းသဲ	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၇		ဒါလတ်	ဟန်ခကျောင် း	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၂	R
၈		ဂဏန်းပြင်	ကန်ဘွဲ့	မြေသားလမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း	လမ်း	၂	ER
၉		အမ်း(မြေတောက်)	ကျွဲတလင်း	ရေပေးရေး	ရေပေးရေး	၂	R

၁၀		အမ်း (တောင်)	ကြက်ရေစမ်း	မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	VR
၁	ပလက်ဝ	ခွေသောင်း	လောင်းတင်	လူထုခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၂		ငလျှာ	နှုန်းဘုန်း	မူလတန်းကျောင်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	VR
၃		ပိန္နဲတပင်	ခွန်ဘုတ်	မူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	R
၄		ပျဉ်ဝ	ကုဝ	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	လမ်း	၁	ER
၅		အောက်ဘ လယ်	အောက်ဘ လယ်	ကျေးရွာရှင်းကျောက် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း	လမ်း	၁	ER
၆		ကင်ဝ	ကင်ဝ	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	NR
၇		ကျီးလေး	ကျီးလေး (ထက်)	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတား	၁	VR
၈		လယ်လှ	လယ်လှ	ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	တံတား	၂	VR
၉		တုတ်ကေဝ	တုတ်ကေဝ	ရေပေးရေးစနစ် ပြုပြင်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	ER
၁၀		ရုပ်ဝ	ရုပ်ဝ	ရေသွယ်တန်းခြင်း	ရေပေးရေး	၂	NR
၁	မိုးညို	ထိန်တော	ပါရမီ	ကျောင်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ပေါက်ကုန်း	ဗောဓိကုန်း	ကျောင်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	NR
၃		ရေကင်း	ရေကင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၄		ဝဲကြီး	ချက်သာကုန်း	ကွန်ကရစ်တံတား	တံတား	၁	NR
၅		ဖုရားဂူ	ဖုရားဂူ	အဝီစိတွင်းတူးခြင်း	ရေပေးရေး	၁	R

၆		ရေကင်း	မင်းကြီး	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၇		ဆင်ဂေါင်း	ရေအိုးစင်ကုန် း	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	R
၈		လက်ပံကုန်း	လက်ပန်ကုန်း	မြေသားလမ်း ဖောက် လုပ်ခြင်း	လမ်း	၂	VR
၉		မင်းဒု	ဂုန်ညှင်းတန်း	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၂	VR
၁၀		အိုးဘိုကျွန်း	ရှစ်ကွက်	မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၂	R
၁	ပန်းတောင်း	ညောင်ပင်	ညောင်ပင်	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ဒေါင်းမနား	ရွာသစ်	ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	NR
၃		မကျီးထုံး	ကြို့ကုန်း	ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	NR
၄		ဖရုံကား	ကျားခမြေရာ	အဝီစိတွင်းနှင့်ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	VR
၅		ကိုင်းကြီး	ကိုင်းကြီး	မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၁	R
၁	ကြံခင်း	အလွန်	သာယာကုန်း	ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	R
၂		တလိုင်းကွင်း	ကျွန်းစု	ဂျင်းကျောက်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	လမ်း	၁	NR
၃		သဲဖြူ	မင်းတဲလ လေး	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၂	NR
၄		သစ်ဆိပ် ကိုင်း	အုတ်သျှစ် ကုန်း	မီးစက်	လျှပ်စစ်မီး	၁	R
၅		ပေါက်နွယ် စမ်း	မဲလီ	စာကြည့်တိုက် ဆောက် လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၆		ကြွက်မ	ငပိစု	အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ရေပေးရေး	၁	NR

၇		ချင်းမြောင်	ကြိုးကြာ တန်း	ဂျင်းကျောက်လမ်း	လမ်း	၁	NR
၈		ခုန်ကြီး	စန်တွန်	ကန်ကရစ်တံတား	တံတား	၁	R
၉		ဇီးပင်ကွင်း	ပေကုန်းကြီး	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်	ရေပေးရေး	၂	R
၁၀		ပေါက်နွယ် စန်း	သရက်တော	လူထုခန်းမဆောင် ဆောက် လုပ်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၁	လွိုင်ကော်	လွိုင်လင် လေး	လွိုင်လင် လေး	စာသင်ကျောင်း အဆင်မြှင့်တင်ခြင်း	အဆောက်အဦး	၁	R
၂		ထီးစခါး	ဒေါတဟေ	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	တံတား	၁	R
၃		နွားလဝိုး	သုံးမြိုင်ပခီးစံ ပြ	ဂျင်းကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း	လမ်း	၁	NR
၄		လောပိတ	စိုစလဲ	ရေပေးရေး	ရေပေးရေး	၁	R
၅		ဒေါပေါ်က လယ်	ဘာဒု	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးသွယ် တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီး	၁	NR

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကကြောင့်ပျက်စီးသွားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ**

၃၇။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြို့နယ် (၄၇)မြို့နယ်အနက်မှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော မြို့နယ် (၁၁)မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၁)ခုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ငွေကျပ် (၁၄၅.၇၆၈၄)သန်းအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအရေအတွက်အမျိုးအစားနှင့် ရန်ပုံငွေတောင်းခံထားမှုအား အောက်ဖော်ပြပါဇယားဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည် -



၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကကြောင့် ပျက်စီးသွားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစာရင်းနှင့် ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှု

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအရေအတွက်		လမ်း		တံတား		အဆောက်အအုံ		ရေပေးရေး		အခြား		ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှု (ကျပ်သန်း)	မှတ်ချက်
				ထိခိုက်မှု	ရန်ပုံငွေတောင်းခံမှု	အရေအတွက်	ကုန်ကျငွေ	အရေအတွက်	ကုန်ကျငွေ	အရေအတွက်	ကုန်ကျငွေ	အရေအတွက်	ကုန်ကျငွေ	အရေအတွက်	ကုန်ကျငွေ		
၁	နမ့်ဆန်	၁	၁	၁	၁											၄.၀	ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ
၂	တပ်ကုန်း	၁	၁	၂	၁	၁	၉.၉၃									၉.၉၃	
၃	ပလက်ဝ	၁	၁	၁	၁					၁	၀.၉						
၄	အမ်း	၈	၁၂	၁၃	၇	၃	၈.၇	၃	၂၆					၁	၄.၅	၃၉.၂	
၅	မင်းတုန်း	၁၀	၁၁	၁၂	၁၂	၇	၁၀.၄၅					၁	၁၅.၃	၄	၁၀.၈၈	၃၆.၆၄	မြေထောင့်ရံ
၆	ပင်လည်ဘူး	၂	၃	၃	၃	၂	၁၂.၁၇	၁	၁၃.၁၇							၂၅.၃၄	
၇	သာပေါင်း	၃	၆	၆	၆	၅	၃.၁၇	၁	၁.၀							၄.၁၇	
၈	ပျော်ဘယ်	၇	၇	၇	၇	၆	၉.၉၆							၁	၀.၆၆	၁၀.၆၂	ခြံစည်းရိုး
၉	ဖရူဆို	၁	၁	၁	၁	၁	၄.၅၅									၄.၅၅	
၁၀	ငပုတော	၁	၁	၁	၁									၁	၇.၈၇	၇.၈၇	ကျောက်စီ

																	မြေထိန်းနံရံ
၁၁	ကြာအင်း ဆိပ်ကြီး	၁	၁	၁	၁							၁	၂.၅			၂.၅	
	စုစုပေါင်း	၃၆	၄၅	၄၈	၄၁	၂၅		၅		၁		၂		၈		၁၄၅.၇၆၈	

၃၈။ စတုတ္ထစက်ဝန်း၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မပြီးပြတ်သေးသည့် မြို့နယ်များ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) ဘီးလင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁၁)ခုမှာတံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၂)ခု၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်း (၃)ခု၊ စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၂)ခု၊ ကျေးရွာခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း (၁) နှင့် အခြားလုပ်ငန်း (၃)ခု တို့ကျန်ရှိပါသည်။ ယင်းမြို့နယ်သည် ပဋိပက္ခ နယ်မြေဖြစ်ခြင်း၊ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ငွေကျပ် သန်း (၄၀)ကျော်သည့်အတွက် ဝယ်ယူရေးနည်းလမ်းစဉ်အရ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အားလုံး သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၈)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများမှာ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း (၅)ခု၊ တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁)ခု၊ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁)ခု၊ အခြားလုပ်ငန်း (၁)ခုတို့ ကျန်ရှိပါသည်။ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်သည် ပဋိပက္ခ နယ်မြေဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူရေး ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိပြီး နှောင့်နှေးကြုံကြာ ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အားလုံး သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ရမည်းသင်းမြို့နယ်

ရမည်းသင်းမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၆)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများမှာ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း (၂)ခု ရန်ပုံငွေ ရရှိချိန် နောက်ကျမှုကြောင့်မိုးရာသီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ တိယပတ်တွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေပေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း (၃)ခု မှာ ရေတွင်းတူးရာတွင် ရေထွက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါသည်။

(ဃ) ကြံခင်းမြို့နယ်

ကြံခင်းမြို့နယ်တွင် ရေပေးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ အစီစီတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ရေထွက်သောကြောင့် လုပ်ငန်း မအောင်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရန် ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်း ရုံးသို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ သည်။

(င) မိုးညိုမြို့နယ်

မိုးညိုမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၃)ခု ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများမှာ တံတားလုပ်ငန်း(၁)ခုနှင့် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးလုပ်ငန်း (၂)ခုတို့ဖြစ်ပါသည်။ မိုးညိုမြို့နယ်သည် ရေမြုပ် ဧရိယာ ဖြစ်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများမှာ နောက်ကျရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲအားလုံး ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(စ) ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆)ခုဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များသယ်ယူရာတွင် ခက်ခဲသည့်အတွက် လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် နောက်ကျရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ်တွင် လုပ်ငန်းအား နောက်ဆုံးအပြီးသတ် မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) မင်းတုန်းမြို့နယ်

မင်းတုန်း မြို့နယ်တွင် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆)ခုဆောင်ရွက် ရန်ကျန်ရှိပါသည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု ၈၀% မှာ အမှန်ကုန်ကျငွေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ပုံငွေဖြင့် အခြားလုပ်ငန်း အသစ်အား စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အပြီးလုပ်ငန်းသစ်အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျွန်းစုမြို့နယ်

ကျွန်းစု မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၂) အပြီးသတ်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။ ဆိပ်ခံတံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ မိုးရာသီနောက်ပိုင်းမှ ဆောင်ရွက် ရသည့်အတွက်ဖြစ်ပြီး ကျန်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းမှာ ကျေးရွာလူထုမှာ စီမံကိန်း ဒီဇိုင်း ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် နောက်ကျရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဈ) တပ်ကုန်းမြို့နယ်

တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင်မီးရရှိရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁)ခုမှာ ၉၅% ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာတွင် တိုင်ကြားခြင်းအား ဖြေရှင်းနေရသည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပိတ်သိမ်းမရ ဖြစ်နေပါသည်။ တိုင်ကြားခြင်း ကိစ္စဖြေရှင်း

ပြီးစီးပါက မြို့နယ်လျှပ်စစ် ဌာနမှ ပင်မခါတ်အားလိုင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

**(ည) မြောင်မြို့နယ်**

မြောင် မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးလုပ်ငန်းခွဲ (၂)ခု ပြီးစီးရန် ကျန်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသားအချို့မှ လက်ရှိ မီးလိုင်းအား ချိတ်ဆက်ရန် ဆန့်ကျင်နေမှုကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမပြီးစီးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းရန် တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

**(ဋ) ပလက်ဝမြို့နယ်**

ပလက်ဝ မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၅)ခု ပြီးစီးရန် ကျန်ရှိပါသည်။ လမ်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ တံတားလုပ်ငန်း(၂)ခုနှင့် ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခုတို့ဖြစ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုမှာ လုပ်ငန်းအမှန်ကုန်ကျငွေထက် လျော့နည်းနေသဖြင့် ပြန်လည်တွက်ချက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရသည့်အတွက် နောက်ကျခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ (၂)ခုမှာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြီးစီး မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုမှာ ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး မပိတ်သိမ်းမီ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးရန် ကျန်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**(ဌ) ဆီဆိုင်မြို့နယ်**

ဆီဆိုင် မြို့နယ်တွင် ကျန်ရှိသည့် ရေပေးရေး လုပ်ငန်း(၁)ခုမှာ ၈၀% ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။

**(ဍ) ငပုတောမြို့နယ်**

ငပုတော မြို့နယ်ရှိ ရေပေးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၂)ခုမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားပြီး ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းရုံး သို့ တင်ပြထားပါသည်။

**(ဎ) ပန်းတောင်းမြို့နယ်**

ပန်းတောင်း မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ (၁)ခုမှာ လူထုစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိနေပြီး ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

**(ဏ) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်**

ပျဉ်းမနား မြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးလုပ်ငန်းအား ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီမှ ပြင်ပခါတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် သဘောမတူ

သဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ သွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှု မရရှိပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

**လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း**

၃၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၏ ပထမနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များ၏ လက်ရှိအခြေအနေများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေအနေ နှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မှုများအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ **ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ** စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုများကို တွေ့ရှိရသည်။ ပထမနှစ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ကော်မတီများသည် ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ကော်မတီများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စု ရန်ပုံငွေမှ ၅% ကိုချန်လှပ်ထားပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်း၊လုပ်အားခ များအတွက်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျေးရွာလူထုမှ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ရန်ပုံငွေကောက်ခံ ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ထည့်ဝင်နိုင်ကြပါ သည်။

**ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စီမံကိန်းစာရင်းများအား စစ်ဆေးခြင်း**

၄၀။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အောက်ပါ စာရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ် ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစာရင်းများအား စစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်-

- (က) ဒေါ်ခင်သီတာအောင်                      ညွှန်ကြားရေးမှူး
- (ခ) ဒေါ်ခင်လေးမြင့်                              ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
- (ဂ) ဒေါ်ကေခိုင်ဇင်                                ဦးစီးအရာရှိ
- (ဃ) ဒေါ်ဝါဝါရှိန်                                    စာရင်းစစ် (၁)
- (င) ဦး အမ်ခေါင်ဇယ်                            စာရင်းစစ်(၃)
- (စ) ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြ                                စာရင်းစစ် (၃)

၄၁။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး စာရင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ အပြီးသတ်တွေ့ရှိချက်များအား ဆွေးနွေး အတည်ပြုခဲ့ပါသည် -

- (က) **အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်း**  
**စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်။** စီမံကိန်းကျေးရွာ အချို့၌ အသုံးစရိတ်ပြေစာ အချို့ တင်ပြနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် သုံးစွဲမှု မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဆီသုံးစွဲမှု

မှတ်တမ်းများ၊ ကြိုတင်ငွေမှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ဖွင့်လှစ်ရေးသွင်းထားမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**စံသတ်မှတ်ချက်။** Financial Management and Administration Manual အခန်း(၃)၊ ပိုဒ် -၃၄, အခန်း(၈)၊ အပိုဒ် ၁၄၀ နှင့် အခန်း(၉) ပုံစံ ၉-၇ တို့တွင် လိုက်နာရမည့် စံများ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

**ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း။** မြို့နယ် စီမံကိန်းရုံးတာဝန်ရှိသူများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အားနည်းခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိ သူများ၏ စီမံကိန်းဒေသများသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်မှု အားနည်း သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**အကြံပြုချက်။** စီမံကိန်းအသုံးစရိတ်များ သုံးစွဲရာတွင် Financial Management and Administration Manual ပါ သတ်မှတ်ချက်များအ တိုင်း ပြင်ဆင်အထောက်အထားများပြည့်စုံစွာထားရှိရန်၊ ယာဉ်သုံးစွဲမှု၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်မှု နှင့် စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှုများအတွက် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ကြိုတင်ငွေမှတ်ပုံတင်စာအုပ် များနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ဖွင့်လှစ်၍ ပြည့်စုံစွာ မှတ်တမ်းတင်ရေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ခ) **ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းနိုင်မှုအခြေအနေ**

**စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်။** တပ်ကုန်း၊ မိုးကောင်း၊ ဒီမောဆို၊ဖရူးဆို၊ ဖားဆောင်း၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ ကန်ပက်လက်၊ ပလက်ဝ၊ ကျွန်းစု၊ တနင်္သာရီ၊ မိုးညို၊ ပေါက်၊ ဆော၊ အမ်း နှင့် ငပုတောမြို့နယ်များတွင် ကြိုတင်ထုတ်ယူ ငွေများအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းနိုင်မှုမရှိကမြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**စံသတ်မှတ်ချက်။** ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၏ ၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်, ၀၂၆၈/ရသုံး-၁/ကျေးလက်(၂) ဖြင့် ညွှန်ကြားချက်အရ အသုံးစရိတ်တစ်ရပ်အတွက် ထုတ်ယူထားသော ကြိုတင် ငွေများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးသည့်နေ့မှ ရုံးဖွင့်ရက် (၁၀)ရက်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

**ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း။** မြို့နယ် စီမံကိန်းရုံးတာဝန်ရှိသူများ၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှု အားနည်းခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိ သူများ၏ စီမံကိန်းဒေသများသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်မှု အားနည်း သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**အကြံပြုချက်။** ကြိုတင်ထုတ်ယူငွေများအား ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် မြို့နယ် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိ သူများမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**(ဂ) ငွေလက်ကျန်များ လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်း**

**စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်။** လယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိ ရေအိုးစင်နှင့် အင်တောသာ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စီမံကိန်းအသုံးစရိတ်(Block Grant) ပိုလျှံငွေများအား လုပ်ငန်းပြီးစီး၍ လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ပြီး (၂)လ ကျော်ခန့် ကြာသည်အထိနှင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ရွာကြီးအင်း၊ လယ်ပိုင်းကြီး၊ မဲပုတ်၊ ဒေါင်းမိုး၊ အင်နက် နှင့် ကျောက်ပုံတောင်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ၄% စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်များအား လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီး အသေးသုံးစာရင်းများ ချုပ်ပြီး အနည်းဆုံး (၁၇)ရက်မှ အများဆုံး (၇၉)ရက်ကြာအထိ ငွေများ လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**စံသတ်မှတ်ချက်။** စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲအပိုဒ် -၃၆ နှင့် ၄၁၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်အရ အသုံးစရိတ်ပိုလျှံငွေများအား (၇)ရက် အထိသာ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

**ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း။** မြို့နယ် စီမံကိန်းရုံးတာဝန်ရှိသူများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ် ကဲမှုအားနည်းခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိ သူများ၏ စီမံကိန်းဒေသများသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်မှု အားနည်း သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**အကြံပြုချက်။** လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး စီမံကိန်းအသုံးစရိတ် (Block Grant) ပိုလျှံငွေများနှင့်၄% စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်များကို စီမံကိန်းလက်စွဲပါ သတ်မှတ်ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း ပြန်လည်အပ်နှံရန် မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံး တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

**(ဃ) ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေ**

**စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်။** စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှု အတွက် ပြန်လည်ပေးလျော်ရာတွင် ပစ္စည်းအစားထိုးပေးလျော်စေခြင်းနှင့် မူရင်းတန်ဖိုးထက် လျော့နည်းသည့် လျော်ကြေးငွေပေးသွင်းစေခြင်း စသည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးလျော်စေခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

**စံသတ်မှတ်ချက်။** မည်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သူများ (Management) အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ (Assets) ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး ဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်



လုံလောက်သော ဌာနတွင်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု စနစ်အား ချမှတ်ထားရမည့် တာဝန်ရှိသည်ဟု သိရှိလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

**ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း။** စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ပျောက် ဆုံးမှု အတွက် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုသူများ၏ တာဝန်နှင့် ပေးလျော်ရမည့် နည်းလမ်းများအား တိကျစွာ သတ်မှတ်နိုင်မှု မရှိခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**အကြံပြုချက်။** စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး လက်စွဲစာအုပ်တွင် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ပစ္စည်းကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူများ၏ တာဝန်နှင့် ပေးလျော်ရမည့် နည်းလမ်းတို့ကို တိကျစွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ဝယ်ယူရေး ကဏ္ဍ**

၄၂။ အစီရင်ခံသည့် နှစ်ပတ်လည်ကာလဖြစ်သည့် ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံးများသို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဝယ်ယူရေးနည်းလမ်းစဉ်များအတိုင်း ရုံးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား အောက်ဖော် ပြပါအတိုင်းအချိန်မီ ဝယ်ယူ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် -

(၁-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ မြို့နယ်များသို့ ပေးပို့ထားသည့် ပစ္စည်းများ

စဉ်	မြို့နယ်	မီးအား မြှင့်စက်	မီးစက်	မော်တော်ဆိုင်ကယ်		ကင်မရာ	ဗွီဒီယို ကင်မရာ	တယ်လီ ဖုန်း	ပရိဘော ဂ	ပရင်တာ	မိတ္တူ ကူးစက်	ဖက် (ဖံ )	ရအေး ပေးစက်	လေအေး ပေးစက်	Project or with Screen	မော်တော် ဆိုင် ကယ်ဦး ထုပ်	Desktop	Laptop	Tablets	
				110cc	125cc															
၁	မြစ်ကြီးနား	၁																		
၂	မိုးကောင်း	၁	၁		၁၀															
၃	ပူတာအို				၂၄	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁		၅	၆	၂၄
၄	ရွှေကူ				၁၈	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၄၈	၅	၆	၁၆
၅	လွိုင်ကော်	၁																		
၆	ဖားဆောင်း /ဘော်လခဲ /မယ်စွဲ	၁	၁			၁၀														
၇	လွိုင်ကော် /ရှားတော	၁	၁			၁၀														
၈	ဘားအံ	၁																		
၉	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး		၁																	
၁၀	လှိုင်းဘွဲ့				၇၈	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၁၆၈	၅	၆	၉၀
၁၁	ကျောက်ရိတ်				၄၈	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၁၀၈	၅	၆	၅၃
၁၂	မင်းတပ်	၁																		
၁၃	မတူပီ	၁	၁			၁၅														
၁၄	တွန်းဇံ				၂၁	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၅၄	၅	၆	၂၀
၁၅	မုံရွာ	၁																		
၁၆	ပင်လည်ဘူး				၂၅															
၁၇	ကျွန်းလှ				၂၄	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၃၀	၅	၆	၂၄
၁၈	ကနီ				၃၇	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၄၃	၅	၆	၃၉

စဉ်	ဗြို့နယ်	မီးအား မြှင့်စက်	မီးစက်	မော်တော်ဆိုင်ကယ်		ကင်မရာ	ဗွီဒီယို ကင်မရာ	တယ်လီ ဖုန်း	ပရိဘော ဂ	ပရင်တာ	မိတ္တူ ကူးစက်	ဖက် (စ်)	ရအေး ပေးစက်	လေအေး ပေးစက်	Project or with Screen	မော်တော် ဆိုင် ကယ်ဦး ထုပ်	Desktop	Laptop	Tablets	
				110cc	125cc															
၁၉	ထားဝယ်	၁																		
၂၀	ပဲခူး	၁																		
၂၁	ပန်းတောင်း	၁	၁		၁၀															
၂၂	သဲကုန်း			၅၈	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၆၄	၅	၆	၆၅	
၂၃	ရွှေကျင်			၁၉	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၂၅	၅	၆	၁၈	
၂၄	မကွေး	၁							၁၄											
၂၅	စေတုတ္ထရာ			၂၅																
၂၆	ဧတာ	၁	၁		၁၀															
၂၇	ပေါက်	၁	၁		၁၀															
၂၈	ထီးလင်း	၁	၁		၁၀															
၂၉	မန္တလေး	၁																		
၃၀	နွားထိုးကြီး	၁	၁		၁၀															
၃၁	ပျော်ဘွယ်	၁	၁		၁၀															
၃၂	ရမည်းသင်း	၁	၁		၁၀															
၃၃	မော်လမြိုင်	၁																		
၃၄	ပေါင်	၁	၁		၁၀															
၃၅	အမ်း			၂၅																

စဉ်	မြို့နယ်	မီးအား မြှင့်စက်	မီးစက်	မော်တော်ဆိုင်ကယ်		ကင်မရာ	နွီဒီယို ကင်မရာ	တယ်လီ ဖုန်း	ပရိဘော ဂ	ပရင်တာ	မိတ္တူ ကူးစက်	ဖက် (စီ)	ရအေး ပေးစက်	လေအေး ပေးစက်	Project or with Screen	မော်တော် ဆိုင် ကယ်ဦး ထုပ်	Desktop	Laptop	Tablets	
				110cc	125cc															
၃၆	စစ်တွေ	၁																		
၃၇	ပလက်ဝ		၁																	
၃၈	ပုဏ္ဏားကျွန်း			၃၇	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၈၆	၅	၆	၄၀	
၃၉	၉			၃၂	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၇၆	၅	၆	၃၃	
၄၀	ရန်ကုန်	၁																		
၄၁	ထန်းတပင်			၂၅																
၄၂	ကျောက်တန်း	၁	၁		၁၀															
၄၃	ကွမ်းခြံကုန်း	၁	၁		၁၀															
၄၄	တောင်ကြီး	၁																		
၄၅	ဆီဆိုင်	၁	၁		၁၀															
၄၆	မောက်မယ်			၂၃	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၅၈	၅	၆	၂၂	
၄၇	မာဘိမ်း			၁၄	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၄၀	၅	၆	၁၁	
၄၈	မိုင်းခတ်			၂၇	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၆၆	၅	၆	၂၇	
၄၉	ပုသိမ်	၁																		
၅၀	လေးမျက်နှာ			၂၅																
၅၁	ငပုတော	၁	၁		၁၀															
၅၂	ဓနုဖြူ			၇၈	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၈၄	၅	၆	၉၀	
၅၃	အင်္ဂပူ			၁၂	၆	၂	၁	၂	၇၆	၂	၁	၁	၁	၂	၁	၁၁၈	၅	၆	၁၃၁	
၅၄	နေပြည်တော်	၁																		
၅၅	တပ်ကုန်း			၂၅																
၅၆	ပျဉ်းမနား	၁	၁		၁၀															
	<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၂၃</b>	<b>၁၄</b>	<b>၆၀၀</b>	<b>၁၉၆</b>	<b>၂၂</b>	<b>၁၁</b>	<b>၂၂</b>	<b>၅၉</b>	<b>၅၅၀</b>	<b>၂၂</b>	<b>၁၁</b>	<b>၁၁</b>	<b>၂၂</b>	<b>၁၁</b>	<b>၆၉၀</b>	<b>၅၅</b>	<b>၆၆</b>	<b>၅၀၀</b>	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ်အသစ် (၁၆)မြို့နယ် သို့ ဖြန့်ဝေပေးသည့် ရုံးသုံး ပစ္စည်းများစာရင်း

စဉ်	မြို့နယ်	G-79	G-45	G-36	G-103								
		Motorcycle 110cc	Motorcycle 125cc (High Clearance)	Helmets	Desk – two drawers	Desk – one drawer	Desk – chairs	Commercial Chair	Folding Chairs	Bookcase (open shelf cupboard with 2 shelves)	Book case	Filing Cabinet	Fax and Phone Stand
၁	ပုတာအို	၂၄	၆	၆၀	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၂	ရွှေကူ	၁၈	၆	၄၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၃	လှိုင်းသွဲ့	၇၈	၆	၁၆၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၄	ထော့ကရိတ်	၄၈	၆	၁၀၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၅	တွန်းဇံ	၂၁	၆	၅၄	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၆	ကျွန်းလှ	၂၄	၆	၆၀	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၇	ကနီ	၃၇	၆	၈၆	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၈	သဲကုန်း	၅၈	၆	၁၂၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၉	ရွှေကျင်	၁၉	၆	၅၀	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၀	မိုင်းခက်	၃၇	၆	၈၆	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၁	ထောက်မယ်	၃၂	၆	၇၆	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၂	မဘိမ်း	၂၃	၆	၅၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၃	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၁၄	၆	၄၀	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၄	ပွဲ	၂၇	၆	၆၆	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၅	နေဖြူ	၇၈	၆	၁၆၈	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၆	အင်္ဂပူ	၁၁၂	၆	၂၃၆	၁၂	၆	၁၈	-	၃၀	၅	-	၄	၀
၁၇	ပြည်ထောင်စု	-			-	၂၁	၃၁	၂၀	၃၀၀	-	၁၂	၅	-
	Sub Total	၆၅၀	၉၆	၁၄၉၂	၁၉၂	၁၁၇	၃၁၉	၂၀	၇၈၀	၈၀	၁၂	၆၉	၁၆
	Total Issue	၁၇၆၉	၁၂၁		၁၉၂	၁၁၇	၃၁၉	၂၀	၇၈၀	၈၀	၁၂	၆၉	၁၆
	In Stock	၁၁၁၉	၂၅	-၁၄၉၂	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀

စဉ်	မြို့နယ်	G-100	G-101		G-102		G-97				G-99	G-105	G-63	G-63 / G-38
		GSM Phone Handset	Still Camera	Video Camera	Water Cooler	Air-Conditioner	printer (color)	Photo Copier	All in one printer	Scanner	Projector with screen	Safety Life Jackets	Desktop	Laptop
၁	ပူတာအို	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၂	လွင်ကျ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၃	လှိုင်းဘွဲ့	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၄	ထောင့်ကရိတ်	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၅	တွန်းဇံ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၆	ကျွန်းလှ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၇	ကနီ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၈	သဲကုန်း	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၉	လွင်ကျင်	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၀	မိုင်းခက်	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၁	မောက်မယ်	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၂	မာဘိမ်း	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၃	ပုဏ္ဏားကျွန်း	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၄	ပွဲ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၅	ခနုဖြူ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၆	အင်္ဂပူ	၂	၂	၁	၁	၂	၁	၁	၁	၁	၁		၅	၆
၁၇	ပြည်ထောင်စု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Sub Total	၃၂	၃၂	၁၆	၁၆	၃၂	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆		၈၀	၉၆
	Total Issue	၃၅	၄၀	၁၈	၂၂	၃၂	၁၇	၁၆	၂၃	၂၆	၁၆			
	In Stock	၃	၈	၂	၆	၀	၁	၀	၇	၁၀	၀			

၄၃။ ပဉ္စမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ်အသစ် (၁၆)မြို့နယ်၏ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုအခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	အဖွဲ့ အစည်း	ကျားရွာ အုပ်စု	ကျားရွာ	CFအရေ အတွက် (စရွာ/ CF- ၁)	TFအရေ အတွက် (၁၄ရွာ/ TF-၁)	မှတ်ချက်
ကရင်ပြည်နယ်	လှိုင်းဘွဲ့	MGRI JV	၇၂	၄၄၈	၅၆	၃၂	
	ဝေကဘူကရိတ်		၅၃	၂၅၉	၃၂	၁၉	
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး	ကျွန်းလှ	NAG	၃၄	၁၁၃	၁၄	၈	
	ကနီ		၄၅	၁၈၈	၂၄	၁၃	
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး	ရွှေကျင်	VNG	၃၁	၈၂	၁၀	၆	
ကချင်ပြည်နယ်	ပူတာအို	PKW	၁၄	၁၁၂	၁၄	၈	
	ရွှေကူ		၁၇	၆၈	၉	၅	
ရှမ်းပြည်နယ်	မဘိမ်း		၁၆	၄၈	၆	၃	
ချင်ပြည်နယ်	တွန်းဇံ	Cardno	၃၁	၉၁	၁၆	၉	CF=၁၁, TF=၇
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး	ဓနုဖြူ		၆၃	၄၄၉	၅၆	၃၂	ခန့်ထားဆဲ
	အင်္ဂပူ		၇၂	၆၅၂	၈၂	၄၇	
ရှမ်းပြည်နယ်	မောက်မယ်		၈	၁၀၃	၁၃	၇	ခန့်ထားဆဲ
ရှမ်းပြည်နယ်	မိုင်းခတ်	QBS	၁၂	၁၂၉	၁၆	၉	ခန့်ထားဆဲ
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး	သဲကုန်း	QBS	၄၉	၃၂၂	၄၀	၂၃	ခန့်ထားဆဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ပုဏ္ဏားကျွန်း	QBS	၉၂	၁၉၃	၂၄	၁၄	ခန့်ထားဆဲ
	ဝ		၃၃	၁၅၆	၂၀	၁၁	
<b>ေါင်း</b>			<b>၅၁၇</b>	<b>၃၀၆၄</b>	<b>၃၈၈</b>	<b>၂၂၁</b>	

**ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း**

၄၄။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်စီမံကိန်းရုံးတွင် အောက်ဖော်ပြပါဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်

- (က) စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ (၁) ဦး
- (ခ) ဒုတိယစီမံကိန်းဒါရိုက်တာ (၁) ဦး
- (ဂ) စီမံကိန်းမန်နေဂျာ (၁) ဦး
- (ဃ) စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ (၃) ဦး
- (င) ဝယ်ယူရေးဌာန (၁၇) ဦး
- (စ) သင်ကြားရေးဌာန (၁၇) ဦး
  - (၁) သင်ထောက်ကူကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း (၇) ဦး
  - (၂) ကျေးလက်ဦးစီးဝန်ထမ်း (၁၀) ဦး
- (ဆ) ဘဏ္ဍာရေးဌာန (၂၆) ဦး
  - (၁) ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင် (၄) ဦး
  - (၂) ကျေးလက်ဦးစီးဝန်ထမ်း (၂၂) ဦး
- (ဇ) အခြေခံအဆောက်အဦးဌာန (၁၀) ဦး
  - (၁) ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း (၃) ဦး
  - (၂) ကျေးလက်ဦးစီးဝန်ထမ်း (၇) ဦး
- (ဈ) Gender (၅) ဦး
- (ည) Social Accountability (၁၆) ဦး
- (ဋ) M&E/ MIS (၉) ဦး
  - (၁) ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း (၃) ဦး
  - (၂) ကျေးလက်ဦးစီးဝန်ထမ်း (၆) ဦး
- (ဌ) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (၁၂) ဦး

၃၆။ ပြည်နယ်/တိုင်းအတွင်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုအခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -



စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်း	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး ဝန်ထမ်း	နည်းပညာ အကြံပေး
၁	စစ်ကိုင်းတိုင်း	၆	၃
၂	မကွေးတိုင်း	၅	၃
၃	မန္တလေးတိုင်း	၇	၃
၄	ပဲခူးတိုင်း	၇	၃
၅	ရန်ကုန်တိုင်း	၇	၂
၆	တနင်္သာရီတိုင်း	၉	၁
၇	ရှမ်းပြည်နယ်	၉	၃
၈	ရခိုင်ပြည်နယ်	၈	၃
၉	ချင်းပြည်နယ်	၉	၃
၁၀	ကချင်ပြည်နယ်	၇	၂
၁၁	ကရင်ပြည်နယ်	၇	၂
၁၂	ကယားပြည်နယ်	၉	၂
၁၃	မွန်ပြည်နယ်	၈	၃
၁၄	ဧရာဝတီတိုင်း	၅	၃
၁၅	နေပြည်တော်တိုင်း	၆	၃
	ပေါင်း	၁၀၉	၃၉

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ဝတ္တရားများ

၄၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ရပါသည် -

(က) ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်များ၏ ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိစီမံကိန်းချမှတ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
- (၂) ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (CSO, NGO)
- (၃) ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုခြင်း
- (၄) စီမံကိန်းမြို့နယ်အဖွဲ့များ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
- (၅) နိုင်ငံခြားသား experts/consultants/auditor များစုစည်းခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးခြင်း
- (၆) စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းလက်ထောက်နှင့်အတူ အချိန်မီအစီရင်ခံ ခြင်း
- (၇) နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ (ဒီဇိုင်း/ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ)

- (၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် CFs/TFs များကို သင်တန်းပေးခြင်း
- (၂) TFများကိုဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းများနှင့် ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း နှင့် BoQတို့အတွက်သင်တန်း များပေးခြင်း
- (၃) MEPE, DoIကဲ့သို့သော မြို့နယ်အဆင့် နည်းပညာဌာနများဖွဲ့စည်း ခြင်း
- (၄) ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်ရှိပို့ဆောင်ရေးစီမံချက်နှင့် NCDDP VDPနှစ်ခုကြားပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံချက်များ အားပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ရေဘေးလုံခြုံစိတ်ချမှုစီမံ ချက်စသည် တို့ဖြစ်သည်။
- (၄) မြို့နယ်အဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဒီဇိုင်းများအားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ခြင်း
- (၅) EMPများအားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
- (၆) O&M plan များအားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
- (၇) နည်းပညာစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဂ) **GESI**

- (၁) ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ လူမျိုးစုလှုပ်ရှားများ၊ မြို့နယ် ကျား/မ ရေးရာတိုးတက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ အား လုံးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
- (၂) VDP/VTDPsများတိုးတက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း
- (၃) မြို့နယ်စီမံကိန်း၏ စီမံချက်နှင့် VDPတို့ပေါင်းစပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
- (၄) Project branding, visibility, network, campaign, conference, entertainment တို့ကဲ့သို့သော သတင်းဆက်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း
- (၅) မြို့နယ်ရှိ GESI အဖွဲ့အားသင်တန်းပေးခြင်း
- (၆) အပြန်အလှန်လေ့လာရေးခရီးများကို စုစည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ) **M&E/MIS**

- (၁) မြို့နယ်များ၏ M&E/MISများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
- (၂) မြို့နယ်များ၏ ၃လပတ် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများကို ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး တစ်ခုအတွင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း စဉ်များ ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ စာစောင်များနှင့် ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်ချက်များ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။ စုစည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသ ကြီးများ၏ ၃လပတ်အစီရင်ခံစာကို Union NCDDPရုံးသို့ တင်ပြပြီး ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၏ DRD head မှသက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပေးပို့သည်။
- (၃) Union Team ၏ လက်ထောက်အဖြစ် လိုအပ်သော M&E/MISသင်တန်း

(င) **ဓနအကြံပြုခြင်း**

- (၁) Union GHM team နှင့်အတူ တုံ့ပြန်ချက်များကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ခြင်း
- (၂) Township GHM teamနှင့် ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ပြီးအစီရင်ခံ ခြင်း
- (၃) လိုအပ်ပါက ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးရန်အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နည်းပညာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း
- (၄) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၏ GHM အစီရင်ခံစာများကိုပုံမှန်ပြင်ဆင် ခြင်း

(စ) **ICT**

- (၁) လိုအပ်ချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ICT၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း
- (၂) local ICT companie များမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူ၍ Union team သို့ထောက်ကူပြုစေခြင်း

(၃) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရှိ IT ဌာနများ/ ကုမ္ပဏီများနှင့် အင်တာနက် / ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း

၄၆။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များမှ ကာလတို/ကာလရှည်များဖြင့် စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်နှင့်ပဉ္စမနှစ်များတွင်သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို DRD counterpartများထံသို့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပေးပို့ အစီရင်ခံသည့်အပြင် ပြည်နယ်တိုင်း မှ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျေးလက်ဦးစီးစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ UTA expert များသည် လိုအပ်ချက်အရ အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ်များသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးကြပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်း စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများ မြို့နယ်ရှိစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ သုံးလ တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် တတ်ရောက်ကြပြီး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်း အားလုံးသည် သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ (၃)လတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံရပါ သည်။

**စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်များ**

- (က) လူအများသည် စီမံကိန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုအသုံးပြုကြသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို ဒီဇိုင်း ထုတ်ပံ့ပိုးပါ သည်။ စီမံကိန်းတွင် အခြေခံအားဖြင့် ကျေးရွာရှိလူဦးရေကို အခြေခံပြီး အမျိုးသမီးများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုမှာ ၅၁% ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါ သည်။
- (ခ) စီမံကိန်းကျေးရွာများ စီမံကိန်းရေးဆွဲရာ၌ ပါဝင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ ပါဝင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ပါဝင်ခြင်းများသည် အိမ်ထောင်စု များ၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ မတ်လကုန်တွင် မြို့နယ် ၆၃ မြို့နယ်အနက်မှ ၅၂ မြို့နယ်မှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည်။
- (ဂ) ကျေးလက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုး အစား နှင့် အရေအတွက် - ၂၀၁၇ဒီဇင်ဘာ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဆုံးသတ်ချိန်တွင် မြို့နယ် ၄၇ မြို့နယ်၌ စီမံကိန်း ၇၆၇၀ ခုပြီးမြောက်ခဲ့သည် ။ထပ်တိုးလာသော မြို့နယ် အသစ် ၁၆ မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာနှင့် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီတွင် သင်တန်းများစတင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သယ်ယူပို့ ဆောင်ခြင်း (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ) ကိုအဓိက ကဏ္ဍ အဖြစ်ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၂၈၆)ခုဖြစ်ပြီး၅၆% ဖြစ်ပါ သည်။
- (ဃ) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို စီမံကိန်းလက်စွဲ၏ နည်းပညာနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှုဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံပွဲတွင် အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျေနပ် အားရမှု (၉၇%)နှင့် မကျေနပ်မှု(၃%)ခန့်ဖြင့် လူထုစစ်ဆေးပွဲ (၇၆၆၄)ကို

အောင်မြင်စွာကျင်းပ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတွက်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်နှင့် လူထုကြား TFsနှင့် township DRDအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲမှု အတွေ့အကြုံရှိမှု ပိုမိုလိုအပ်ပါ သည်။

- (င) ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့ဝင်များသည် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့၏အရည်အသွေးအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်း - ယခုအစီရင်ခံစာကာလ အပြီးသတ်ချိန်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရွာသားပေါင်း (၇၆၂၆၈)သည် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးအင်အား ပူးပေါင်းပါဝင်မှု များလာပါ သည်။ (ခန့်မှန်းချေ ၆၅%)၊ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိလာသော အချိန်တွင် စီမံကိန်း၌ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု တိုးပွားလာသည်။
- (စ) စီမံကိန်း၏ ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းခြင်း - ဤကဏ္ဍကို လုပ်ဆောင်မှုတွင် လက်ခံရရှိသော ဝေဖန်အကြံပြုစာမှာ ၁၂၁၇၉ အား ဖြေရှင်းပြီး ၉၉% ကို ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်။

**သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း**

၄၇။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်၊ နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-II)တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကျေးရွာအဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း ကို လုပ်ငန်းစဉ် (၆)ရပ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းတွင်းဝန်၊ ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ World Bank မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGOs/INGOs များ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြို့နယ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ စတုတ္ထနှစ် ဆုရကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၈၀၃)ဦး တတ်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် အကြံပေးမှုရယူခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံကိန်းပြီးဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄၈။ တစ်နှစ်တာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှ ရရှိလာသော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ နည်းပညာစစ်ဆေးမှုရလဒ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ၊ လူထုစစ်ဆေးမှုရလဒ်များအား သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း အားဖြင့် နောင်လာမည့်စီမံကိန်းနှစ်အတွက် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများနှင့် အကြံဉာဏ်များရယူခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်နှစ်ပတ်လည် ပြည်ထောင်စု အဆင့်စီမံကိန်း သက်ဆိုင်သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည့် စီမံကိန်းတစ်နှစ်တာကာလ အတွင်းမှရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို မျှဝေဆွေးနွေး အဖြေရှာ၍ ပူးပေါင်း

ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်၊ ဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသော အကြံပြုချက်များကို နောင်လာမည့် စီမံကိန်းနှစ်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

၄၉။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း နှစ်ပတ်လည် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲအား မကျင်းပမီ စည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ်ကို (၁၄-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၂-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ်ကို (၂၄-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၉-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ နည်းပညာမှူးများဖိုရမ်ကို (၃-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၈-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိလည်းကောင်းအသီးသီးကျင်းပ၍ ကဏ္ဍအလိုက်အတွေ့အကြုံများ၊ အောင်မြင်မှုများ၊ စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သော အကြံပြုချက်များကို မြို့နယ်အသီးသီးမှ စီမံကိန်း ကိုအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ INGOs/NGOs နှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်း လက်စွဲအား လိုအပ်သည်များကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်အတွက် ထောက်ခံအကြံပြုချက် များကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၄၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် နှစ်ပတ်လည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သက်ဆိုင်သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ၏ ပထမနေ့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကိုအခြေခံ၍ စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့၊ ဒုတိယနေ့တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် နည်းပညာအကြံပေး ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံကိန်းမြို့နယ်မှနည်းပညာအကြံပေးဝန်ထမ်းများ၊ INGOs/NGOs နှင့်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များသည်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ အောက်ပါအတိုင်းခေါင်းစဉ်ကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်-

(က) စီမံကိန်းလက်စွဲတွင် စီမံရေးရာ၊လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်လိုသော အချက်များ

- (၁) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များကို စီမံကိန်း လက်စွဲတွင် ဖော်ပြရန်၊
- (၂) စည်းရုံးရခက်ခဲသောကျေးရွာများတွင် အစည်းအဝေး (၃)ကြိမ်အထိ ခေါ်ယူ သော်လည်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီခြင်းမရှိသော ကျေးရွာများကို လက်ရှိ စီမံကိန်း စက်ဝန်းမှ ရပ်ဆိုင်းနိုင်ခွင့် ထည့်သွင်းရန်။
- (၃) စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသည့် မြို့နယ်များတွင် အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်များကို မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားရန်၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားနိုင်သည့် အဆင့်ကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အထိသာ အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ရန်၊
- (၄) Exit Strategy နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို ညွှန်ကြားချက် သီးသန့်ထုတ်ပေးရန်၊
- (၅) ဖြန့်ဝေမည့် Phone Sticker တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရုံးဖုန်းနံပါတ်သာ ထည့်ရန်၊ လက်ကမ်းစာစောင်များအစား ပိုစတာများကိုသာ ပိုထုတ်ပေးရန် နှင့်မြို့နယ်များကို Soft Copy များပေး၍ မြို့နယ်အစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကမြောင်း၊
- (၆) ကျေးရွာအဆင့် ကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များသို့ပေးသည့် သင်တန်းများကို Communication, Social ,Accountability& Gender များမှ

ကိုယ်တိုင်အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် တိုက်ရိုက်ပို့ချရန်၊ သင်တန်းများတွင် Case Studies များများ ထည့်ပေးရန်၊ စီမံကိန်းမြို့နယ်အသစ်များတွင် Start-up Training သို့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်စီမံကိန်း ဦးစီးမှူးတို့အား ဆော်ယူသင်တန်းပေးရန်၊

- (၇) စီမံကိန်းလက်စွဲတွင် မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းများအတွက် Budget သုံးစွဲရန် ဖော်ပြပေးရန်။
- (၈) အစီရင်ခံစာတွင် ကျား/မ သင်တန်းရေးရာခေါင်းစဉ်ထည့်ပေးရန်၊ Gender Report ကို စီမံကိန်းလက်စွဲတွင် ထည့်ပေးရန်၊

**(ခ) ကျား/မရေးရာကဏ္ဍတွင် ပြင်ဆင်လိုသောအချက်များ**

- (၁) တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေ ကိုရှာဖွေချဉ်းကပ်စဉ်းရုံး ရန်၊ အမျိုးသမီးများကျွမ်းကျင်ရာကဏ္ဍတွေမှာ နေရာပေးသင့်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်လုံခြုံမှု အတွက် သက်ဆိုင်ရာနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၂) လူနည်းစုအုပ်စုများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မည့် နေရာ၊ အချိန်၊ တက်ရောက်မှု အားလုံးသေချာစေရန်၊
- (၃) အမျိုးသမီးများအား သီးသန့်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ အားလပ်ချိန်တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများအား စကားပြောခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့်ပေးရန်နှင့်တင်ပြ လာသည့် ကိစ္စရပ်များအား ထောက်ခံပေးရန်၊ အသိအမှတ် ပြုပေးရန်၊
- (၄) အစည်းအဝေးများတွင် အသိပညာပေးခြင်း (လူထုအားသင်တန်း ပေးခြင်း)

**(ဂ) အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်ပြင်ဆင်လိုသောအချက်များ**

- (၁) စာမျက်နှာ(၁၄၄) ၊ ပုံစံ (၁၄) တွင် မြေပိုင်ရှင်၏“ ရာထူး” နေရာတွင် “အလုပ်အကိုင်” ဟုပြင်ဆင်ပေးပါရန်၊ ဒုတိယဇယားတွင် “ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသုံးချမည့် မြေယာအနေ အထား”အပြင်“ မြေအမျိုးအစား” ကိုပါတိကျစွာဖော်ပြပေးရန်၊
- (၂) “အကျိုးသက်ရောက်မည့်ဧရိယာ (စတုရန်း)ပေ ”အစား“ လှူဒါန်း သည့် ဧရိယာ” ဟု ပြောင်းလဲရေးသွင်းရန်၊
- (၃) ဆန္ဒအလျောက် လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ‘အကယ်၍ မြေအသုံးပြုသူ/ ပိုင်ရှင်သည် မိမိပိုင်မြေကို ဆန္ဒအလျောက် လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ‘အကယ်၍ မြေအသုံးပြုသူ/ ပိုင်ရှင်သည် မိမိပိုင်မြေကို စီမံကိန်းအား လှူဒါန်းလိုခြင်းမရှိပါက ဤပုံစံစာရွက် ပေါ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုဘဲ ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ “လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်သည်” ဆိုသော စကားရပ်အစား “မြေပိုင်ရှင်၏ နစ်နာမှုအတွက်နစ်နာကြေး တောင်းခံ လိုပါက ကျေးရွာအစီအစဉ်ဖြင့် အခြားသင့်လျော်သော နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်” ဟုပြင်ဆင်ပေးပါရန်၊
- (၄) မြေယာလှူဒါန်းသည့် ကိစ္စရပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် အသိ သက်သေအဖြစ် “ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး” မှ လက်မှတ်ထိုး ပေးရန်၊

(၅) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တာဝန်ယူမဆုံးဖြတ်နိုင်သော မြေယာ လှူဒါန်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် အသိသက်သေနေရာ၌ “ကွင်း စာရေး (သို့) မြေစာရင်းလက်ထောက်ဦးစီးမှူး” မှ စိစစ် လက်မှတ်ထိုး ပေးပါရန် စသည်တို့ အားပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်၊

(၆) စာမျက်နှာ(၁၅)၊စာပိုဒ်-၂၆-လိုင်း-၃ တွင် “ဒုတိယနှစ်နှင့်တတိယ နှစ်များတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုသည်အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သန်း ရှိရမည်” အစား“ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လို အပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေး ရွေးချယ် ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုသည် အနည်းဆုံးကျပ် တစ်သန်းခွဲ ရှိရမည်” ဟုပြင်ဆင်ပေးပါရန်။

(၇) စာမျက်နှာ(၁၆)၊စာပိုဒ်-၂၇-လိုင်း-၈ တွင် ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှု အား ထောက်ပံ့ငွေရာခိုင်နှုန်းများဖြင့် Union သို့ တင်ပြတောင်းခံရာတွင် ကြိုတင်တောင်းခံရန် သတ်မှတ်ကာလကို ကျေးရွာစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေပြီးနောက် (တစ်လအတွင်း) တောင်းခံ နိုင်သည်။” ဟုဖြည့်စွက် ပေးပါရန်။

(၇) စာမျက်နှာ(၂၂)၊ စာပိုဒ်-၃၇၁၏ နောက်ပိုင်းတွင် စာပိုဒ်ခွဲတစ်ခု ထပ်တိုးကာ (O&M) လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် ချက်ထည့်သွင်းရန်

(၈) နောက်ဆုံးနှစ်မြို့နယ်များတွင် (စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်၏ ပိုငွေ+ နောက်ဆုံးနှစ်၏ အသေးသုံးပိုငွေ + ၅% ) များကို O&M Plan အတွက် တရားဝင် အသုံးပြုနိုင်ရေး OM တွင်ထည့်သွင်းပေးရန်။

(၉) ယင်း (O&M) လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေအား ခွဲဝေ သုံးစွဲရာတွင် အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာတိုင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၁၀) နောက်ဆုံးနှစ် (O&M) လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေအား ထိန်းသိမ်းရန် ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်တွင် အဖွဲ့ဝင်(၅) ဦးပါဝင်သော အုပ်စု (O&M) လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီအသစ်ကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းကာအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး၏ လက်မှတ်ပါဝင်မှသာ ယင်း O&M ရန်ပုံငွေအား ထုတ်ယူသုံးစွဲ ခွင့်ရှိသည်။” ဟု ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးရန်။

(၁၁) စာမျက်နှာ(၁၈၂)တွင် contractor လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ တွင်“လုပ်သားများအတွက် Safeguard (လုပ်ငန်းခွင်သုံး) ပစ္စည်းများ အား မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမည်” ။

**(ဃ) M&E/MISကဏ္ဍတွင် အကြံပြုချက်များမှာ**

(၁) ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်တွင် M&E/MIS Assistant တစ်ဦးထားပေးရန်၊

(၂) ဆေးရုံးအစား တိုက်နယ်ဆေးရုံးပြင်ပေးရန်၊

(၃) M&E/MIS သင်တန်းများပေးရာတွင် မြို့နယ်များမှတခြား Township Technical Assistant/ Team Leader/ DRD များကိုပါ သင်တန်းများပေးရန်၊



(င) ဝယ်ယူရေးနှင့်သင်တန်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းအကြံပြုချက်များ

- (၁) စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) ခန့်ထားရာတွင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်သူများအားလုံးကို ပါဝင် အောင် ခန့်ထားပေးရန်၊
- (၂) Conflict Area များတွင် Conflict သင်တန်းများ၊ လမ်းခရီး အန္တရာယ်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ အား စီမံကိန်းမစခင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်၊

၅၀။ စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်အတွင်း မြို့နယ် (၄၇)မြို့နယ်မှ အောက်ပါ ကျေးရွာအုပ်စု များတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည် -

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၁	ကချင်	မိုးကောင်း	ကုန်းတန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကယား	ဒီမော့ဆို	ဒေါဘူးကူးကျေးရွာအုပ်စု
		ဖရူဆို	ဒိုးပရယ်ကျေးရွာအုပ်စု
		ဖားဆောင်း၊ဘော်လခဲ မယ်စွဲ	ဘော်လခဲကျေးရွာအုပ်စု
		လွိုင်ကော်၊ ရှားတော	လောပိတကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကရင်	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	ကြခတ်ခကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု
၄	ချင်း	ကန်ပက်လက်	ကျင်ဒွေးကျေးရွာအုပ်စု
၅	စစ်ကိုင်း	ပင်လည်ဘူး	နန်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု
		ဗန်းမောက်	ကန်တော်ကျေးရွာအုပ်စု
		မြောင်	ဆူးလေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
၆	တနင်္သာရီ	ကျွန်းစု	ရေကန်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု
		တနင်္သာရီ	တကူကျေးရွာအုပ်စု
၇	နေပြည်တော်	တပ်ကုန်း	ကျီးအင်းကျေးရွာအုပ်စု
		ပျဉ်းမနား	ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု
		လယ်ဝေး	သော်မှော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
၈	ပဲခူး	ကျောက်ကြီး	ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု

		ပန်းတောင်း	ကျီးတောကျေးရွာအုပ်စု
		မိုးညို	ဖလံခကျောင်းဝေးကျေးရွာအုပ်စု
၉	မကွေး	စေတုတ္တရာ	မြောင်းဦးကျေးရွာအုပ်စု
		ဆော	တောင်တက်ကျေးရွာအုပ်စု
		ထီးလင်း	ဦးနှောက်ကျေးရွာအုပ်စု
		ပေါက်	တင်ငုတ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု
		မင်းတုန်း	ထိန်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု
၁၀	မန္တလေး	ငါန်းဇွန်	ကျွဲစိမ်းကျေးရွာအုပ်စု
		ညောင်ဦး	ကူရွာကျေးရွာအုပ်စု
		နွားထိုးကြီး	ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
		ပျော်ဘွယ်	ရန်အောင်ကျေးရွာအုပ်စု
		ရမည်းသင်း	လွစင်ကျေးရွာအုပ်စု
၁၁	မွန်	ချောင်းဆုံ	ကော့မုပွန်ကျေးရွာအုပ်စု
		ပေါင်	အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု
		ဘီးလင်း	မရမ်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
၁၂	ရခိုင်	အမ်း	မြန်မာဘုတ်ခကျောင်းဝေးကျေးရွာအုပ်စု
၁၃	ရန်ကုန်	ကော့မှူး	ဝါးသင်္ခါကျေးရွာအုပ်စု
		ကျောက်တန်း	ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
		ကွမ်းခြံကုန်း	တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
		ထန်းတပင်	ပက်အင်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု
၁၄	ဧရာဝတီ	ကြံခင်း	ရှောက်ခုံကျေးရွာအုပ်စု
		ငပုတော	ကညင်ခကျောင်းဝေးကျေးရွာအုပ်စု
		လေးမျက်နှာ	ပိန်းအင်းကျေးရွာအုပ်စု
		သာပေါင်း	ဆီဆုံကျေးရွာအုပ်စု

၅၁။ စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မြို့နယ်များရှိ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများဖိုရမ်မှ ရရှိသော အကြံပြုချက်များအား နောက်ဆက်တွဲ(က) ဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

၅၂။ စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မြို့နယ်များရှိ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ်မှ ရရှိသော အကြံပြုချက်များအား နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

**စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း**

၅၃။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်စဉ်အတွင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများအား သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းအဖွဲ့များနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ (၃)လတစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပြီး (၃)လပတ်အစီရင်ခံစာများအား ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ ရုံးသို့ တင်ပြရပါသည်။ ကာလပတ်အတွင်း တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ အတွေ့အကြုံများ၊ လိုအပ်ချက်များအား ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ကြ ပါသည်။

၅၄။ အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း အနေဖြင့် စတုတ္ထနှစ်အတွင်း အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ် MIS အား ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပဉ္စမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် မြို့နယ်အသစ်(၁၆)မြို့နယ်၏ အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာ အခြေခံအချက် အလက်များအား စနစ်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပဉ္စမနှစ် Database များအား မြို့နယ်အလိုက် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီး M&E,MIS တာဝန်ခံများ TTA များ(မြို့နယ်သစ် ၉ မြို့နယ်)အား အချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသင်တန်းများ ပို့ချခြင်းများ အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် [ncddmis.com](http://ncddmis.com) တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများဖိုရမ် (၂၀၁၇) မှရရှိလာသော ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်များ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒေသအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	တစ်ချို့ကျေးရွာများတွင် ဝန်ထမ်းများ သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်များ ရှိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ တောလမ်းများကို သွားလာရ၍ ဝန်ထမ်း၏ လုံခြုံမှု စိုးရိမ်ခဲ့ရပါသည်။	သက်ဆိုင်သော ဌာနများ/ကျေးရွာ များ၏ ခွင့်ပြုချက် များကိုရယူပြီးသွားလာခဲ့ရပါသည်။ (မှတ်ချက် ။ ။စီမံကိန်းအင်္ကျီ၊ ဦးထုပ်များဝတ်ဆင်)	ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံမှုရှိသော အာမခံချက် ရှိသင့်သည်။
၂။	အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများ သွားလာရာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း၏ (Passport) ဖြတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်တွင် ပါဝင်သည့် (Date) သည် မြေပြင်လမ်းခရီးအရ အလုပ်လုပ်ရန်အချိန် လောက်ငှမှုမရခဲ့။	TTA/ဆက်ဆံရေးဌာန၊ ပြည်နယ် Infra များ နှင့်ဝန်ထမ်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။	တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း ၏ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကို စီမံကိန်း စ-လယ် -ဆုံး သွားခွင့်ရရှိရန် လုပ်ဆောင် ပေးသင့်ပါသည်။
၃။	တိုင်းရင်းသားရွာများသည် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ (အုပ်ချုပ်ရေးထက်)	ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား သီးခြား တွေ့ဆုံပြီး စီမံကိန်းအကမြောင်းအရာများအား အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ရပါ သည်။	MSR(သို့)မြို့နယ်အစည်းအဝေးကြီးများတွင် ၎င်းတို့အား ဖိတ်ကြားသင့်သည်။
၄။	ရန်ပုံငွေ ထိန်းသိမ်းမှုခက်ခဲ (စိုးရိမ်သောကြောင့်) လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်း။	ကိုယ်တိုင် သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည်များကို အသေးစိတ် စီမံခန့်ခွဲ ပေးရပါသည်။	ရန်ပုံငွေသုံးစွဲရန် သတ်မှတ် ထားသောရက်အား တိုးမြှင့် ပေးရန် (ဒေသအခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍)

၅။	တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာသွားရသော လူသွားလမ်းများတွင် မိုင်းထောင်ခြင်း၊ ထို့ကကြောင့်ကုန်းလမ်းမဟုတ်ပဲ ရေလမ်း မှ စက်လှေငှားသွားရသောကြောင့် ခရီးစရိတ်များ ပိုမိုကုန်ကျခြင်း။	လမ်းကမြောင်းပမြောင်း၍သွားရခြင်း	ယခုလို အခြေအနေတွင် အမှန်တကယ်ကုန်ကျသော ခရီးစရိတ်အား ပေးစေလို ပါသည်။
၆။	လွှတ်တော်အမတ်မှလွှမ်းမိုးမှုရှိနေခြင်း		TPIC အစည်းအဝေးများတွင် လွှတ်တော်အမတ် များပါ ဖိတ်ကြားပေးပါရန်။
၇။	ရွာသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ကော်မတီဝင်မိသားစုများတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များရှိခြင်းကကြောင့် စည်းရုံးရခက်ခဲခြင်း။	CDD Logo ပါတဲ့ပစ္စည်းများကို ယူဆောင် အသုံးပြုခဲ့ရပါ သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်းတွင် သွားလာခဲ့ရသည်။	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း ပေးစေချင်။
၈။	နယ်မြေအခြေအနေရ သွားရောက်စုံစမ်းရာတွင် တိကျသော သတင်းအချက်အလက်မရရှိခြင်းကကြောင့် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်ကမြောင်း အထောက်အထား မပြနိုင်ခြင်းကကြောင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရခြင်း။	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ကော်မတီဝင်များမှ အာမခံအ ဖြစ်ပမြောဆိုထောက်ခံပေးခဲ့ရသည်။ ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရသည်။	လိုအပ်သောဝန်ထမ်းကဒ် များကို အလျင်မြန်ဆုံး ထုတ်ပေးစေချင် ကျေးလက် ဦးစီးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဦး မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက် ပေးရန်
၉။	အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစီမံကိန်းမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကို လက်မခံဘဲ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်း။		ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြေရှင်း ပေးစေချင်။ DRD ဝန်ထမ်း

			များအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကို ယခုထက်ပို၍ တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်
၁၀။	တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှမဟုတ်ပဲလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသောသူ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ဝန်ထမ်းများမှကြိုတွေ့ရခြင်း	စကားလိမ်မာသုံး၍ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ (ယာယီအားဖြင့်)	ဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်၍နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံ၍ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပေးရန်။
၁၁။	Conflict Area မှာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် စစ်ဆေးခြင်းရှိသောကြောင့် ဝံ့ အချိန်ပြည့်တက်ရောက်မှုအားနည်း	ဒေသဆိုင်များ အဖွဲ့အစည်းများရှိ/မရှိ ဖုန်းဆက်မေးမြန်း၍ သွားလာခဲ့ရသည်။	
၁၂။	ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိတ်ပင်မှုကြောင့် စီမံကိန်းကာလနှောင့်နှေး။ ကျေးရွာလူထုစီမံကိန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်း	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ရုံးတွင်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။	၎င်းဧရိယာအားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အချိန်ပေး၍ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါရန်၊ Union အဖွဲ့မှ စီမံကိန်းမစတင်မီ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။

စီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြင်ဆင်ခြင်း/ခန့်မှန်းခမေတြတွက်ချက်မှု/လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသော BOQ နှင့် အမှန်တကယ် ကုန်ကျငွေ မညီမျှခြင်း ကျွမ်းကျင်သော ကန်ထရိုက်ရရှိရန် အခက်အခဲ။	DRD မှ အကြံဉာဏ်ယူ၍ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။	Regional Infra များကို ရွာဆင်း၍ ကူညီဖြေရှင်းပေးစေချင်သည်။ (အားနည်းချက်များ ကူညီစေချင်သည်။)
၂။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့် ဝှံ့ လူထုဆန္ဒအတိုင်း Design ပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးခေါ်၍ Design ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ ရပါသည်။	Technical Meeting တွင်ဆုံးဖြတ်ထားသော ဒီဇိုင်းအတိုင်းဖြစ်စေချင်။
၃။	ငွေကမြေးလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် Design လိုအပ်ချက်အတိုင်း မဆောင်ရွက်နိုင်။	Design များပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း Item များ လျော့ချ/ကျေးရွာထည့် ဝင်မှု။	TPIC/Design/Estimate များပြတ်မှ အုပ်စုငွေ ခွဲဝေပေးရန်။
၄။	လုပ်အားခ စကျေးနှုန်းကွာဟခြင်း။	RE ပြန်ဆွဲရခြင်း။	မြို့နယ် သက်ဆိုင်ရာများမှ စကျေးနှုန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများဆောင်ရွက်ရန်။
၅။	နောက်ဆုံး O&M Plan (5%) ကဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှု	-	-OM တွင် O&M ဆွဲရတဲ့အကြိမ်ရေ လျော့ချပေးရန် (၂ ကြိမ်မှ ၁ကြိမ်သို့)
၆။	Operation Manual တွင် O&M ဆွဲရတဲ့ အကြိမ်ရေ လျော့ချပေးရန် (၂ ကြိမ်မှ ၁ကြိမ်သို့)	အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများအားထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ရ။ Y.B နဲ့မကိုက်သောပစ္စည်းများ BE တွင် ထည့်ရ။	တိကျသော Guide Line ပေးရန်။
၇။	ရေသွယ်လုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်၍	မြို့နယ်ဝန်ထမ်းများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာ	တိကျသော Guide Line နှင့် သင်တန်းများ



	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်၊ ဥပမာ-ရေပိုက်လိုင်း အရွယ်အစားရွေးချယ် ရခြင်းများ	များနှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	ပေးရန်။
၈။	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် များ ရှုပ်ထွေးသော အခက်အခဲ(ပြည်နယ်/တိုင်း /Union အဆင့်)	ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့	လုပ်ငန်းမစတင်မီ Design ပိုင်းသေချာ စစ်ဆေး အတည်ပြုပေး စေချင်ပါတယ်
၉။	ကန်ထရိုက်တာများစာချုပ်စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းခြင်း။	မြို့နယ်မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း ဖြေရှင်းခဲ့	၀.၆ စာချုပ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းထည့်ဖို့၊ ပိုမို ခိုင်မာသော စည်းကမ်းနှင့် အရေးယူမှုများ၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ ထည့်သွင်းရန် လိပ်စာများ ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုရန် (ဥပမာ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊အိမ်ထောင်စု စာရင်း)
၁၀။	ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ချိတ်ဆက်ရသော လုပ်ငန်းတွင် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခြင်း။(ဥပမာ- ဆည်မြောင်း တာပေါင်တွင်ဖြတ်သန်း သွားလာခြင်း)	ခွင့်ပြုချက်အားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။	DRD မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ရွာများ အတွက် ဌာနဆိုင်ရာမှ လုပ်ငန်းမနှောင့်နှေး စေရန် ခွင့်ပြုချက်များ ကြိုတင်တောင်းခံ ထားရန်။
၁၁။	O & M နှင့်ပတ်သတ်ပြီးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သော်လည်း ရန်ပုံငွေရရှိမှု အားနည်းခြင်း။	ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင် O & M နှင့် ပတ်သက်ပြီး နားလည်အောင်ပမောခဲ့ပါသည်။  ရန်ပုံငွေကောက်ခံရန် ခက်ခဲသော ကျေးရွာများတွင် ငွေကမြေးအစား ဒေသထွက်ပစ္စည်းများ	O & M Guide Line ကို OM တွင် တိတိ ကျကျ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေး စေလို ပါသည်။  - လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် Video ဖိုင် များတွင် O&M, Ecops နှင့် ပတ်သက် သော အချက်များ ထည့်သွင်း ပေးစေလို

		ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။	ပါသည်။ <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPIC နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပူးပေါင်းပြီး O&amp;M Plan အား ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။</li> <li>- လုပ်ငန်းခွဲများကို တိကျသော သတ်မှတ်ချက် Design များ ချမှတ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ-ရေမြောင်းများထည့်ပေးရန်)</li> <li>- O&amp;M အသက်ဝင်မှု ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးပြီး အသက်ဝင်မှသာ နောက်နှစ်စက်ဝန်း အား စတင် ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးစေလိုပါသည်။</li> </ul>
၁၂။	Steel Structure၊ ကြိုးတံတား စသော Standard Design များ မရရှိခြင်း။	Regional Infra Team မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိမိဘာသာ ပြင်ပမှ ယူ၍ ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခဲ့ရပါသည်။	Union Infra Team မှ လုပ်ငန်းခွဲ များ မစတင်မီကွင်းဆင်းပေးစေလိုပါသည်။ (ကြိုးတံတား၊ Steel Structure) Refresher Training များတွင် Design Calculation များကို ထိထိမိမိ သင်တန်းပေးစေလိုပါသည်။ (ကြိုးတံတား၊ Steel Structure) Electrical နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။
၁၃။	Design & Estimate ရေးဆွဲရာတွင် တိကျသော	သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တွင် ပြီးစီးအောင် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်များ (ဥပမာ-	အချိန်လုံလောက်စွာ ပေးအပ်ရန်နှင့် Guide Line တိကျစွာ သတ်မှတ်ပေးစေလိုပြီး

	Guide Line နှင့် အချိန် လုံလောက်မှုတို့ မရှိခြင်း။	စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် ညဘက်အချိန်များ) မှ အချိန်များကို Design & Estimate ရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။	ကိုယ်ပိုင်အချိန် အသုံးပြုလိုက်ရသည့် အတွက်အစားထိုးခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ် စေလိုပါသည်။
၁၄။	Local Rate နှင့် Actual Rate ကွာခြားမှုကကြောင့် Estimate ရေးဆွဲရာ တွင် ငွေကမြေးကွာဟမှု ရှိခြင်း။	ကွာခြားသွားသည့်ငွေကမြေးပမာဏကိုကျေးလက် ဦးစီး ရုံးသို့တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်အားခ မယူတော့ဘဲ လုပ်အားခများကို လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။	ကျေးရွာပေါက်စကျေးများဖြင့်သာပစ္စည်း နှင့်လုပ်အားခတန်ဖိုးများအတိုင်း တွက်ချက် ခွင့်ပြုပါရန်နှင့် CFများကိုလည်းဒေသ စကျေးနှုန်း များကူညီစုံစမ်းပေးစေလိုပါသည်။
၁၅။	Estimate များအားမကြာခဏတွက်ချက်ရခြင်း။ (စတုတ္ထနှစ် မြို့နယ် များ)	ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	တိုင်း/ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ် DRD များ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ မစတင်မီ တိကျသော Guide Line များ ပေးစေ လိုပါသည်။
၁၆။	TTF သင်တန်းများတွင် Ecops/ EMP များကိုသာ ပို့ချခဲ့သည့်အတွက် Estimate များ တွက်ချက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာအချိန်ပေးပြီး ကွင်းဆင်း တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။	TTF များတွင် Design & Estimate (ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော) ကျွမ်းကျင်သော သူများကို Training တွင် ထည့်သွင်းပို့ချ ပေးစေလိုပါသည်။
၁၇။	နေရာအနေအထားအရ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရှားပါးခြင်း ကကြောင့်ရဲတဲကန်ထရိုက်ခေါ်သုံးရပြီး SP		

	အရေအသွေး ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ခြင်း။		
၁၈။	Design ပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလုပ်သားများမှ အင်/ယာ ညွှန်ကြားချက်ကိုမလုပ်ပဲ မိမိတို့၏ ရှေးရိုးစွဲ အတိုင်းလုပ်ရသည့်အခက်အခဲ	Design ပိုင်းပြန်ပြင်ခိုင်းခြင်း	ရွာလုပ်သားနှင့်ကော်မတီဝင်များအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းပေးစေချင်
၁၉။	ရေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကျေးရွာလူထုအားပြန်မရှင်းပြနိုင်သည့်အခက်အခဲ	ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ချက် ရလဒ်များကိုကျေးရွာအား ရှင်းပြခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာမှ နားလည်မှုအားနည်း	ရေနှင့်ပတ်သက်သောသင်တန်းထပ်ပေးစေလို ပါတယ်
၂၀။	လုပ်ငန်းခွဲများခြင်း၊ တာဝန်ကျရွာများ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာဝေးခြင်း၊ တစ်ပြိုင်နက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ် မလုံလောက်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းမရှိ၍မပြင် ရခြင်း တို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွဲ ကြီးကြပ်ရာတွင် အားနည်းခြင်း။ Local Rate နှင့် Actual Rate ကွာခြားမှုကြောင့် Estimate ရေးဆွဲရာတွင် ငွေကမြေးကွာဟမှု ရှိခြင်း။		လမ်းကမြောင်းတည်ပြီး တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ နီးစပ်သော အုပ်စုများ Assign ချထား ပေးရန်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့်ရက်ကို ကြိုတင်အကဲဖြတ်ကြားရန်။ ဆိုင်ကယ်အပို ပစ္စည်းများကို Union procurement မှ စီစဉ်ပေးရန်။ ကျေးရွာပေါက်စကျေးများဖြင့်သာ ပစ္စည်းနှင့် လုပ်အားခ တန်ဖိုးများအတိုင်း တွက်ချက် ခွင့်ပြုပါရန်နှင့် CF များကို လည်း ဒေသစကျေးနှုန်းများ ကူညီစုံစမ်း ပေးစေလို

			ပါသည်။
--	--	--	--------

လူမှုနှင့်သဘာပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	အကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအားနည်းခြင်း။ထောက်ပံ့ပေးရန်လုံလောက်မှုအားနည်းခြင်း Safety ပစ္စည်းများ မြို့နယ်များတွင် အလွယ်တကူ မရရှိခြင်း။Safety ပစ္စည်းများ Quantity ပြည့်ဝမှုမရှိခြင်း။	ကွင်းဆင်းတိုင်းအသိပညာပေးခြင်း ရနိုင်သလောက်သာ ပံ့ပိုးပေး နိုင်ခြင်း Quantity မပြည့်မီသော်လည်း လက်လှမ်း မှီသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းသာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။ ကော်မတီလုပ်သား တွေသာ အသိပညာပေးနိုင်ခြင်း။	အကာအကွယ် ပစ္စည်းများသုံးခြင်း၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ လက်ကမ်းစာစောင်ပံ့ပိုးပေးရန်။ Union ၊ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါက အကာအကွယ် ပစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်ပြီး စံနမူနာပြုလုပ်ဆောင် ပေးပါရန်။
၂။	EMPကိုကျေးရွာလူထုမှသိရှိလိုက်နာမှုအားနည်းခြင်း။EMP ရေးဆွဲရမည့် ပုံစံရှင်းလင်းတိကျမှုမရှိခြင်း (ဥပမာ- pc-15 EMP-Plan,EMP-Report)	သင်တန်းပေးပြီး Form ပုံစံအတိုင်း ရေးဆွဲ နိုင်ခဲ့သည်။	Pc-15ဖြင့်ရေးဆွဲရမည့်ဆိုပါက ပြည့်စုံတိကျသော ပုံစံဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပေးရန်။ EMP ကို ကျေးရွာလူထုမှ လိုက်နာမှု မရှိပါက အရေးယူပေးရန်
၃။	ပုံစံ-၁၄ မြေသားလှူဒါန်းမှုပုံစံ တိကျခိုင်မာမှုမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ခက်ခဲခြင်း	PC-14 အပြင်တံဆိပ်ခေါင်းပါသော စာချုပ် ဖြင့် ချုပ်ဆိုခြင်း	သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး တိကျခိုင်မာသော ပုံစံများ ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပေးရန်။

၄။	M&E ကော်မတီမှ ECoPs ၊ EMP စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်နိုင်မှု အားနည်း။	ကွင်းဆင်းတိုင်း အသိပညာ ပေးခြင်း	
၅။	စစ်ဆေးချိန် အတွင်းသာ Safty Material များကို အသုံးပြုခြင်း။	မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။	အသိပညာပေးသင်တန်းများ လုံလောက်စွာ ပေးစေလို

**သာဘဝဆေးအနုတရား၊ ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရေး**

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	ကွင်းဆင်းချိန်တွင်မုန်တိုင်းမိခြင်း၊ပင်လယ်ရေအတက်အကျ များ သောကြောင့်ပိတ် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ မြစ်ရေ ကျချိန်တွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ မိုးများပြီး ခကျောင်းဝေး၊ မြစ်ရေလျှံချိန်တွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	အဆင်ပမေြသောအချိန် စောင့်ဆိုင်း သွားလာခဲ့ခြင်း၊ဆိုင်ကယ်များ ထမ်းပြီး ကူးခဲ့ခြင်း။	ကွင်းဆင်းချိန်တွင်မုန်တိုင်းမိခြင်း၊ပင်လယ်ရေ အတက်အကျ များ သောကြောင့်ပိတ် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ မြစ်ရေ ကျချိန်တွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ မိုးများပြီး ခကျောင်းဝေး၊ မြစ်ရေလျှံချိန်တွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
၂။	မိုးတွင်းကာလတွင် ပြီးစီးသွားသောလုပ်ငန်းများ ပျက်စီး သွားခြင်း။	ပျက်စီးမှုနည်းသောလုပ်ငန်း များအား TFအကူအညီဖြင့် ကျေးရွာ မှပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး၊ ပျက်စီးမှုများ သောလုပ်ငန်း များအား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း (လမ်းလုပ်ငန်းများအား ရပ်ဆိုင်း ထားရခြင်း၊ သောက်ရေကန်နှင့် ရေတွင်း ရေကန် တူးဖော်မှုများ	ပျက်စီးမှုကြီးမားသော လုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာမှ အချိန်နှင့် တပွင့်ပေးချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

		ရပ်ဆိုင်း ထားခြင်း	
၃။	မိုးတွင်းကာလတွင် ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေ Accident ဖြစ်ခြင်း။	မိမိကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်သာဖြေရှင်း။ (ဆေးဖိုး၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်စရိတ်)	CDDဝန်ထမ်းများအားလုံးတန်းတူ အခွင့်အရေး နှင့် ရပိုင်ခွင့် တပမြေညီ ရရှိရန်။
၄။	ရေကြီး၊ ရေလျှံ၊ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် မြေကာနံရံနှင့် လမ်းပန်းများ ပျက်စီးခြင်း။		အကြီးစားပျက်စီးမှုများကို သက်ဆိုင်သူများမှ အမြန်ဆုံးပြန်ဖြေရှင်း ပေးသင့်ပါသည်။  -နောင်နှစ်စက်စက်များတွင်လုပ်ငန်းကို ပွင့်လင်းရာသီတွင်စတင်ဆောင်ရွက် နိုင်အောင်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။  -ဒေသခံများကို ရေစီးဆင်းပုံကို သေချာစွာ မေးမြန်းပြီး လိုအပ်သော နည်းပညာ များဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
၅။		ဒေသခံများအကူအညီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းခဲ့။	Cluster Leader များမှ Team Leaders နှင့်ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ပြီး ဝန်ထမ်းများ ကျေးရွာ Assign သေချာစွာချ ပေးစေချင်သည်။
၆။	ရေလျှံကာ တာဘောင်ကျိုးခြင်း။	ငွေကမ်းအခြေအနေပေါ် မူတည်ကာ Design ဆွဲခဲ့ လိုအပ်သည့် ဝေရည် မရခဲ့။	ဒီဇိုင်းတွင် ရေပိုလွှဲပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့် ပါသည်။ (ရေပိုလွှဲပြု)
၇။	Drainage System မနစ်တကျမရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုများ တွေ့ကြုံခဲ့ခြင်း။	Drainage System ရဲ့ အရေးပါပုံကို ကျေးရွာလူထုကို သေချာရှင်းပြ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပိုင်းမှစီမံကိန်းမစတင်မီ အကွက်ရိုက်ခြင်း၊ လမ်းချဲ့ခြင်းများပြုလုပ်

		ရေဘေးသင့်သော သူများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး အဆောက်အဦးများ လျာထားဆောင်ရွက်ခဲ့။	ပေးသင့်ပါသည်။
၈။	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေသများတွင်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တောင်ကျခကျောင်းေးရေကြီးချိန် မိုးတွင်းတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ တောင်ပေါ်ခရီးများသွားလာရခက်ခဲ ခြင်း၊ တောင်ကျ ရေများသောကြောင့် လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်မှုများ ရှိပါသည်။	တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများနှင့် ရွာလူထုတို့ ညှိနှိုင်း၍ ဒီဇိုင်းများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။	မိုးရာသီမတိုင်ခင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြုလုပ်ပေးရန်/ဒေသ၏ ခက်ခဲမှုအပေါ်တွင် ချိန်ဆတွက်ချက်ပြီးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။  DRD Infra ဝန်ထမ်းများမှ လိုက်ပါ ကွင်းဆင်း၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပေးသင့်ပါသည်။ TPIC အစည်းအဝေးတွင် သက်ဆိုင်ရာ Team Leader မှရွာ၏ သတင်းအချက်အလက်များအားယူဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၉။	ကျေးရွာလူထုမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် (ရေကြီးသော ဒေသများ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စဉ်ဟု မယူဆကြဘဲ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုကဲ့သို့ လက်ခံယူဆကြသည်။		ကျေးရွာကို သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက် သော အသိပညာများ ပေးအပ်သင့်ပါသည်။ (ဒေသအလိုက်) လက်ကမ်းစာစောင်များဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းများကို မှု့ပေးပေးသင့်ပါသည်။
၁၀။	ဝန်ထမ်းများတွင် Safty နှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သော ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများမရှိခဲ့သဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိပြီး ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်ကလည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သော		လိုအပ်သော အကာအကွယ် ပစ္စည်းအစုံအလင်ကို ဝန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးပေးသင့်ပါသည်။



အသိပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။		
----------------------------	--	--

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အရည်အသွေး**

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	ကျေးရွာများသို့စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခဲ့ပါ သည်။	အတတ်နိုင်ဆုံးရောက်အောင်သွားရောက်ခဲ့ပြီး စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခဲ့ပါသည်။	Sub-Project အလိုက် QC- Form များ ထားပြီး စစ်ဆေးစေလိုပါသည်။ M & E ဆပ်ကော်မတီ ကိုလည်း QC Form များ ကြိုတင်ရှင်းပြပြီး ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး စေလိုပါသည်။
၂။	လစ်လပ်ဝန်ထမ်းနေရာများအတွက် အချိန်မီ မခန့်အပ် နိုင်ခဲ့သဖြင့် Supervision ပြုလုပ်နိုင် မှုတွင် အားနည်းခဲ့ပါသည်။	မြို့နယ်ရှိ TFs မှ တာဝန်ခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။	လစ်လပ်သွားမည့် ဝန်ထမ်းနေရာများကို Resign ကာလအတွင်း ခန့်အပ်ပေးစေ လိုပါ သည်။
၃။	မူလဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် အချို့သောလုပ်ငန်း များ (RC, Steel Structure) မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းသည့် အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	RC, Steel Structure လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Union Infra နှင့် မြို့နယ် အဆင့်မှအင်/ယာများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ထံမှ အကြံဉာဏ်များရယူကာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။	RC, Steel Structure စသည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော သင်တန်းပေါင်းများစွာကို တိုင်း/ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ပေးအပ် စေလိုပါသည်။
၄။	စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော		သင်တန်းများကို လုပ်ငန်းခွဲ များနှင့်

	မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ချိန်နှင့် သင်တန်းချိန်များ တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်နိုင်မှုအားနည်းခြင်း။		ရှောင်လွှဲ၍ ပေးခြင်း၊ TF များကို သင့်လျော် သောကျေးရွာ (လုပ်ငန်းခွဲ) အရေအတွက် သာပေးစေလိုပါသည်။
၅။	ကော်မတီများအားကန်ထရိုက်တာများမှ လေးစားမှု မရှိသောကြောင့်၎င်း စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။	ကော်မတီများအားကန်ထရိုက်တာများမှ လေးစားမှု မရှိသောကြောင့်၎င်း စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။	ကော်မတီများအားကန်ထရိုက်တာများမှ လေးစားမှု မရှိသောကြောင့်၎င်း စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
၆။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အနေဖြင့် ပစ္စည်းများအရေအတွက် အပိုင်းကိုသာ စစ်ဆေး နိုင်ခြင်း;	TF များအနေဖြင့် နားလည်နိုင် သလောက် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကိုလည်း သင်တန်းများ လုံလောက်စွာ ပေးစေလို
၇။	လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အတွက် လျှပ်စစ် အင်/ယာ များမရှိခြင်း၊ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် Supervision Check List မရှိခြင်း။	ကန်ထရိုက်တာနှင့်သာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။	မြို့နယ် အင်/ယာမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးစေ လိုပြီး EP နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပေးစေလိုပါ သည်။ Supervision Check List ကိုလည်း ထုတ်ပေးစေလိုပါသည်။
၈။	ကြိုးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် Design နှင့် ခံနိုင်ဝန် တွက်ချက်မှုတွင် အတိအကျ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	တိုင်း/ ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ် Infra Team များ၏ အကူအညီများ ရယူ ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။	
၉။	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော စံအရည်အသွေးများ ရရှိရန် အခက်အခဲ များရှိခဲ့ပါသည်။	နုန်းများသော သဲများကို ရေစကာချသောနည်း များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရေနှင့် ဘိလပ်မြေပေ အချို့ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဖြေရှင်း	

		ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။(WaterCement Ratio 0.4 to 0.6 ရရှိအောင်)	
၁၀။	အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ရရှိသော ရန်ပုံငွေနှင့် လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန် ခက်ခဲပါ သည်။		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ရာတွင် ကျေးရွာအရေအတွက် များပြားသဖြင့် ကြီးကြပ်နိုင်မှု အားနည်းခဲ့ပါသည်။		
၁၂။	ကန်ထရိုက်တာများပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများ တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် စိတ်ဝင် စားမှု အားနည်းခြင်း။	အတတ်နိုင်ဆုံး ကျေးရွာလူထုနှင့် သာပြုလုပ်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	လုံးဝမကျွမ်းကျင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများကိုသာ ကန်ထရိုက် ငှားရမ်း ဆောင်ရွက် စေလိုပါ သည်။
၁၃။	ကျေးရွာလူထုများသည် နည်းပညာပိုင်းအား နည်းခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးခြင်းကကြောင့် ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းခွဲများတွင် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	နည်းပညာပိုင်းကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း Skill Labour အနည်းငယ်ကိုသာ ငှားရမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။	CFs, TFs များမှ ကျေးရွာလူထုကို အချိန်ပေး၍ နည်းပညာများပံ့ပိုးကူညီ နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**အခြားဆွေးနွေးချက်များ**

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့သော အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
၁။	သတင်းပေးပို့သော်လည်း သတင်းပါရှိမှု အားနည်းခြင်း/ အကမြောင်းအရင်း မခိုင်လုံဘဲ သတင်းမှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခြင်း (Facebook)	TTA, တာဝန်ကျဝန်ထမ်း၊ DRD တို့မှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်း	သတင်းပါရှိရန်အတွက် လိုအပ်သောဘတ်ဂျက် များစီစဉ်ပေးရန်။
၂။	ကျေးရွာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ လုပ်ငန်း အချိန်မှီပြီးစီးရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း Social Audit အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်ဆံ အချိန်မှီ မချပေး နိုင်သောကြောင့်ပုံမှန် UM SR အမှီ TMSR မပြုလုပ်နိုင်။		Social Audit အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ / ပိုက်ဆံများနှင့်တကွ ခရီးစရိတ်ကိုပါ အချိန်မှီ ထုတ်ပေးရန်။
၃။	မြို့နယ်/ကျေးရွာတွေမှာ သင်တန်းပေးချိန် နောက်ကျခြင်း။	TFမှကိုယ်တိုင် ဘ-၆ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ ရ။	မြို့နယ်/ကျေးရွာများတွင်သင်တန်းများပေး ပေးအခါ လုပ်ငန်းများမစတင်ခင်ပေးစေချင်။
၄။	IEC, Material နှင့်ဗီဒီယိုများ အချိန်မီ မရရှိခြင်း ကော်မတီများ တီရှပ် များမရရှိခြင်း။	စီမံကိန်းပန်ထမ်းများမှရှင်းပြခြင်း/အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့။	IEC, Material နှင့်ဗီဒီယိုများ အချိန်မီ မရရှိခြင်း ကော်မတီများ တီရှပ် များမရရှိခြင်း။
၅။	ခန့်မှန်းထားသည်ထက် သယ်ယူစရိတ် များပြားခြင်း ကကြောင့် တွက်ချက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း (ရာသီဥတု၊ နေရာဒေသ)		သယ်ယူစရိတ်အား၅% ထက်တချို့ကျေးရွာများ အတွက်တိုးမြှင့်ပေးစေချင်။ရာသီဒေသအလို

			က် လုပ်ငန်းသုံးငွေများ ထုတ်ပေးစေချင်။
၆။	နိုင်ငံသုံးငွေကမြေးမတူညီ၍ ပယ်ယူရေးနှင့် အခွန်များ ဖြတ်သန်းခွင့်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲ	မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့်သာ စီစဉ်ဖြေရှင်း	မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာပေးချေရန်ဟူသော စာသားအစားအခြေအနေအရပေးမြောင်းလည် ဝး သည်ကို (ချွင်းချက်အနေဖြင့်ထားပေးရန်)
၇။	တံတားနှင့် လမ်းစသော Sub-Project များတွင် တိကျသော Structure တွက်ချက်မှုများ မရှိသောကြောင့် ခွင့်ပြုနိုင်သော ခံနိုင်ရည်အား များကို အများပြည်သူထံ မချပြနိုင်ခြင်း။		တံတားနှင့်လမ်းကဲ့သို့သော Sub Project များ Design လုပ်ရာတွင် Annual Rainfall Annual Daily Traffic စသော Data များကောက်၍ Structureကိုတွက်ချက်ပြီး Designပြုလုပ်နိုင်ရန် Structure သင်တန်း များပေးစေခြင်း။
၈။	OMတွင် သတ်မှတ်ထားသော 15KW ခိုင်နမ့်ဖြင့် မီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အိမ်ခမြေ များသော ကျေးရွာများတွင် အိမ်တိုင်း အကျိုး ခံစားခွင့်မရရှိခြင်း။ ထိခိုက်မှုများ ရှိပါသည်။		နည်းပညာသင်တန်း (လျှပ်စစ်၊ ရေပေးရေး)များ ပေးစေချင်။ တံတား ခံနိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းပေးစေချင်ပါသည်။
၉။	၀-၆ တွင်ပါရှိသော သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော် လွန်ပါက တိကျသော အရေးယူဆောင်ရွက် မှုများမရှိသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများအချိန်မီ ပြီးစီး မှုမရှိခြင်း။	ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းများအချိန်မီ ပြီးစီးနိုင် ရန် ကန်ထရိုက်တာအား တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။	၀-၆ တွင်ပါရှိသော သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော် လွန်ပါက တိကျသော အရေးယူဆောင်ရွက်

			မူများမရှိသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများအချိန်မီ ပြီးစီး မှုမရှိခြင်း။
၁၀။	သင်တန်းများမရရှိခြင်း (မီးလင်းရေး၊ ရေ၊ Levelling၊ Soil test၊ GP Survey၊ Water Test၊ Speekinh)	လေ့လာဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	အဆိုပါသင်တန်းများကို Company မှသော် လည်းကောင်း DRD (or) CDD သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များမှလိုအပ်သလို ပို့ချပေး စေသလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။
၁၁။	ဩဇာအာဏာကြီးမားသောလူတစ်စု၏ လွှမ်းမိုး ချုပ်ချယ်မှု များခံရသည့် အတွက် Sub-Projects များ အချိန်မီပြီးစီးမှု မရှိဘဲနှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။	သတ်မှတ်ရက်များထက် ကျော်လွန်ပြီးမှ သာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ။	သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်များဖြစ်သည့် ဥပီးစီးဌာနများ၊လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျှ ဝားနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို စီမံကိန်းအကမြောင်း အားသင်တန်း(သို့)အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် ပေးစေလိုပါသည်။
၁၂။	ကန်ထရိုက် စာချုပ်၀.၆ကိုကန်ထရိုက်တာမှ မလိုက်နာခြင်း၊ ပြသနာဖြစ်ပေါ်လာပါက ၀.၆ ဖြင့် အရေးယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊		၀.၆ ကို ပိုမို ခိုင်လုံသော စာချုပ်ဖြစ် နိုင်အောင် Form ပုံစံပြုပြင်ပေးသင့် OM တွင် တံဆိပ် ခေါင်းစာချုပ်ပါချုပ်ဆိုရန် ထည့်သွင်းသင့် အခြား သဘောတူညီချက်ပါ ထည့်သင့် % ဖြင့် ငွေပေးချေမှု Standard Form ပုံစံ
၁၃။	မြို့နယ်တွင် စာရင်းပေါက်သော လူဥပီးရေနှင့် ကျေးရွာ	အဆင်ပမေအောင် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်	သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား

	အတွင်းရှိ လူဦးရေ ကွာဟချက်ရှိခြင်း	ရွက်ခဲ့ပါသည်။	မြေထဲပြင်လူဦးရေအမှန်စာရင်းကိုစီမံကိန်း မစတင် မီကောက်ခံထားစေရန် (ဥပမာ- တစ်အုပ်စု ရွာငါးဆယ်)
၁၄။	မိုးတွင်းကာလတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ရသည့်အတွက် သယ်ယူစရိတ် မြင့်မားသည့် အခက်အခဲ။	အချိန်ပေးပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့။	ပွင့်လင်းရာသီတွင်ပြုလုပ်စေချင်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖိုရမ် (၂၀၁၇) မှရရှိလာသော ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်များ



လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာမေးခွန်းများအားသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	ဒေသစွဲ၊ ပါတီစွဲများရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်ခြင်း၊	ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။	သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီဝင်များ၊ ပါတီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စီမံကိန်းမစတင်မီကြိုတင်အစည်းအဝေးလုပ်စေချင်သည်။
(၂)	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်စီမံကိန်းအားယုံကြည်မှုအားနည်းနေသည်။	သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့။	စီမံကိန်းမစတင်မီမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆွေးနွေးရာတွင်သဘောတူညီမှုရရှိအောင်ဆွေးနွေးပေးရန်
(၃)	ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်မိုင်းကွင်းများရှိနေသောကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိ	သတင်းအချက်အလက်စုံစမ်းခြင်း၊ ဒေသခံများ၏အကူအညီဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှမိုင်းရှင်းလင်းရေးပညာရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်
(၄)	ဒေသခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏နယ်သို့ဖြတ်သန်းသွားလာရာတွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရ	ရင်းနှီးမှုရယူပြီးဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့	အချိန်မရွေးသွားလာခွင့်အသိအမှတ်ပြုအမိန့်လိုချင်ပါသည်။

(၅)	လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးငြယ်ခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်ချိန်များတွင်ပါဝင်စွက်ဖက်မှုရှိနေခြင်း	ကျေးရွာလူထုအားစီမံကိန်းလက်စွဲပါအကမြောင်းအရာများအားနားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်း	လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားအစည်းအဝေးများတက်ရောက်စေပြီးစီမံကိန်းအကမြောင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြစေလိုပါသည်။
(၆)	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသောရွှေ၊ခဲ ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကကြောင့်မြစ်ကျောင်းများတိမ်ကောပြီး ညစ်ညမ်းခြင်း၊သောက်သုံးရေများခဲဆိပ်သင့်မှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြေရှင်း၍မရပါ	သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်များမှဖြေရှင်းပေးစေချင်
(၇)	ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုခြင်း	ခရီးသွားလာခွင့်တောင်းခံခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏မှတ်ပုံတင်ပေးပို့ခြင်း	တာဝန်ရှိသူများမှစီစဉ်ညှိနှိုင်းပေးစေလိုခြင်း
(၈)	ခွင့်ပြုစာတောင်းခံရာတွင်အချိန်မီမထုတ်ပေးခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှဖြေရှင်းနိုင်မှုအားနည်းခြင်း	တာဝန်ရှိသူများမှစီစဉ်ညှိနှိုင်းပေးစေလိုခြင်း
(၉)	အချို့ကျေးရွာများအားစီမံကိန်းလုပ်ကိုင်	ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးစီမံကိန်း	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင်စီမံ

	ခွင့်မပြုခြင်း	လုပ်ကိုင်ခွင့်တောင်းခံခဲ့	ကိန်းဆောင်ရွက်နေသောဝန်ထမ်းများအတွက် အသက်အာမခံထားရှိပေးရန်
(၁၀)	တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်သောအုပ်စုများအားချန်လှုပ် ၍စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရခြင်း		တာဝန်ရှိသူများမှစီစဉ်ညှိနှိုင်းပေးစေလိုခြင်း
(၁၁)	ရုံပုံငွေကိုစီမံကိန်းအတွက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းခံခြင်း	တာဝန်ရှိသူများမှအခွန်ကင်းလွတ်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့	စီမံကိန်းအတွက်အခွန်ကိစ္စရပ်များညှိနှိုင်းပေး စေလိုခြင်း
(၁၂)	စက်ယန္တရားများဝင်ခွင့်မပေးခြင်းကကြောင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာခြင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများသာထောက်ပံ့ပေး နိုင်ခဲ့	တာဝန်ရှိသူများမှစီစဉ်ညှိနှိုင်းပေးစေလိုခြင်း
(၁၃)	အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအတွက်လုံ လောက်သောထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်း		တာဝန်ရှိသူများမှစီစဉ်ပေးစေလိုခြင်း
(၁၄)	ရုံပုံငွေထုတ်ယူရာတွင်လမ်းခရီးအခက်အခဲ နှင့်နယ်မြေဖေဖတည်ငြိမ်မှုကကြောင့်စိုးရိမ်ရခြင်း	ဒေသခံဝန်ထမ်းများညှိနှိုင်း၍အတူတကွ သွားလာဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားစီမံကိန်း၏ မူဝါဒနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအားကြိုတင်အသိ ပေးစည်းရုံးပေးစေလို
(၁၅)	ကွင်းဆင်းရာတွင်စစ်ဆေးတားမြစ်မှုများ		လုံခြုံမှုနည်းသောကျေးရွာများသို့သွားလာရာ

	နှင့်ဘာသာစကားအခက်အခဲများများရှိခြင်း		တွင်လမ်းပြအားအမြဲတမ်းငှားရမ်းခွင့်ပြုပါရန်
(၁၆)	ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ခွင့်ပြုချက်များမရရှိသောကြောင့် ဝင်ရောက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရပ်တန့်ထားရသောမြို့နယ်များတွင် စီမံကိန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုအားနည်းလာခြင်း	ဒေသခံများနှင့်ချိတ်ဆက်၍အဆင်ပမေြေ ဇောအချိန်မှသာစီမံကိန်းပြန်လည်စတင် နိုင်ခဲ့	တာဝန်ရှိသူများမှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်
(၁၇)	အချို့ကျေးရွာများတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုစာများအကြိမ်ကြိ မ်တောင်းခံရခြင်း၊စီမံကိန်းအကမြောင်း အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းပြရခြင်း	သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကူညီပေး သင့်ပါကမြောင်း
(၁၈)	TTA မရှိသောမြို့နယ်များတွင် CF/TF များမှကွင်းဆင်းအလုပ်နှင့်မြို့နယ်ရုံးကိစ္စ များပါဆောင်ရွက်ရ၍အစီရင်ခံစာများအ ချိန်မီမပေးပို့နိုင်ခြင်း	တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရခြင်း	ရုံးကိစ္စသီးသန့်တာဝန်ချထားပေးရန်
(၁၉)	လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကိုယ်လက်အင်္ဂါကျိုးပဲ့မှု ရှိသဖြင့်ဆေးဖိုးဝါးခရှာရခြင်း	ဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းထောက်ပံ့၍ဖြေရှင်း	
(၂၀)	မိုင်းစရိယာများတွင်လမ်းပြခေါ်ယူရသော ကကြောင့်လမ်းပြစရိတ်ပေးချေရခြင်း		

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရေး

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	မိုးရာသီမြေပြေမှုများကကြောင့်လမ်းခက်ခဲ	ရွာသို့ရသည့်နည်းဖြင့်သွား	ပွင့်လင်းရာသီလုပ်ဆောင်စေချင်
(၂)	ရေကမြောင်းသွားလာရေးတွင်အသက် အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရ	ပေးအပ်သောတာဝန်အရဆောင်ရွက်ရ	ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောအစီအစဉ်ချမှတ်ပေးစေချင်
(၃)	ဖုန်းလိုင်းမမီခြင်း		ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောဖုန်းကဒ်ပေးစေချင်
(၄)	လမ်းရေတိုက်စားမှုကကြောင့်ပျက်စီးခြင်း၊ ရေမျောသွားခြင်း၊ရွာလုံးကျွတ်ရေမျော သွားခြင်း	လူထုမှထည့်ဝင်ငွေဖြင့်ပြန်ပြင်ရ၊ဌာနများအား ပြန်တင်ပြပြီးပွင့်လင်းရာသီမှပြန်လည်လုပ် ဆောင်ရ	အချိန်နှင့်တပမေးညီထိန်းသိမ်းမှု ပြုပြင်မှုအစီ အစဉ်ပြုလုပ်ပေးစေချင်
(၅)	ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်သဘာဝဘေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင် တန်းများမရရှိသောကြောင့်ပြည်သူလူထုအားသင်တန်းမပေး နိုင်ပါ		ကော်မတီနှင့်လူထုကိုသဘာဝဘေးနှင့် ပတ်သက်သောသင်တန်းများ ပို့ချပေးစေလို၊စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများပါ သင်တန်းပို့ချစေချင်
(၆)	အလွန်ဝေးလံအတွင်းကျသောနေရာများတွင်အမျိုးသမီးဝန် ထမ်းများအတွက်လုံခြုံမှုအားနည်း၊ရာသီဥတုဆိုးရွား၍ပြန် ၍မရခြင်းကြုံတွေ့ရ	အခက်အခဲကြားမှမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လာရ၊ဝန်ထမ်း လုံခြုံရေးကိုဌာနဆိုင်ရာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားတာဝန် ယူခိုင်းရ	ကျား/မတွဲဖက်၍တာဝန်ပေးစေချင်၊ဝန် ထမ်းလုံခြုံရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူပေး စေချင်

(၇)	ဝန်ထမ်း၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်းကြုံတွေ့ရ(ဆိုင်ကယ်မြေပေါ်မြှုပ်နှံခြင်း)	သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုတင်ပြထားသော်လည်း တုန့်ပြန်မှုမရရှိသေး	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း(ဆိုင်ကယ်အစရှိသည်)ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်၍ အချိန်အမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ပေးစေချင်
(၈)	မြစ်ရေတက်ချိန်တွင်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန် ခက်ခဲ	စီမံကိန်းကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်း	ပွင့်လင်းရာသီတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်
(၉)	စက်လှေပေါ်ဆိုင်ကယ်များအတင်အချပြုလုပ်ရာတွင်အမျိုးသမီးများဖြစ်သောကြောင့်ခက်ခဲ	အနီးအနားရှိလူများအားအကူအညီတောင်းရ	ကျား/မ အမျိုးညီမျှစွာခန့်အပ်ပေးပါရန်
(၁၀)	ခရီးကြမ်းသည့်နေရာများသို့သွားလာရာတွင်ပင်ပန်းခက်ခဲ	ပင်ပန်းသော်လည်းသွားလာရ	ရွာမှပြန်လာသည့်အခါပင်ပန်း၍ရုံးမလာနိုင်ဘဲ အနားပေးစေလို
(၁၁)	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်မြေပေါ်မြှုပ်နှံခြင်းကကြောင့်စီမံကိန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားအမြန်ဆုံးတန်ဖိုးတွက်ချက်၍ရုံးချုပ်သို့တင်ပြခြင်း၊အစီရင်ခံခြင်း	ဒေသ၏မြေပေါ်မြှုပ်နှံခြင်းအနေအထားကိုကြိုတင်လေ့လာကြရန်၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအားအချိန်မီတင်ပြရန်
(၁၂)	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းရာတွင် ရုတ်တရက်မြေပေါ်မြှုပ်နှံခြင်း၊ခကျောင်းငှားရကြီး	အနီးဆုံးကျေးရွာများတွင်ညအိပ်ရခြင်း၊မိမိငွေဖြင့်ဆိုင်ကယ်ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရခြင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူ

	ခြင်း၊ဆင်အန္တရာယ်နှင့်ကြုံရခြင်း		ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုခြင်း
(၁၃)	လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းသဘာဝဘေး(မိုးကြိုး)နှင့်ကြုံတွေ့ရ	ကျေးရွာလူထု/စည်းရုံးရေးမှူးများမှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ကုသခဲ့ရ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်သားများထိခိုက်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့ရုံပုံနှင့်ငွေသတ်မှတ်ပေးစေလို
(၁၄)	အမျိုးသမီးများအတွက်လုံခြုံမှုအားနည်းသောဝေးလံသောဒေသများသို့သွားရာတွင်အမျိုးသမီး(ကျေးရွာလူထု)အဖော်ခေါ်ဆောင်သွားရခြင်း	ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့်ငွေကမ်းခြေစိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရ	အမျိုးသမီးအဖော်(ကျေးရွာလူထု)အတွက်အသုံးစရိတ်ပေးစေလိုပါသည်။
(၁၅)	သဘာဝဘေးကျရောက်လာလျှင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုမိုပေးဆောင်ရခြင်း	ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လူ အဆင့်ဆင့်အင်အားသုံးပြီးဆောင်ရွက်ရခြင်း	မြို့နယ်အလိုက်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလိုက်၍လုပ်ငန်းခွဲများချပေးစေလို
(၁၆)	သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း(ကန်ပက်လက်	ဆိုင်ကယ်များအားထမ်းရွှေ့ရခြင်း	ခရီးစရိတ်ပံ့ပိုးပေးစေလို(ထမ်းပိုးခ)

	မြေပြိုခြင်း)		
(၁၇)	ရေကြီးရေလျှံမှု(ငပုတော၊ငါးစွန်၊လေး မျက်နှာမိုးညို)	လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားခြင်း	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုသတ် မှတ်ချိန်အားလျော့ချပေးစေလို
(၁၈)	မိုးရာသီဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းရန်ခက်ခဲ	ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအချိန်မှကွင်းဆင်း	ရုံးများအတွက်မော်တော်ဘုတ်များ ချထားပေးစေလို
(၁၉)	ဝန်ထမ်းများအားအန္တရာယ်ပြုမှု	မသိကျိုးကျွံပြု၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	ဝန်ထမ်းများအတွက်တိကျသောကာကွယ် မှုရှိစေလို

**ကျေးရွာအဆင့်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	အကျုံးဝင်/မဝင်သောလုပ်ငန်းများအား အ ချိန်မီသတင်းမရရှိခြင်း	မြေပြင်စကျေးနှုန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့	ဝန်ထမ်းများမှမြေပြင်ပေါက်စကျေးအတိုင်း BOQဆွဲစေချင်၊တိုက်ရိုက်(သို့)စကျေးပြိုင်ပစ္စည်း များအားအမျိုးအစားခွဲပေးစေလို
(၂)	ပစ္စည်းစကျေးနှုန်းထက်သယ်ယူစရိတ်ပို မိုများ ပြား	စကျေးနှုန်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရ	အချို့နေရာများတွင်မြေပြင်အနေအထားကို ကွင်းဆင်း၍သယ်ယူစရိတ်တွက်ချက်ပေးစေလို



(၃)	အသေးအဖွဲ့ပစ္စည်းများကိုစကျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် စကျေးနှုန်းစုံစမ်းရာတွင်ခက်ခဲ	အမှန်တစ်ကယ်ဝယ်ယူမည့်ဆိုင်မှစကျေးနှုန်းများသာဖြည့်သွင်းခဲ့ရ	ပစ္စည်းစကျေးနှုန်းကိုစုစုပေါင်းစကျေးနှုန်း/ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးအဆင့်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရန်
(၄)	၀-၆ ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင်ကန်ထရိုက်ဘက်မှတာဝန်ယူမှုမှာ ၆ လသာရှိသည့်အတွက်မှားယွင်းမှုများရှိလာသည့်အခါကျေးရွာဘက်မှခက်ခဲမှုရှိခြင်း	ကျေးရွာမှဝင်ငွေထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုများထပ်မံကောက်ခံရရှိပြီးစီမံကိန်းကိုရှေ့ဆက်ရန်	၀-၆ တွင်တိကျသော/ထိရောက်သောအရေးယူမှုများပြဋ္ဌာန်းပေးရန်
(၅)	ပစ္စည်းစကျေးနှုန်းမမှန်ကန်/ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲ	စည်းရုံးရေးမှူးများကိုယ်တိုင်ဆိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရခြင်း	ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအားလုပ်ငန်းမစတင်မီစီမံကိန်းဝယ်ယူရေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးစေလို
(၆)	တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်မရှိသောကြောင့်ပစ္စည်းစကျေးနှုန်းစုံစမ်းရာတွင်ခက်ခဲ	ရရှိလာသောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များအချိန်မီပေးပို့စေလို
(၇)	အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူသောစကျေးနှုန်းနှင့် အမှန်တကယ်ဝယ်ယူသည့်စကျေးနှုန်းမတူညီခြင်း	ကော်မတီဝင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရစကျေးနှုန်းချို့သာသောဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူခဲ့ရ	တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ရက်များ(၇)ရက်မှ(၃)ရက်သို့ပမောင်းလဲပေးစေလို
(၈)	စကျေးဆိုင်များအားအခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များအားကြိုတင်ရှင်းလင်းမှုမရှိ	အချိန်လွန်မှစကျေးဆိုင်များအားပေးဆောင်စေခဲ့ရ	လုပ်ငန်းမစတင်မီဆိုင်များအားအခွန်ကိစ္စကြိုတင်ပမောင်းထားရန်၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန်

(၉)	ဒေသထွက်ပစ္စည်းများ(သစ်၊သဲ)ဝယ်ယူ သည့်အခါအခွန်ကိစ္စခက်ခဲ	ဒေသထွက်ပစ္စည်းများအားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေ သဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဝယ်ယူရ	စီမံကိန်းမစတင်မီဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးစေချင်
(၁၀)	တရားဝင်ရောင်းချသောဆိုင်များတင်ဒါ ပိတ်သိမ်းခံရခြင်း(သဲ၊ကျောက်)	ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရ	လုပ်ငန်းစတင်ချိန်နှင့်တင်ဒါပိတ်သိမ်းချိန် မတိုက်ဆိုင်စေရန်စီစဉ်ပေးစေလို
(၁၁)	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအတွက် EPC မှပြင်ပလုပ် သားများအားခွင့်မပြုခြင်း	လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့	ပြင်ပလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကိုခွင့်ပြုစေလို
(၁၂)	စက်ပစ္စည်းကရိယာများရှားပါးခြင်း	စကျေးကြီးပေးပြီးငှားရမ်းရခြင်း၊ကြိတ်တင်စုံ စမ်းထားရခြင်း	ဌာနဆိုင်ရာများမှသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များသို့ဆက်သွယ် တောင်းရွက်ပေးရန်
(၁၃)	ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်း	အခြားနေရာများမှစကျေးကြီးပေးငှားရမ်းရ ခြင်း	ဌာနဆိုင်ရာများမှကျေးရွာများသို့သင်တန်းများပို့ချပေးရန်
(၁၄)	ဒေသပေါက်စကျေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာတွ က် ချက်မှုကွဲလွဲခြင်း	ကျေးရွာလူထုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း	မြို့နယ်တိုင်းဒေသပေါက်စကျေးဖြင့်တွက်ချက်ရန်လိုအပ်
(၁၅)	သစ်များဝယ်ယူရာတွင်ပစ္စည်းများရှားပါး	ကျေးရွာလူထုအင်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်သစ်စက်များကိုညှိနှိုင်း

	ခြင်း		ဆောင်ရွက်ပေးစေလို
(၁၆)	ပုံစံ ၀-၃ ပါစ ကျေးနှုန်းအာမခံနိုင်မှုအချိန် သတ်မှတ်ချက်ကာလ(၁)လကိုဆိုင်ရှင် ဘက်မှတာဝန်ယူနိုင်ခြင်း	ဆိုင်ရှင်များဘက်မှစကျေးနှုန်းကာလသတ် မှတ်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	စကျေးနှုန်းအာမခံနိုင်မှုအချိန်ကာလအားပြင်ဆင် ပေးပါရန်
(၁၇)	၀- ၆တွင်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိ သောကြောင့်ပုံစံစာချုပ်ချုပ်ရန်နှင့်အရေး ယူ ဆောင်ရွက်ရာတွက်ခက်ခဲ	ပြင်ပတံဆိပ်ခေါင်းပါစာချုပ်များဖြင့်ချုပ် ဆိုရခြင်း	စာချုပ်ကိုစက်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းနှင့်လုပ်သား ကန်ထရိုက်ကိုသီးသန့်ပြုလုပ်ပေးရန်၊ ၀ ပုံစံများကိုမိမိတို့မြို့နယ်အတွင်းရှိစီးပွားရေး သမားများအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးစေလို
(၁၈)	ကျား/မ ညီမျှအောင်လုပ်သားငှားရမ်းရ သည့်အတွက်လုပ်သားအင်အားပိုလျှံမှုရှိ	လူထုထည့်ဝင်မှုများဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့	ဘဏ္ဍာရေးစစ်ဆေးမှုများတွင်ကျား/မညီမျှမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစေလိုပါသည်။
(၁၉)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲက ြေစာင့်ပုံ သယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း	လူထုထည့်ဝင်မှုများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	သယ်ယူစရိတ်ကိုဒေသပေါက်စကျေးအားအခြေခံ ၍တွက်ချက်ပေးပါရန်

ဒေသခံဘာသာစကားအခက်အခဲများ

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်ဘာသာစကားမတူညီခြင်းကကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနားလည်ရန်ခက်ခဲခြင်း	လူထုမှတတ်ကျွမ်းသူများမှကူညီဖြေရှင်းပေး	ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများအားဦးစားပေးခန့်ထားရန်
(၂)	လူမျိုးကွဲများသောကြောင့်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်း	ဘာသာစကားတူရာအုပ်စုခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့	ဒေသခံလူထုအားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပေးအပ်စေလိုပါသည်။
(၃)	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများဆွေးနွေးရာတွင်နည်းပညာမှူးများမှဒေသခံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကြောင့်ခက်ခဲခြင်း	ဒေသခံစည်းရုံးရေးမှူးမှကူညီဖြေရှင်းခဲ့ရ	ဒေသခံနှင့်နည်းပညာမှူးမှအမြဲပူးတွဲပြီးကွင်းဆင်းကူညီပေးသင့်ပါသည်။
(၄)	ဘာသာကွဲပြားမှုကြောင့်လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	အသင်းအုပ်၊ရွာခွဲခေါင်းဆောင်များနှင့်ငြင်းရှင်းခဲ့ရ၊မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဖြေရှင်းရ	ကျေးရွာလူထုအားစည်းလုံးမှုရှိစေရန်သင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်။
(၅)	သဘာဝအကာအကွယ်အခက်အခဲများ(အစားထိုးစိုက်ရန်ပျိုးပင်များ၊မပျိုးစေ့များရှားပါးခြင်း)	မရှိသေးပါ	သက်ဆိုင်ရာမှပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။
(၆)	ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားအကူအညီတောင်းခဲ့ရ	ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများအားဦးစားပေးခန့်ထားရန်
(၇)	ဝန်ထမ်းများဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုအားနည်း၍လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များထိရောက်စွာမပေးနိုင်ခြင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားအကူအညီတောင်းခဲ့ရ	ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများအားဦးစားပေးခန့်ထားရန်

(၈)	ဖြည့်သွင်းရမည့်ဖောင်ပုံစံများတွင်မြန်မာ ဘာသာဖြင့်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝိသုဒ္ဓိဖြည့်သွင်းရန်ခက်ခဲ	ဘာသာပြန်ရှာ၍ဖြေရှင်းခဲ့	ဘာသာစကားအလိုက်ထုတ်ပေးပါရန်
(၉)	ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောအပမြောအဆိုအလေ့အထကွာခြားမှုအခက်အခဲ	တာဝန်ကျကျေးရွာ၏ ဓလေ့စရိုက်အား ေ လာ၍ပမြောဆိုနေထိုင်ခဲ့	တာဝန်ကျကျေးရွာများ၏ ဓလေ့စရိုက် ကို ကြိုတင်လေ့လာပြင်ဆင်ထားရန်
(၁၀)	ဒေသခံများမှာဘာသာစကားကကြောင့် မြန်မာစာပေဖတ်ရှုနိုင်ရန်ခက် ခဲ		ပိုစတာများ၊ ဖီဒိုင်းများကိုတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားထည့်သွင်းပေးရန်
(၁၁)	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော်လည်းဒေသခံများသာခ န့်ထားမည်ဆိုသောကြောင့် ဝိသုဒ္ဓိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းခက်ခဲ		အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများအားထ ည့်သွင်းစဉ်းစားစေလို

**ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	အိမ်ခြေမြေများသောကျေးရွာများတွင်အစည်း အဝေးတက်ရောက်သူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီ ရန်ခက်ခဲခြင်း	ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အစည်းအဝေးလိုက်ဖိ တ်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည့်အချိန် တွေ့ပါအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရ	စီမံကိန်းမစတင်မီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း/ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုစီမံကိ န်းအကမြောင်းရှင်းလင်း၍ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးစေရန်
(၂)	ဒေသရာသီအလုပ်ချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေ၍အစ ည်းအဝေးရာနှုန်းပြည့်ရန်ခက်ခဲ	အကျွေးအမွေးအစီအစဉ်၊ အခြားစိတ်ဝင်စ ားစရာအကမြောင်းအရာအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုပမြောင်း	စီမံကိန်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှပူးပေါင်း ပါ ဝင်ပေးခြင်း

		လဲခဲ့ရ	
(၃)	စီမံကိန်းအကမြောင်းစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်း ၍ရာနှုန်းပြည့်ရန်ခက်ခဲ	အကျွေးအမွေးအစီအစဉ်၊အခြားစိတ်ဝင်စ ားစရာအကမြောင်းအရာ၊အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုပမြောင်း လဲခဲ့ရ	စီမံကိန်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးခြင်း
(၄)	ကော်မတီရွေးရာတွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသောကြောင့် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်စွာဖြင့်ရွေးချယ်သော်လည်းအမှ န်တစ်ကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူများကော်မတီ တွင်မပါဝင်ခဲ့ခြင်း	မဲပေးနေစဉ်လွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်ကူညီ၊ အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်ကော်မတီဝင်များ ပမြောင်းလဲခဲ့ရ	လွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးရန်
(၅)	ရွာတွင်စာရင်းသာရှိပြီးအမှန်တစ်ကယ်မနေ ထိုင်သူများရှိသောကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်း	ကျေးရွာတွင်ရှိသောအိမ်ခမြေများမှရာခိုင် နှုန်းပြည့်အောင်တက်ရောက်ပေးခဲ့ရ	မြေပြင်တွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သူစာရင်း ကိုသာစာရင်းဖြည့်သွင်းရန်
(၆)	ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ရာထူးနှင့်ကျွမ်းကျ င်မှုအပိုင်းကွာခြားသောကြောင့်ပူးပေါင်းပါ ဝင်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်း	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်တွင်ကော်မတီဝင် များအားသင့်တော်ရာနေရာများသို့ပမြောင်း လဲပေးခဲ့ရ	စီမံကိန်းမှကော်မတီဝင်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့မှု၊ အပြန်အလှန်လေ့လာမှုတို့ပြုလုပ်ပေးသင့်
(၇)	တစ်ရွာတည်းဖြစ်သော်လည်းနှစ်ပိုင်းကွဲနေ တောကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါ ဝင်မှုအားနည်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊စီမံကိန်းမှတာဝန်ရှိသူများ မှကွင်းဆင်းစည်းရုံးခဲ့ရ	တာဝန်ရှိသူများမှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
(၈)	အချိန်လုံလောက်မှုမရှိ၍ရပ်ရွာလူထုပူးပေါင်း	စီမံကိန်းအကမြောင်းအရာအားအနှစ်ချုပ်	ရုံးချုပ်မှအချိန်လုံလောက်စွာပေးစေချင်

	ပါဝင်အောင်စည်းရုံးနိုင်မှုအားနည်း	၍ရှင်းပြခဲ့ရ	
(၉)	ရုံးချုပ်မှဝေးလံသောကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းမှုအားနည်းခြင်း	စည်းရုံးရေးမှူး၊နည်းပညာမှူးများမှနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ရ	တာဝန်ရှိသူများမှနီးစပ်သောကျေးရွာများအပြင်ဝေးလံသောကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းစေချင်
(၁၀)	မြို့နယ်အဆင့်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်ဆုရွေးခြယ်နည်းစနစ်ကိုကျေးရွာလူထုမှလက်မခံသောအခက်အခဲ	ဆုရွေးခြယ်ရေးစည်းမျဉ်းများကိုရွာတိုင်းတွင်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်	ပါဒါတ ဆုသုံးဆုသာပေးမည့်အစားအမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများအရအလွန်တောင်းအဆင့်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျေးရွာများအားဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များချီးမြှင့်ပေးပါကအားလုံးကျေနပ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း
(၁၁)	ကျေးရွာတွင်အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများပေါများခြင်း၊ဂိုဏ်းများကွဲပြားခြင်းကြောင့်အစည်းအဝေးခေါ်ရန်ခက်ခဲ	အစည်းအဝေးများအားထပ်ကာထပ်ကာပြုလုပ်ရသည်	သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များမှခေါင်းဆောင်တစ်ဦးစီ၊ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးစီပူးပေါင်းပါဝင်စေလိုပါသည်။
(၁၂)	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရသည့်အကြိမ်အရေအတွက်များပြားခြင်း	မိမိတို့တာဝန်အတိုင်းအောင်မြင်အောင်တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်	အစည်းအဝေးအကြိမ်ရေလျော့ချစေလို
(၁၃)	အစည်းအဝေးတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများတက်ရောက်လာကြပါသည်	အစည်းအဝေးအားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်	ရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရာအိမ်မှူးများ၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်
(၁၄)	ကျေးရွာလူထုအားလပ်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်သောကြောင့်အခက်အခဲရှိပါသည်	တောင်ယာခင်း၊လယ်ခင်းများထိသွားရောက်၍အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ရပါသည်	ရွာလူထုအားလပ်သည့်အချိန်တွင်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်စေလို

(၁၅)	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းပါးခြင်း	အခြားကျေးရွာများမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားများခေါ်ယူခဲ့ရသည်	နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်သမားသင်တန်း၊ ပုန်းရံသင်တန်းများကိုကျေးရွာလူထုသို့ထိထိရောက်ရောက်သင်တန်းပေးစေလိုပါသည်
(၁၆)	ရာသီခွင်လုပ်ငန်း၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးများကကြောင့်လုပ်ငန်းအပေါ်ကြီးကြပ်မှုအားနည်းခြင်း	ကော်မတီ၊ ရွာလူထုတို့မှအလှည့်ကျစီစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ပေးခဲ့ရ	ရွာလူထုအားစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအားနှိုင်းယှဉ်ပြသ၍သင်တန်းများပေးစေလို
(၁၇)	ဒေသခံလူထုမှစာတတ်မြေတောက်မှုအားနည်း၍စာရွက်စာတမ်းများအားထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်း	တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	စာရွက်စာတမ်း၏အရေးပါပုံနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ပုံတို့ကိုသင်တန်းပေးစေလို
(၁၈)	ကျေးရွာလူထုအားတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်၍အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခဲ့	ကော်မတီဝင်များအားအကျိုးခံစားခွင့်များချီးမြှင့်ပေးရန်
(၁၉)	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည်တာဝန်များကိုအသေးစိတ်မသိရှိခြင်း၊ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းခြင်း	စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဝင်များကွင်းဆင်းပြီးလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	လုပ်ငန်းမစတင်မီအချိန်ပေး၍စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးသင်တန်းပေးအပ်သင့်



(၂၀)	ကော်မတီဝင်များနှစ်စဉ်ပေးခြင်း၊ ဘဝပုံစံများပေးခြင်းတို့ကကြောင့် စာရွက်စာတမ်းရေးသားပြုစုရာတွင်ခက်ခဲ	စည်းရုံးရေးမှူးများမှဦးဆောင်ပြီး ကော်မတီဝင်များနှင့်ပြုစုထိန်းသိမ်းခဲ့ရ	နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းများမလုပ်ဆောင်မီ ဘဏ္ဍာရေးသင်တန်းများပေးရန်၊ ပုံစံများပေးခြင်းလဲမှုမရှိစေရန်အတွက် သေချာသတ်မှတ်ပေးရန်
(၂၁)	စာရွက်စာတမ်းများကိုစာရင်းစစ်ရာတွင်မူရင်းကိုစစ်ဆေးသောကြောင့် ငွေကျေးရွာများသို့ သွားယူရန်ခက်ခဲ	စာရွက်စာတမ်းထိန်းသိမ်းသူထံသို့ကြိုတင်အကဲဖြတ်ကြားဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့	စာရင်းစစ်များရွာသို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းစေလိုပါသည်။ တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရုံးချုပ်မှအချိန်မီပေးစေလိုသည်

**ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဝယ်ယူရေး**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှားပါးခြင်း	ကန်ထရိုက်၊ လုပ်အားပုတ်ပြတ်ပေးရခြင်း	ကျေးရွာအဆင့်တွင်နည်းပညာပိုင်းသင်တန်းများပေးစေလို
(၂)	စက်ပစ္စည်းကိရိယာများရှားပါးခြင်း	ကျေးရွာတွင်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ရ	စက်ပစ္စည်းများအလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးစေလို
(၃)	သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၌ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း		မြို့နယ်နှင့်အလှမ်းဝေးသောနေရာများ၌ဝယ်ယူရေးနည်းလမ်းကိုပြန်၍စဉ်းစားပေးစေလိုပါသည်။

(၄)	မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းခွဲများသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ရသဖြင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရန်အခက်အခဲရှိ	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးသို့တင်ပြကြေညာရေးလျက်ရှိ	စီမံကိန်းမှသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများပြီးစီးနိုင်မှသာလုပ်ငန်းခွဲများအားခွင့်ပြုစေချင်
(၅)	သစ်ဝယ်ယူရာတွင်လိုသလောက်တရားဝင်ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း	သတ်မှတ်ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းကြိမ်ဖန်မများစွာဝယ်ယူခဲ့ရသည်	စီမံကိန်းမှလိုအပ်သလောက်တရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်မြို့နယ်မှကူညီရန်
(၆)	O&M ကောက်ခံရာတွင်အခက်အခဲရှိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထုအားနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အသိပညာပေးပွဲများပြုလုပ်ပေးစေလို
(၇)	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားသတ်မှတ်ချိန်အမီပြီးစီးစေရန်တွန်းအားပေးခြင်းမျိုးကြုံတွေ့ရ	အတတ်နိုင်ဆုံးအရည်အသွေးမီစေရန်နှင့်အချိန်မီပြီးစီးစေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့	သတ်မှတ်ချိန်ထက်အချိန်တိုအတွင်းပြီးစီးစေရန်တွန်းအားပေးခြင်းမျိုးလျော့စေလို
(၈)	ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း	ကျေးရွာမှလူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့	ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေအားလူဦးရေနှင့်မကြည့်ဘဲလုပ်ငန်းဖြင့်ကြည့်၍ပေးစေလိုပါသည်
(၉)	မြေပြင်အနေအထားအရချို့တွင်းတူးရန်ခက်ခဲခြင်း	မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမှအကူအညီယူဆောင်ရွက်ခဲ့	ရေအရင်းအမြစ်နားလည်သောပညာရှင်များနှင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်

(၁၀)	လည်ပတ်ပြုပြင်ရန်ပုံငွေများများရသောကျေးရွာများတွင်ငွေကမြေးထိန်းသိမ်းမှုအခက်အခဲ၊ကျေးရွာတွင်ဒုတိယနှစ်ရန်ပုံငွေကောက်ခံရာတွင်ကျေးရွာလူထုမှမထည့်လိုသောအခက်အခဲ	ဘဏ်အပ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာမှယုံကြည်စိတ်ချသူအားအပ်နှံခြင်း	ပထမနှစ်ရန်ပုံငွေလက်ကျန်များနေလျင်ဒုတိယနှစ်အတွင်းလည်ပတ်ပြုပြင်ရန်ပုံငွေမကောက်ခံစေချင်
(၁၁)	ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းလိုင်စင်များယာယီပိတ်သိမ်းထားသောကြောင့်ဝိသုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနောက်ကျခြင်း၊စကျေးနှုန်းများပြင်ဆင်ခြင်း	ရွာလူထုမှရန်ပုံငွေများနှင့်လုပ်အားများဝေးထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း	လုပ်ငန်းမစတင်မီဌာနဆိုင်ရာများမှလုပ်ငန်းလိုင်စင်များချထားပေးစေလို
(၁၂)	ငွေကမြေးကိုအခြေခံ၍အကောင်အထည်ဖော်ရသောကြောင့်ဝိသုဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းအရည်အသွေးပြည့်စုံမှုမရှိ	ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်အခြေခံ၍သင့်လျော်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်	ထောက်ပံ့ငွေအပေါ်မူတည်ပြီးတွက်ချက်ထားစေဒီဇိုင်းအတိုင်းအရည်အသွေးပြည့်မီအောင်ဖောင်ရွက်လိုပါသည်
(၁၃)	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းဒီဇိုင်းအပမောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	ကန်ထရိုက်နှင့်အဆင်ပမေအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	လုပ်ငန်းမစတင်မီတိကျသောသတင်းအချက်အလက်ရယူလိုပါသည်
(၁၄)	သယ်ယူစရိတ်မြင့်မားသောကြောင့်ဝိသုစက်ယန္တရားငှားရမ်းမှုခက်ခဲခြင်း၊သတ်မှတ်ထားသောအရည်အသွေးမပြည့်မီခြင်း	မြေဝေသယ်ယာဉ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း	ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့်လိုအပ်သောစက်ယန္တရားများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်
(၁၅)	မီးလင်းရေးနှင့်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်နည်းပညာပိုင်းအခက်အခဲများကကြောင့်လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခဲ့ခြင်း	လျှပ်စစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးရေပေးဝေခြင်းလုပ်ငန်းများအားအတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့	ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်၍သင်တန်းများပေးစေလို
(၁၆)	O&M	အုပ်ချုပ်ရေး၊ရပ်မိရပ်ဖများမှဦးစီး၍	ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့သဘောထားပြီးလည်

	အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော်လည်းကျေးရွာမှအမှန်တစ်ကယ်လိုက်နာလုပ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်း	ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများတွင် O&M အဖွဲ့သစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း	ပတ်ရန်ငွေပေးစေလိုသည်
(၁၇)	၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍တိကျစွာမရှင်းပြ နိုင်ခြင်း		မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုတိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ပေးစေလိုပါသည်

**သတင်းဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ရလဒ်**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	သတင်းဖြန့်ဝေရာတွင်တိကျမှုမရှိသောကြောင့် ဝန်ထမ်းများအပေါ်ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း	ဝန်ထမ်းများမှသေချာစွာရှင်းပြပြီးတောင်းခံခဲ့ခြင်း	တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များ ကြိုတင်အသိပေးရန်နှင့်ပေးပို့ခြင်းလဲမှုမရှိရန်
(၂)	ဖုန်းလိုင်းမမိခြင်း	လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ လူကြိုဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့	
(၃)	စီမံကိန်းပစ္စည်းများစီမံကိန်းပြီးမှရောက်ရှိလာခြင်း	အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်ကြိုလျင်ကြိုသလို ရှင်းပြခြင်း	စီမံကိန်းစတင်ချိန်တွင်ပေးရန်
(၄)	ယခုလက်ရှိဗီဒီယိုခွေများသည်လက်ရှိအခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီခြင်း	စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ရှင်းပြဆောင်ရွက်ခဲ့	စီမံကိန်းလက်စွဲအတိုင်းတိတိကျကျပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးစေလို
(၅)	တက်ဘလက်များပျက်စီးသည့်အတွက်အချ	ရှိတဲ့တက်ဘလက်များအားအလှည့်ကျသုံး	ပျက်စီးနေသောတက်ဘလက်များအား

	က်အလက်များအချိန်မီဖြည့်သွင်းနိုင်ခြင်း	စွဲခဲ့ရ	အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးရန်
(၆)	ဌာနဆိုင်ရာများမှစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကဲဖြတ်ခြင်းအရာများအားမသိရှိခြင်း	ဝန်ထမ်းများမှစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကဲဖြတ်ခြင်းအရာများအားအကြိမ်ကြိမ်ရှင်းပြခဲ့	စီမံကိန်းမစတင်မီဌာနဆိုင်ရာများအားသင်တန်းပေးစေလိုပါသည်
(၇)	ကော်မတီဝင်အသစ်များစီမံကိန်းအကျိုးမရရှိခြင်း	ကော်မတီဝင်အသစ်များအကျိုးမရရှိသေးကဲဖြတ်ခြင်း	ကော်မတီဝင်များအားစီမံကိန်းအကျိုးများလုံလောက်စွာပေးစေချင်
(၈)	ကော်မတီဝင်များမှစီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း	ကော်မတီဝင်များလဲလှယ်ခဲ့ရ	မြို့နယ်အသစ်များတွင်ကော်မတီဝင်များလစာမရကဲဖြတ်ခြင်းလက်ကမ်းစာစောင်များစောစီးစွာဖြန့်ဝေပေးစေချင်
(၉)	ဘာသာစကားခက်ခဲမှုကြောင့်သတင်းဧကန်ယူရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများအားအကူအညီတောင်းခံခဲ့ရ	သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များမှတာဝန်ယူကူညီဖြေရှင်းပေးရန်
(၁၀)	မိုးရာသီတွင်လက်ကမ်းစာစောင်များ၊စာရွက်စာတမ်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ခက်ခဲ	ရေမစိုစေရန်ဝန်ထမ်းမှအကူအညီအကျခံပြီးထုပ်ပိုးပြင်ဆင်ခဲ့ရ	ပွင့်လင်းရာသီတွင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကြိုတင်ပို့ဆောင်ရန်
(၁၁)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဲဖြတ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များအချိန်မီမပေးပို့နိုင်ခြင်း	လူကိုယ်တိုင်လမ်းကြိုပို့	သတင်းအချက်အလက်နှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုသက်ဆိုင်ရာမှအချိန်မီတစ်ပါတ်ကြိုတင်ထုတ်ပေးရန်
(၁၂)	ဘာသာစကားမတူညီခြင်း၊တူညီသော်လည်းလေယူလေသိမ်းအသုံးအနှုန်းကွာဟမှုကြောင့်ခက်ခဲ	စေတနာဝန်ထမ်းအားအကူအညီတောင်းရ	ဘာသာစကားတူညီသောဝန်ထမ်းအားအတတ်နိုင်ဆုံးနေရာချရန် ။သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဖြင့်စီမံကိန်းများ၊ပိုစတာများပြုလုပ်ပေးရန်

(၁၃)	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အကမြောင်းအား ငွေမြို့နယ်မှသတင်းစာတွင်ထည့်ရန်ခက်ခဲ	တစ်လလျှင်တစ်ပုဒ်နှုန်းဖြင့်ထည့်သွင်းပေး ခဲ့	သတင်းစာကမြော်ငြာစရိတ်ကိုကုန်ကျခံပေးပါရန်
(၁၄)	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်ရာနှုန်းပြည့်တ က်ရောက်ရန်ခက်ခဲ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ကျေးရွာအုပ်စုမှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုမှူးများကိုစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သ က်သည့်သင်တန်းများတရားဝင်တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါရန်
(၁၅)	ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှုမလုံလော က်ခြင်း	စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှစိုက်ထုတ်သုံးစွဲရ	ဆက်သွယ်ရေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့် ပေးစေလိုပါသည်
(၁၆)	နည်းပညာအခက်အခဲ၊ပစ္စည်းအရည်အသွေး နိမ့်ကျခြင်း	တက်ဘလက်များမကောင်းသောကြောင့် ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	အရည်အသွေးကောင်းသောတက်ဘလက် များအားထောက်ပံ့ပေးစေလိုပါသည်

**ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးနှင့်တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှု**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	ဝေဖန်အကြံပြုမှုအားနည်း၊တာဝန်ခံ အမျိုးသမီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအားနည်း	ဝန်ထမ်းများမှစီမံကိန်းတလျှောက်ပါဝင်ကူညီခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများမှ အကြံပြု၍ အမျိုးသမီး များဆုံး ဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကူညီခြင်း	ကော်မတီဝင်အရည်အချင်းများသတ် မှတ်ပေးစေချင်၊ ဝေဖန်အကြံပြုနှင့် ပတ်သက်၍အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရန် သင်တန်းများပေးစေလို၊ အကြံပြုစာ များကိုအချိန်နှင့်တပမြေးညီ ပြန်ကြားပေးစေလို
(၂)	ကော်မတီဝင်များနေ့တွက်စရိတ်ပံ့ပိုးမှုအား နည်း	အသေးသုံးမှနေ့တွက်စရိတ်ပိုပေးခြင်း	ကော်မတီဝင်များအားအကျိုးခံစားခွင့် ရစေလိုပါသည်

(၃)	TTA,DRD ကွင်းဆင်းမှုအားနည်း	ဝန်ထမ်းများနှင့်ကော်မတီဝင်များမှကြီးကြပ်ခြင်း	တာဝန်ရှိသူများမှကြီးကြပ်ပေးစေလိုပါသည်
(၄)	ကန်ထရိုက်မှတာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုအားနည်းခြင်း	၀-၆ အပြင်အရပ်စာချုပ်များပါတွဲ၍ချုပ်ဆိုရ ခြင်း	၀-၆ အားတိကျခိုင်မာစေရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းစေလို
(၅)	ဆုရွေးခြယ်ရေးစနစ်အားနည်းခြင်း	ကျေးရွာများအားရှင်းလင်းပမြောက်ကြားခဲ့	ပါဒါတ ဆုသုံးဆုသာပေးမည့်အစားအမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများအရအလွန်ကောင်းအဆင့်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျေးရွာများအားဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များချီးမြှင့်ပေးပါကအားလုံးကျေနပ်ကြမည်ဖြစ်ကမြောင်း
(၆)	လူနည်းစုမှတိုင်ကြားမှုကကြောင့်လုပ်ငန်းများရပ်တန့်ထားရခြင်း	ရုံးချုပ်မှတိကျသည့်အဖြေမရရှိသောကြောင့်ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းထားရ	ရုံးချုပ်မှတိကျသောချာစွာဖြေရှင်းပေးစေလို
(၇)	အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအနည်းငယ်မှတိုင်ကြားလျှင်ဝန်ထမ်းမှပြည့်စုံစွာဖြေရှင်းခွင့်မရ	ဝန်ထမ်း၏ဖြေရှင်းမှုအားလက်မခံဘဲအထက်မှညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	ဝန်ထမ်းများမှားသည်ဖြစ်စေ/မှန်သည်ဖြစ်စေဖြေရှင်းခွင့်ပေးစေလို၊ TTA ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များအား TTA မှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးစေလို
(၈)	ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများသွားလာရာတွင်နှောက်ယှက်မှုများရှိ	မြို့နယ်ရုံးအားအကူအညီတောင်း၍လာရောက်ဖြေရှင်းခိုင်းရ	သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှအကာအကွယ်များဆောင်ရွက်ပေးစေလို
(၉)	ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက်တိကျသောဆေးကုသစရိတ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်မရရှိခြင်း	ဝန်ထမ်းမှစိုက်၍ဖြေရှင်းခဲ့ရ	တိကျသောဝန်ဆောင်မှုစနစ်ထားရှိပေးစေလို

(၁၀)	ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့တာဝန်များရှိသော်လည်းအပြည့်အဝတာဝန်မယူ နိုင်	စည်းရုံးရေးမှူးများမှကူညီဆောင်ရွက်ရ	စာချုပ်အားသေချာဖတ်ပြီးမှသာလျှင်လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်
(၁၁)	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းကိုမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများကိုသာမက ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားတိုင်ကြားခြင်း	တတ်နိုင်သလောက်အဆင်ပဖြေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်	အချိန်မီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုရုံးချုပ်မှတိတိကျကျကွင်းဆင်းဖြေရှင်းပေး စေလို
(၁၂)	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးအကမြောင်းလူထုမှသိရှိမှုအားနည်း	ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းရှင်းပြခဲခံ	ကော်မတီဝင်များသာမကကျေးရွာလူထုကိုပါဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးအကမြောင်းဆွေးနွေးရှင်းလင်းပွဲများပြုလုပ်စေရန်
(၁၃)	ကျေးရွာလူထုမှရွေးခြယ်သောစာရင်းကိုင်မှာပညာအရည်အချင်းအားနည်းသောကကြောင့်ဝ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်း	ပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအခြားကော်မတီဝင်များအားဆောင်ရွက်စေခဲ့	ငွေစာရင်းကိုင်အားပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ပေးစေလိုပါသည်
(၁၄)	ကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသောကြောင့်ဝ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းခြင်း	လူကိုယ်တိုင်အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံစည်း ရုံးခဲ့ရ	စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းသောမြို့နယ်များအတွက်နောက်နှစ်ရန်ပုံငွေပေးသင့်မပေးသင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးရန်
(၁၅)	အမျိုးသမီးများမိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်း	အမျိုးသားများမှလက်တွဲခေါ်ခဲ့	ကျား/မရေးရာအမြင်ဖွင့်သင်တန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ပေးစေလို



ကျား/မရေးရာ

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	တူညီသောလုပ်အားခအတွက်တူညီသောလုပ်အားခများပေးချရာတွင်အမျိုးသားများမှမကျေနပ်ခြင်း	စီမံကိန်းမူအရဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။	သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများမှကျားမရေးရာများအားလိုက်နာလျင်ကျေးရွာများတွင်လိုက်နာဖို့ပိုသေချာပါသည်
(၂)	အစည်းအဝေးခေါ်ရာတွင်အမျိုးသမီးများမှအချိန်မပေးနိုင်ခြင်း	အမျိုးသမီးများအားသည့်အချိန်တွင်အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ပါသည်	ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားကျား/မသင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်
(၃)	အဆောက်အဦးပိုင်းမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	ကျား/မပညာပေးသင်တန်းများ ဇာတ်လမ်းများပေးစေလိုပါသည်
(၄)	အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အခါအမျိုးသားဦးရေများပြားခြင်း		
(၅)	အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများအားဦးဆောင်သူဟုသတ်မှတ်ထားခြင်း	သင်တန်းများပေး၍စည်းရုံးခဲ့	အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအားသီးသန့်ခွဲ၍သင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်
(၆)	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားမရှိခြင်း		လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ထိရောက်တဲ့သင်တန်းပေးစေလိုပါသည်
(၇)	အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး(၅၀)ရာနှုန်းတက်ရောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း	အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လံခေါ်ဆောင်ခဲ့	အမျိုးသမီးများအားလုပ်ချိန်တွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်

(၈)	ပထမနှစ်ဝက်ကော်မတီဖွဲ့ရာတွင်ကျား(၅၀) မ(၅၀)မဖြစ်နိုင်ခြင်း	အနီးစပ်ဆုံးဖွဲ့စည်းခဲ့	ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံစွာရှင်း ပြရန်
(၉)	ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်နည်းခြင်း	စီမံကိန်းလက်စွဲပါအမျိုးသမီးတာဝန်များကို ရှင်းပြခဲ့	အမျိုးသမီးများအားစွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်းများကျင်းပပေးရန်
(၁၀)	အမျိုးသမီးသီးသန့်ရွေးချယ်သည့်စီမံကိန်းနည်းပါးခြင်း	ကျား/မညှိနှိုင်းပြီးရွေးချယ်ရန်ကူညီပံ့ပိုးခဲ့	အမျိုးသမီးများသီးသန့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်စီမံကိန်းကိုဘတ်ဂျက်ချပေးရန်
(၁၁)	ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရအမျိုးသမီးများမှ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း	နေရာဒေသနှင့်သင့်တော်သလိုဖြေရှင်းခဲ့	အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအား သိရှိစေရေးပညာပေးရန်
(၁၂)	အမျိုးသမီးကော်မတီခေါင်းဆောင်များအား လက်ခံမှုအားနည်းခြင်း	လမ်းညွှန်စာအုပ်အတိုင်း(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းပါ ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့	ကျား/မပညာပေးသင်တန်းများ ဇာတ်လမ်းများပေးစေလိုပါသည်

**ကျေးရွာလူထု၏ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု**

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကိုမကြည့်ဘဲရန်ပုံငွေ ရရှိရေးကိုအဓိကထားခဲ့ခြင်း	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးရန်ပုံငွေ ခွဲဝေပေးခဲ့	ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရာတွင်ရွာအနည်းအများ အပေါ်မူတည်ပြီးထောက်ပံ့ပေးရန်
(၂)	ရွာကြီးများမှရန်ပုံငွေပိုရချင်	အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့်ခွဲဝေပေးခဲ့	
(၃)	လူဦးရေများပြီးရွာနည်းသောကြောင့်ခံ့ငှရန်	လုပ်ငန်းကိုကြည့်ပြီးရွာများအားဦးစားပေးရွေး ခြယ်ခဲ့	

	ပုံငွေခွဲဝေရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း		
(၄)	ထောက်ပံ့ငွေတောင်းခံရာတွင်ပုံစံဖြည့်သွင်းရာ၌အခက်အခဲရှိခြင်း	တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှကူညီဖြည့်သွင်းပေးရ	ဘဏ္ဍာရေးသင်တန်းများပေးရာတွင်အချိန်အလုံအလောက်ပေးစေလိုပါသည်
(၅)	ဘောက်ချာတစ်ရွက်ပေါ်တွင် ဘ-၅ တွဲရာ၌အခက်အခဲများစွာရှိခြင်း	ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်	ဘောက်ချာအားလုံးကိုဘ-၅တစ်ရွက်တည်းပဲချုပ်စေချင်ပါသည်
(၆)	ဘ-၉ မှနေ့စားစရိတ်ပါစေချင်ကမြောင်းကော်မတီဝင်များမှတောင်းဆိုခြင်း	နေ့စားစရိတ်ပါနေသော်လည်းပေး၍မရပါ	မပေးလျင်မထည့်စေချင်ပါ
(၇)	(၇)ရက်အတွင်းငွေပြန်သွင်းရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်	ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးစေချင်
(၈)	ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း	ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	ရိုးရှင်းသောဘဏ္ဍာရေးပုံစံများပြင်ဆင်ပေးရန်
(၉)	ဘ-၁ နှင့် ဘ-၃ ရေးဆွဲရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့	ဘဏ္ဍာရေးသင်တန်းများတိကျစွာပေးစေလို
(၁၀)	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်သိန်း(၂၀)အောက်လုပ်ငန်းများလုပ်၍မရသည့်အခက်အခဲ	နှစ်သိမ့်ခဲ့ရအခြားလုပ်ငန်းပမောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ရ	ပြင်/ထိန်းလုပ်ငန်းများမှလွဲ၍ကျေးရွာမှအမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကရန်ပုံငွေကန့်သတ်ထားဘဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်
(၁၁)	အသေးသုံးငွေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အခက်အခဲ ရှိ		အသေးသုံးကိုအုပ်စုတစ်ခုခြင်းသီးသန့်ထောက်ပံ့ပေးရန်

(၁၂)	အုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများအမည်မပေါက်သည့်အတွက်ရန်ပုံငွေခွဲဝေရာတွက်ခက်ခဲ	အိမ်ခမြေ(၂၀)ရှိပြီးစာသင်ကျောင်းရှိပါကထောက်ပံ့ငွေရရှိကမြောင်းဖြေရှင်းခဲ့	အိမ်ခမြေ(၂၀)အောက်ကျေးရွာများအားလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ပေးပါရန်
(၁၃)	ရန်ပုံငွေ(၅)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း		တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ပေးပါရန်
(၁၄)	လူထုစစ်ဆေးပွဲများပြုလုပ်ရာတွင်ဧည့်ခံကျွေးမွေးစရိတ်မလုံလောက်ခြင်း	သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမှအိတ်စိုက်ဖြေရှင်းရ	လူဦးရေစာရင်းအလိုက်ကျွေးမွေးစရိတ်တိုးပေးပါရန်
(၁၅)	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက ဆေးကုသစရိတ်မရခြင်း	အဆင်ပမြေအောင်ဖြေရှင်းခဲ့	အမှန်တကယ်ကုန်ကျသည့်ဆေးကုသစရိတ်အားအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပါရန်
(၁၆)	ထောက်ပံ့ငွေနောက်ကျခြင်း	အကြွေးစနစ်ဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့	သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်
(၁၇)	ကန်ထရိုက်အခွန်ကိစ္စများခက်ခဲခြင်း	အချင်းချင်းပမြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်	တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ပေးရန်နှင့်စာရင်းစစ်များ၊အခွန်ဦးစီးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရန်
(၁၈)	စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ်များမလောက်ခြင်း	ကော်မတီဝင်များမှစိုက်ထုတ်သုံးစွဲခြင်း	စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်များအားထောက်ပံ့ငွေမှမဟုတ်ဘဲသီးသန့်ထောက်ပံ့ပေးစေ လိုခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ရလဒ် (VDP လုပ်ငန်းစဉ်၊ အကာအကွယ်၊ Ecops စသည်ဖြင့်

စဉ်	အကဲဖြတ်ခြင်းအရာ	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ
(၁)	ကျေးရွာလူထုမှအစည်းအဝေးအတွက်အချိန်မပေးနိုင်၍ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်အခက်အခဲရှိ၊ PRA tools သုံးသပ်ချက်များအပြည့်အဝမရရှိပါ	ရရှိသောအချိန်ကာလအတွင်းအတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့။	VDP ပြုလုပ်ရန် နောက် Plan ကို ၅ ရက်စာအချိန်ပေးရန်
(၂)	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းအကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးစွဲရန်အတွက်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေထဲမှသုံးစွဲရန်ဆန္ဒမရှိခြင်း	အကာအကွယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များအားကျေးရွာလူထုသိရှိအောင်ရှင်းပြစည်းရုံးခဲ့	BQ ရေးဆွဲရာတွင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြီးပြည့်စုံအောင်ရေးဆွဲပေးရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုရှိပါကဆေးကုသစရိတ်များနှင့်အာမခံမှုများအားဖြေလျော့ပေးရန်
(၃)	စိုက်ပျိုးရေး၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းအတွက်တစ်ဖက်ပိတ်မြေသားတမံများအသုံးပြုခွင့်မရှိသည့်အခက်အခဲ	အခြားရွာမှရေစည်လှည်းများနှင့်ခက်ခဲစွာသယ်ယူခဲ့ရပါသည်	ရန်ပုံငွေလုံလောက်ပါကရုံးချုပ်မှခွင့်ပြုပေးပါရန်
(၄)	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများအားလုပ်အားလာရောက်လှူဒါန်းခြင်း	လူမှုအကာအကွယ်၏ အကျိုးဆက်များအားလူထုကိုသေချာရှင်းပြ၍နှစ်သိမ့်စေလွှတ်ခြင်း	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပေါ်မူတည်၍ရန်ပုံငွေချပေးစေချင်၊ ကျေးရွာသားများအားလူမှုအကာအကွယ်နှင့်ပတ်သက်၍ကမ်ပိန်များပြုလုပ်ပေးစေချင်
(၅)	Ecops နှင့် EMP ရေးဆွဲရန်အတွက် TF များမှကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြချိန်နည်းပါး	Ecops EMP နှင့်ပတ်သက်၍အချိန်ပေးရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကြီးကြပ်	Ecops နှင့်ပတ်သက်၍သီးခြားသင်တန်းပေးရန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် Ecops

	၍လိုက်နာမှုအားနည်း	ပေးခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့	နှင့်ပတ်သက်၍ TF များမှကြီးကြပ်ပေးရန်
(၆)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆွေးနွေးမှုအားနည်း	အမျိုးသမီးများသီးသန့်ဆွေးနွေးခဲ့	အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်းပေးစေလို
(၇)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်လိုအပ်တာနှင့်လိုချင်တာရောနှောတောင်းဆို	လိုချင်တာနှင့်လိုအပ်တာကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့	လုပ်ငန်းမရွေးခြယ်မီကျေးရွာများတွင်ကြိုတင်အသိပေးဆွေးနွေးထားရန်
(၈)	လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ရာတွင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအားနည်း	ထိခိုက်မှုမရှိအောင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကမြောင်းရှင်းပြခဲ့	အကာအကွယ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝီနိုင်းများ လက်ကမ်းစာစောင်များ အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပေးစေလို
(၉)	အကာအကွယ်ပစ္စည်းလုံလောက်စွာအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း	ကျေးရွာရှိပစ္စည်းများနှင့်သုံးစွဲရ	လုပ်ငန်းခွဲအပေါ်မူတည်ပြီးအကာအကွယ်ပစ္စည်းဘတ်ဂျက်သီးသန့်ထားပေးစေလို
(၁၀)	လုပ်ငန်းခွဲအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးမှုအားနည်း	သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့အစီရင်ခံ တင်ပြ	ဌာနဆိုင်ရာနှင့်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကာ ပူးပေါင်းပါဝင်စေလို
(၁၁)	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများကိုယ်တိုင် Pra Tools များနှင့်ပတ်သက်၍တစ်ခုချင်းစီ၏ အကမြောင်းအရာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းစွာမသိရှိခြင်း	အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းနှင့်အသုံးမဝင်သော စီမံကိန်းများရရှိအောင် Pra Tools ၂ခါကောက်ရ	Pra Tools အတွက်အချိန်ပိုရစေလို

(၁၂)	PRA tools ကောက်ယူစဉ်ကျေးရွာများမှ စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်း	ရွာ၏ အဓိကကျသောလူများနှင့်ရှင်းလင်းခဲ့ရ	PRA tools မွမ်းမံသင်တန်းများပေးစေချင်
(၁၃)	PRA tools ကောက်စဉ်ကျေးရွာလူထုများ သောရွာများသို့ဝန်ထမ်းနည်းသောအခက်အခဲ	ရွာကိုအပိုင်းခွဲ၊ နာရီခွဲပီးကောက်ခံခဲ့ရ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများရွာမဆင်းခင်တွင် မေးခွန်းများမေးရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးစေချင်
(၁၄)	PRA tools နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံး အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း (ဘာသာစကား)	ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးအားဘာသာပြန်စေပြီး သတင်းအချက်အလက်ပမြောခဲ့ရ	အလုပ်ခန့်လျှင်ဒေသခံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူကိုဦးစားပေးခန့်ထားရန်
(၁၅)	Ecops နှင့် EMP နှင့်ပတ်သက်၍အချို့မြို့နယ်ရှိဝန်ထမ်းများသင်တန်းမရရှိခြင်း		သင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်

**အကာအကွယ်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာနှင့် လူမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ**

စဉ်	တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ	တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အကြံပြုချက်
(၁)	အစည်းအဝေးခေါ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုတက်ရောက်မှုအားနည်း (အမျိုးသားများ)	အိမ်တိုင်ရာရောက်ခေါ်ခြင်း၊ အသံချဲ့စက်ဖြင့်ခေါ်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ အကူအညီတောင်းခြင်း၊ ဩဇာရှိသူများ အား အကူအညီတောင်းခြင်း၊ အချို့မြို့နယ်များတွင် သင့်တင့်သော ထောက်ပံ့မှုများပေး၍ စည်းရုံးခြင်း၊ အိမ်ခြေများသောရွာများတွင်	Social Pressure ပေး၍ ဆောင်ရွက်သင့်ခြင်း၊ သင့်တင့်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးစေလိုသည်၊ စည်းရုံးရန်ခက်ခဲပြီး ငြင်းဆိုသောကျေးရွာများ အားမည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို စီမံကိန်း လက်စွဲတွင် တိကျစွာဖော်ပြပေးရန်၊

		နေရာခွဲ၍ ကျင်းပခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား ကောင်းသောကျေးရွာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ စည်းရုံးခြင်း	
(၂)	Work Plan မကြာခဏပမောင်းလဲရခြင်းကကြောင့် ကျေးရွာ၏ ယုံကြည်မှု အားနည်းလာခြင်း၊  တိုင်း/ပြည်နယ်အဆင့်မှ အချိန်လွန်မှ တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက် များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ မှတ်တမ်းများကို အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရန်ခက် ခဲခြင်း၊ ပေးပို့ပြီးသော Data များပျက်သည်ဟု ဆိုကာပြန်လည်တောင်းဆိုသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ပေးရခြင်း၊	ကော်မတီဝင်နှင့် ကျေးရွာလူထုအား အကျိုးအမြတ်ပေးရင်းပြု၍ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ခဲ့ရသည်။ မဖြစ် ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ရပါသည်။ မိမိမှတ်သားထ ဝားသောမှတ်စုများမှ ပြန်လည်ကြည့်ရှု၍ ပြုစုပေးပို့ရပါသည်။	Work Plan အတိုင်းတိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ခွင့်ကိုဦးစားပေးပါရန်၊ တိကျသောသတင်း ဝးအချက်အလက်များရယူလိုပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တောင်းဆိုရန် အကြံပြုမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။  MIS System ကိုမြို့နယ်နှင့်ရုံးချုပ် ကြားကောင်းမွန်စေရန်နှင့် မြို့နယ်မှ MIS System ကိုလည်း Error နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါသည်။
(၃)	တချို့မြို့နယ်များတွင် DRD/TTA များမှ တာဝန်ခံယူမှုအားနည်းနေခြင်း၊ (ဥပမာ - စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း ပြဿနာများ)  ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံမှုအခက်အခဲများကိုအထက်လူကြီး များကစိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းခြင်း ( ဥပမာ - ခရီးသွားလာရေး၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုများ၊	ယခင်နှစ်အတွေ့အကြုံများအရသာဝန်ထမ်းမျ ဝား (CF/TF) များမှ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖြေရှင်းတာဝန်ခံ/ယူခဲ့ရပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုသ ဝာတာဝန်ယူရခြင်း၊ စိတ်ပါဝင်စားသောကော်မ တီဝင် အနည်းငယ်သာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါ သည်။ ကျေးရွာလူထုအားအောက်ကျိုးခံပြီးပင် ငြိစာခဲ့ရပါသည်။ ရွာများသို့ အကြိမ်ကြိမ်	စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံရှိသော၊ တာဝန်သိသောမြို့နယ်အကြံပေးများရွေးချယ်ခန့် ထားရန်၊ သင်တန်းများပေးရန်၊  HR ပိုင်းမှ ဝန်ထမ်းများလုံခြုံမှုအတွက် Plan တစ်ခုထားရှိပေးပါရန်စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းသေ ဝာကျေးရွာအချို့သို့ DRD/TTA များလိုက်ပါကူညီစေခြင်း၊ စိတ်ပါဝင်စားသောကျေးရွာ/



	<p>အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံရေး)</p> <p>ကော်မတီဝင်များသည် စားဝတ်နေရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါတီစွဲ၊ ကျေးရွာလူထုစသည့် ဖိအားများကကြောင့် တာဝန်ခံယူမှုလျော့နည်းလာသည်။</p> <p>ကျေးရွာများရှိအချို့ပြဿနာများမှာ CDD ကကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာများဖြစ်ကြ သည်။</p> <p>ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ယူမှုအားနည်းခြင်း (ဥပမာ - သစ်တော၊ ထွေအုပ်၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)</p>	<p>သွားရောက်၍ ဖြေရှင်းရပါသည်။</p>	<p>မြို့များကိုသာစီမံကိန်းချထားပေးစေခြင်း၊ ကော်မတီများ၏ ရပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝပေးပါရန် (ဥပမာ- ဦးထုပ်၊ အင်္ကျီ)ပြဿနာများကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလည်းပါဝင် ဖြေရှင်းပေးစေခြင်း၊ဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်စေချင်ပါသည်။</p>
(၄)	<p>အရမ်းဝေး၍ခေါင်သောကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းလျှင် မိန်းကလေးတစ်ယောက် တည်းခရီးသွားခြင်းမှာအခက်အခဲရှိခြင်းဝန်ထမ်း များရုံးထိုင်သောနေရာအလွန် ကျဉ်းသောကြောင့် ဝှံ့ အခက်အခဲရှိခြင်း (တပ်ကုန်းမြို့၊ ကော့မှူးမြို့)</p> <p>မြို့နယ် Team Leaderများညံ့ဖျင်းသဖြင့် Social Audit များနောက်ကျခြင်း (ကျွန်းစုမြို့)</p> <p>ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်း</p>	<p>ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးသွားလာခြင်း၊</p> <p>အဆင်ပမေ့သလိုနေထိုင်ရပါသည်။</p>	<p>အနီးအနားရွာများ၌ ဦးစားပေးချထားစေချင်ပါသည်။</p> <p>ရုံးနေရာချဲ့ပေးစေချင်ပါသည်။</p> <p>အရည်အချင်းရှိပြီး CDD အကမြောင်းနားလည်သော Team Leader ခန့်ထားပေးစေချင်ပါသည်။</p> <p>ဒေသအလိုက် စီမံကိန်းအပေါ် စီမံခန့်ခွဲစေချင်ပါသည်။ သတင်းများကိုအချိန်နှင့်</p>

	<p>(Union/Township/ Village) ဒေသအဖွဲ့အစည်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ CMT များမှ မိမိတာဝန်ကျရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း</p>	<p>ကွင်းဆင်းသောဝန်ထမ်းအချင်းချင်း တိုင်ပင်ခဲ့ပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည်။</p> <p>အစည်အဝေးများခေါ်ပြီးဆွေးနွေးခြင်း များပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။</p>	<p>တပမြေးညီဖြန့်ပေးစေချင်ပါသည်။</p> <p>သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုမြို့နယ် TA များမှ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲ၍ ပေးစေချင်ပါသည်။ COC နှင့်သက်ဆိုင်ရာကော် မတီများ၏ TORများကိုတွဲ၍ မိတ္တူများကို ကော်မတီများအားပေး စေချင်ပါသည်</p>
(၅)	<p>လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထု မှ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများအားနည်းခြင်း၊ (သုံးစွဲနည်း၊ အကာအကွယ်ပိုင်း) လုပ်ငန်းခွင်တွင်းထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ အခက်အခဲ (လူထုလုပ်အား) CF/TF များကစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက် ပြီးတာဝန်ယူ/တာဝန်ခံမှုများပြားနေခြင်း၊ မြေဇယာလှူဒါန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ PC-14 အားကြိုတင်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထား ဘော်လည်းလုပ်ငန်းဆောင် ရွက်သည့်အခါ</p>	<p>အဆင်ပမြေသလိုဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းများမှ ငွေစု၍ထောက်ပံ့ပေးရခြင်း အဆင်ပမြေသလိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ရပါသည်။</p> <p>ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။</p> <p>အချို့သောသဘောတူညီမှုများမရရှိခဲ့ပါ။</p>	<p>နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပေး စေချင်ပါသည်။</p> <p>စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေမှ ထိခိုက်မှုအတွက် သုံးစွဲငွေကမြေးသတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါ သည်။ (သတ်မှတ် % တိကျစွာဖော်ပြ ပေးပါရန်)</p> <p>စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် O&amp;M 5% ကိုမည်သူကတာဝန်ယူမည်နည်း၊ CF/TF/TTA ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ယူမှုအပိုင်းများကို OMတွင် တိကျစွာဖော်ပြပေးစေချင်ပါသည်။</p> <p>သဘောတူညီမှုမရရှိသောလုပ်ငန်းများကို ချန်လှပ်</p>

	သဘောတူညီမှုမရခြင်း		ထားခဲ့သင့်ပါသည်။
(၆)	<p>တိကျသောလမ်းညွှန်ချက် မရှိခြင်း</p> <p>DRD TL နှင့် TTA TL တို့ အဆင်မပြေမှုများရှိခြင်း၊</p> <p>DRDကွင်းဆင်းမှုအားနည်းခြင်း</p> <p>မြို့နယ်သစ်များစာရင်းစစ်တဲ့အချိန် အခက်အခဲရှိခြင်း</p> <p>လစ်လပ်နေသော TF နေရာများတွင် အချိန်မီမခန့်ထားနိုင်၍ Sub-project ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခဲ့သည်။</p> <p>VPSC/VTSPC များမှ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ကော်မတီဝင်အနည်းငယ်သာဦးဆောင် လုပ်နေရခြင်း၊</p>	<p>သတင်းရလျှင်ရခြင်းအချိန်မီသတင်း ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။</p> <p>ရွာမှ စာရင်းများအကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။</p> <p>အခက်အခဲများကြားမှ အဆင်မပြေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။</p> <p>ကော်မတီဝင်အချို့နှင့်သာလုပ်ငန်းကိုပြီးစီးစေ ဖောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။</p>	<p>တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များသတ်မှတ် ပေးစေလိုပါသည်။</p> <p>ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။</p> <p>Union DRD မှ တိကျသောလမ်းညွှန် ချက်များပေးစေလိုပါသည်။</p> <p>မြို့နယ်စာရင်းစစ်တာဝန်ရှိသူများအား CDD မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စာရင်းဇယား စစ်နည်းအားသင်တန်းပေးစေလို ပါသည်။</p> <p>လစ်လပ်နေသော TFနေရာတွင် အချိန်မီအမြန်အစားထိုးပေးပါရန်၊</p> <p>ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရာတွင် လူမှန် နေရာမှန် ရွေးချယ်စေလိုကမြောင်းကျေးရွာကိုအကြံပေးရမည် ။ CMT သင် တန်းကိုအချိန်ပိုယူပြီးထိရောက်စွာသင်တန်းပေးစေ လိုပါသည်။ ( သင်တန်းကို ၂ ရက်ထက်ပို ပေးစေချင်ပါသည်)</p>

<p>(၇)</p>	<p>လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ခြင်း</p> <p>လုပ်ငန်းများအပေါ် ဖိအားပေးမှုကကြောင့် လုပ်ငန်းများပေးလဲခြင်း၊</p> <p>အချို့သောဒေသများတွင် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းသွားလာရာ၌ လုံခြုံမှုအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း</p> <p>လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရုံးပိတ်ရက်များတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆိုင်ကယ်ထိခိုက်မှုများရှိခဲ့သည်။</p> <p>အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုနေ သော်လည်းသုံးစွဲမှုအလေ့အထမရှိခြင်းကြောင့် ဝ် အမြဲတစေအသုံးပြုမှုမရှိခြင်း</p>	<p>လုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာမှ ပေးလဲခြင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။</p> <p>အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ဝန်ထမ်းများကကူညီစောင့်ရှောက် ကြသည်။</p> <p>ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆေးဖိုးဝါးခအကုန် အကျခံခဲ့ရသည်။ စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ ပေးသောဆိုင်ကယ်ကိုမိမိစရိတ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပေးခဲ့ရသည်။</p> <p>တတ်နိုင်သလောက် ထိတွေ့မှုရှိလာအောင် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။</p>	<p>လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုစီမံကိန်းအကဲဖြတ် ပေးပေးစေလိုပါသည်။</p> <p>ဝေးလံသောနေရာများအတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပူးတွဲထမ်းဆောင်စေလိုပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဝာချပြစေလိုပါသည်။</p> <p>အကာအကွယ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများအားဝန်ထမ်းများမှ တစ်ဆင့် ရွာလူထုကိုပေးစေလိုပါသည်။</p>
------------	--	--	---

အခြားကိစ္စရပ်များ

စဉ်	အခက်အခဲများ	ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ	အကြံပြုချက်များ
(၁)	ကျေးရွာအနေဖြင့်ထည့်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါကပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျေးရွာလူထုနှင့်အဆင်ပမေ့အောင်ညှိနှိုင်းခဲ့ခြင်း	တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များပေးစေလိုပါသည်
(၂)	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်မှ ထုတ်လွှင့်မှုအားနည်းခြင်း	ဆွေးနွေးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့	နိုင်ငံတော်အဆင့်မှစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကဲဖြတ်ခြင်းအရာများကိုဇာတ်လမ်းတို၊ကဏ္ဍမြော်မြော်များဖြင့်များများထည့်သွင်းပေးစေလိုပါသည်
(၃)	မြို့နယ်အသစ်များမှဝန်ထမ်းများသင်တန်းများ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း	အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများမှတစ်ဆင့်လေ့လာသင်ယူခဲ့	ဝန်ထမ်းအသစ်များကိုလုံလောက်သောသင်တန်းများပေးစေလိုပါသည်
(၄)	အစည်းအဝေးတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက် ရန်ခက်ခဲ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ဆယ်အိမ်မှူး၊အသံချဲ့စက်၊ဖိတ်စာများဖြင့်ဖိတ်ကြားခဲ့	စီမံကိန်းလက်စွဲတွင်ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ပါကထိရောက်သောအရေးယူမှုကိုထည့်သွင်းပေးစေလိုပါသည်
(၅)	စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်နည်းပညာမှူးများ ဝေးညီမှုမရှိ	စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ယောက်တည်းရွာတွေ့မျှပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရ	နည်းပညာမှူးလုံလောက်အောင်ထပ်တိုး ပေးရန်
(၆)	စီမံကိန်းအကဲဖြတ်မှုကိုဌာနဆိုင်ရာများမှသိရှိမှုအားနည်းသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုအားနည်း	ကျေးရွာလူထုနှင့်ကော်မတီဝင်များလူခွဲပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့	ဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပေးရန်

(၇)	ဝန်ထမ်းများအတွက်ညအိပ်ခရီးစရိတ်မရရှိခြင်း အခက်အခဲ	အိတ်စိုက်ဖြေရှင်း	ညအိပ်စရိတ်များပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်
(၈)	ဆိုင်ကယ်များပျက်စီးခြင်း/မလုံလောက်ခြင်း	အိတ်စိုက်ဖြေရှင်း	တစ်လတစ်ခါစစ်ဆေးပေးရန်၊ ကောင်းမွန်သောဆိုင်ကယ်များအားလုံလောက်စွာ ပေး ရန်
(၉)	ဝန်ထမ်းလစာပေးချေမှုနှောင့်နှေးခြင်း	ခကျေးယူပြီးအိတ်စိုက်သုံးစွဲခြင်း	လစာအချိန်မီထုတ်ပေးရန်
(၁၀)	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ(စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်)စသည့် ပစ္စည်းမလုံလောက်ခြင်း	အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့်ရုံးတက်ရုံးဆင်းလုပ် ခြင်း	တာဝန်ရှိသူများမှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက် ပေးရန်
(၁၁)	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်မလုံလောက်ခြင်း	မိမိစရိတ်ဖြင့်ဖြေရှင်း	တာဝန်ရှိသူများမှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက် ပေးရန်
(၁၂)	အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိခြင်း	သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးသည်	အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိစေရန်
(၁၃)	အခွန်ကိစ္စအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	ကျေးရွာရန်ပုံငွေမှဖြေရှင်းပေးခြင်း	အခွန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပေးရန်
(၁၄)	၀-၆ ပုံစံအနည်းငယ်အားနည်းခြင်း	နားလည်မှုယူပြီးဖြေရှင်းရ	၀-၆ တွင်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ၏ တံ ဆိပ်တုံး သို့မဟုတ် လက်မှတ်ပါရှိခြင်း
(၁၅)	တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဂိတ်များရှိခြင်း ကကြောင့်ပစ္စည်းသယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များ၏ အကူအညီဖြင့်ဖြေရှင်း	သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းပေးစေချင်

(၁၆)	စီမံကိန်းအကဲဖြောင်းနားမလည်ဘဲ facebook မှ ဝေဖန်ခြင်း	သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှပြန်လည်ဖြေရှင်း ရ	စီမံကိန်းအကဲဖြောင်းပိုမိုနားလည်အောင် စီမံကိန်းအကဲဖြောင်းဖတ်စေချင်
(၁၇)	ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင်ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းကကြောင့်အခက်အခဲများစွာရှိ	စကျေးသက်သာသောဆိုင်များမှဝယ်ယူရ	ဒေသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးပစ္စည်းဝယ် ယူခွင့်ပေးရန်
(၁၈)	ရေကြီး၊မိုးကြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်း	ဝန်ထမ်းနှင့်ကော်မတီကျေးရွာလူထုကိုယ် တိုင်ပစ္စည်းများထမ်းပိုးရ	ဒေသအလိုက်စီမံကိန်းအစီအစဉ်ကိုအချိန် ပေးစေချင်
(၁၉)	လူထုစစ်ဆေးပွဲများအတွက်ဧည့်ခံစရိတ်နည်း ပါး	ဝန်ထမ်းများမှစိုက်ထုတ်သုံးစွဲရ	တက်ရောက်သည့်လူဦးရေအတိုင်းထုတ် ပေးစေချင်
(၂၀)	အလှူရှင်များနှင့်တိုက်ရိုက်စကား ပြောရန်ခက်ခဲ	ကိုယ်ပမြောတတ်သလောက်သာပြန်ပြောခဲ့ရ	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းများပေးစေချင်(ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာ/ကွန်ပျူတာ)


မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မိုးကောင်းမြို့နယ် ရွာသာကုန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်ဘီလမ်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

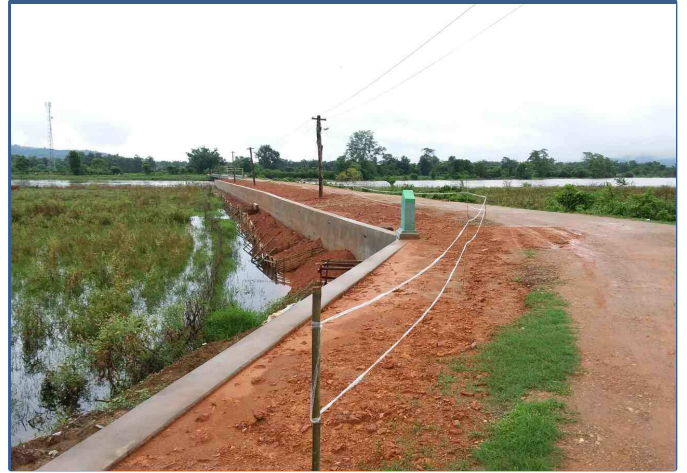

မိုးကောင်းမြို့နယ် မြတောင်ကျေးရွာ  
မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း



မိုးကောင်းမြို့နယ် နန်းခွင်ကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



မိုးကောင်းမြို့နယ် မြို့ဟောင်းကျေးရွာ  
ရေပေးရေးလုပ်ငန်း



ရွှေကူမြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူးများအား  
သင်တန်းပေးခြင်း



ပူတာအိုမြို့နယ်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား  
နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်း

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လွိုင်ကော်မြို့နယ် ထိရိကျေးရွာ  
ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း



ရှားတောမြို့နယ် မထောခူ(အောက်)ကျေးရွာ  
ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း



ရှားတောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းစုစည်းကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ဘော်လခဲမြို့နယ် ဟိုစွဲကျေးရွာ  
ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဝမ်ပန်ကျေးရွာ  
ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း



ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါတချရွာသစ်ကျေးရွာ  
မိုးရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လွိုင်ကော်မြို့နယ် မိုက်ကန်းကျေးရွာ  
ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဖရူးဆိုမြို့နယ် ရော်ဒေါ်ခေါကျေးရွာ  
ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါ်နီကူးကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဖားဆောင်းမြို့နယ် ဝမ်လွဲကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် တနနီလာလဲကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းသောက်ရေသန့်စက်တပ်ဆင်ခြင်း



မယ်စွဲမြို့နယ် မိုက်ကန်းကျေးရွာ  
လက်တူးတွင်းတူးဖော်ခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် နန်းသိုင်းထွန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း




ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မန်ထိုကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ထီးဝါးကလူးကျေးရွာ  
ဂဝံလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း



ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျုံခဝန်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

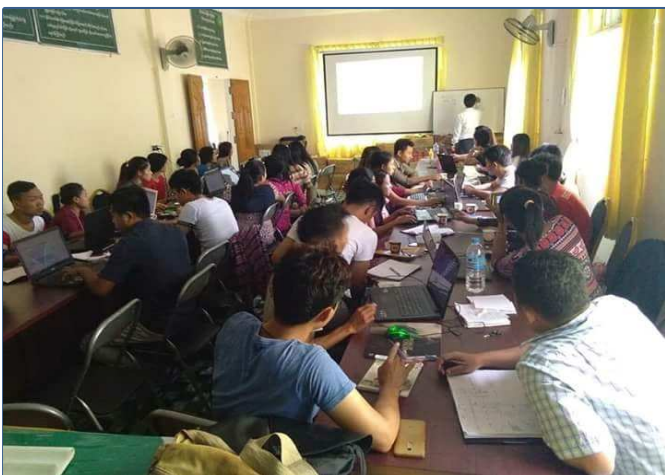

လှိုင်းဘွဲ့၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တွင်  
နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်း



ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် တောင်ဒီးကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မတူပီမြို့နယ် ဘောင်ဂိုး(အထက်)ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ရှင်ဘောင်ကျေးရွာ  
မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း



ပလက်ဝမြို့နယ် ဆင်အိုးဝကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



မတူပီမြို့နယ် ရုန်းကျေးရွာ  
လူကူးကြိုးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



တွန်းဇံမြို့နယ်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအား  
နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်း



ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ခါးပန်းကျေးရွာ  
လူထုနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပလက်ဝမြို့နယ် ကိန်ကင်းကုန်းကျေးရွာ  
လူကူးကြိုးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ပလက်ဝမြို့နယ် ကျီးလေ(အထက်)ကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကန်ပက်လက်မြို့နယ် တုံးငယ်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာကျန်းမာရေးအဆောက်တည်ဆောက်ခြင်း



မတူပီမြို့နယ် နမဒါကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



မတူပီမြို့နယ် ရဲန်ခဲန်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း




ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ရန်စဲကျေးရွာ  
လူထုနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

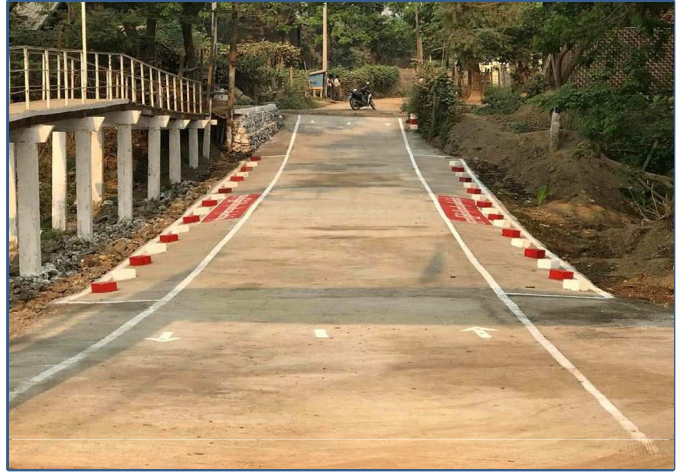

မြောင်မြို့နယ် မြစ်ဆုံကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်ရေကျော်တည်ဆောက်ခြင်း



ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် သာယာကုန်းကျေးရွာ  
ကြိုးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ဗန်းမောက်မြို့နယ် ခမိုးကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဗန်းမောက်မြို့နယ် တာမကျိုင်းကျေးရွာ  
ကျောင်းရေလောင်းအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း



မြောင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မြောင်မြို့နယ် ပရိမ္မကျေးရွာ  
ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း



ဗန်းမောက်မြို့နယ် အရှေ့ကုန်းကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ကျည်ပွေ့သလင်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း



ဗန်းမောက်မြို့နယ် မဲတောကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



မြောင်မြို့နယ် ကျောက်ရစ်(အရှေ့)ကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်ခြံစည်းရိုးလုပ်ငန်း



ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ  
မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း



တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




ကျွန်းစုမြို့နယ် စခန်းသစ်ကျေးရွာ  
ဆိပ်ခံတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



တနင်္သာရီမြို့နယ် သာရသွင်ကျေးရွာ  
ရေဆိပ်ဆင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း



တနင်္သာရီမြို့နယ် သိန္ဓောကျေးရွာ  
မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

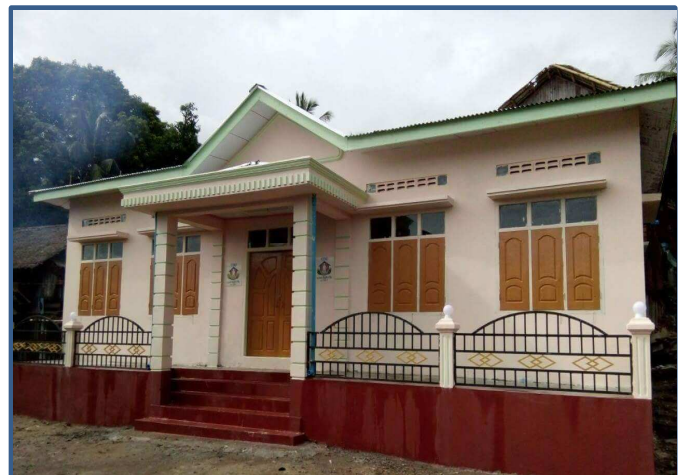

ကျွန်းစုမြို့နယ် လင်မလိုကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



တနင်္သာရီမြို့နယ် လမိုင်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



တနင်္သာရီမြို့နယ် အလယ်ပိုင်းကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေမီတာတပ်ဆင်ခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မိုးညိုမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာကျွန်းပေါ်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ပန်းတောင်းမြို့နယ် အင်းဝင်ကျေးရွာ  
တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ပန်းတောင်းမြို့နယ် ညောင်ခြေထောက်ကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ကြီးမြို့နယ် လပတ်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ကြီးမြို့နယ် တမာခေါကျေးရွာ  
လူထုနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



မိုးညိုမြို့နယ် ဘုရားငူကျေးရွာ  
ရေစင်၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ပေါက်သတောကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



မိုးညိုမြို့နယ် သရက်ကုန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပန်းတောင်းမြို့နယ် သောင်ကြီးကျေးရွာ  
ရေသန့်စက်တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ဒုံးတိုကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



မိုးညိုမြို့နယ် ကျောက်ဝကျေးရွာ  
မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း



ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကျီးပင်ကျေးရွာ  
မြေသားရေလှောင်ကန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဆောမြို့နယ် လောင်းရှည်ကျေးရွာ  
ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း



ပေါက်မြို့နယ် ညောင်ပင်တိုက်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း




မင်းတုန်းမြို့နယ် မဲဇလီကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ဆောမြို့နယ် ရဲရင့်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ပေါက်မြို့နယ် ရွှေပြည်သာကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

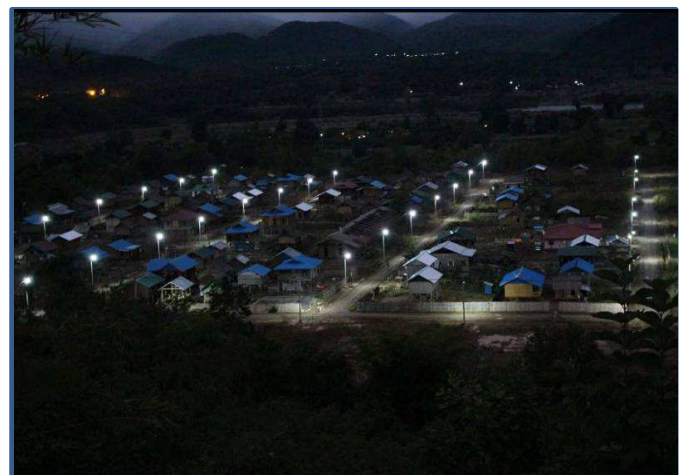

စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ခြင်ပြစ်ကိုင်းကျေးရွာ  
မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ဆောမြို့နယ် ဝက္ကကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



စေတုတ္ထရာမြို့နယ် မဟောတောင်ကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



မင်းတုန်းမြို့နယ် သဖန်းကိုင်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပေါက်မြို့နယ် ကန်တောကျေးရွာ  
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း



စေတုတ္ထရာမြို့နယ် မဏ္ဍပ်ကိုင်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း



မင်းတုန်းမြို့နယ် ချင်းနစ်ကျေးရွာ  
ရေပေးရေးလုပ်ငန်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ညောင်ဦးမြို့နယ် ဆယ်လံကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



နွားထိုးကြီးမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာ  
ရိစာလမ်းခင်းခြင်း



ရမည်းသင်းမြို့နယ် အေးရိပ်မြိုင်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ညောင်ဦးမြို့နယ် အနောက်အုံကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဝါန်းဇွန်မြို့နယ် သာပေါင်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ဝါးစုကြည်ကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ငါန်းစွန်မြို့နယ် ထနောင်းကုန်းကျေးရွာ  
ရိစာလမ်းခင်းခြင်း



ရမည်းသင်းမြို့နယ် တဘက္ကကျေးရွာ  
ရိစာလမ်းခင်းခြင်း




နွားထိုးကြီးမြို့နယ် သနပ်ခါးတောကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ရမည်းသင်းမြို့နယ် ဆေးပုလဲကုန်းကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း



ညောင်ဦးမြို့နယ် ကံသာယာကျေးရွာ  
ရေပေးရေးလုပ်ငန်း

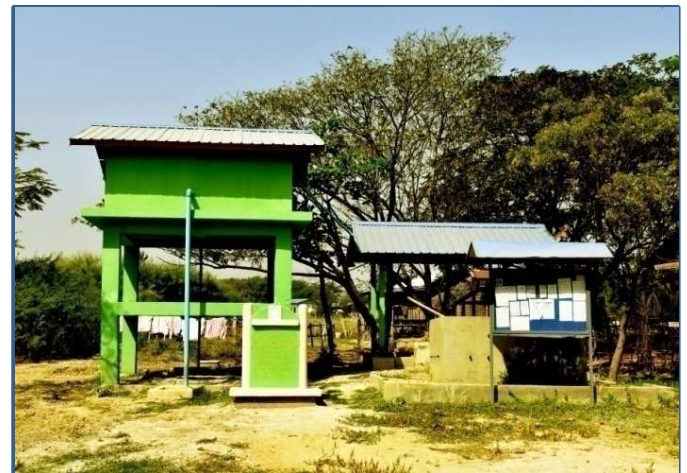

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရုံးပင်ကန်ကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ




ဘီးလင်းမြို့နယ် အလယ်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကွန်ဒိုင်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ပေါင်မြို့နယ် အရှေ့ပိုင်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

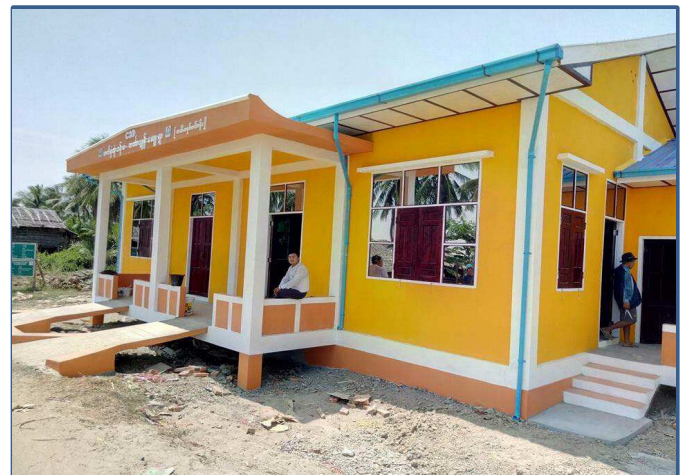

ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဟင်္သာကျွန်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း



ဘီးလင်းမြို့နယ် ကျိုက်တဲကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပေါင်မြို့နယ် ဇာကဒွန်းကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း



မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ပေါင်မြို့နယ် ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ဘီးလင်းမြို့နယ် ကိုးဘဲစုကျေးရွာ  
မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း



ချောင်းဆုံမြို့နယ် ရွာလွတ်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပေါင်မြို့နယ် ကန်ဖြူကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ဘီးလင်းမြို့နယ် အလူးအရှေ့ကျေးရွာ  
လက်တူးတွင်းတူးဖော်ခြင်း



ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကွမ်ရိုက်ကျေးရွာ  
ကျေးလက်ဈေးတည်ဆောက်ခြင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမ်းမြို့နယ် ကိုးကတန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



အမ်းမြို့နယ် နတ်မော်ကျေးရွာ  
သစ်သားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



အမ်းမြို့နယ် ကြက်ရေခမ်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း



အမ်းမြို့နယ် ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



အမ်းမြို့နယ် ကျားမောင်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း



အမ်းမြို့နယ် ဂန့်ကော်တောင်ကျေးရွာ  
လက်တူးတွင်းတူးဖော်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော့မှူးမြို့နယ် ကျိုက်ထော်(မ)ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ကွန်းခြံကုန်းမြို့နယ် ထင်းပုံဆိပ်ကျေးရွာ  
မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း



ကွန်းခြံကုန်းမြို့နယ် အခါတ်ဆိပ်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်တန်းမြို့နယ် တမံကြီးကုန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကျုံကန်ကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းကလေးကစားကွင်းလုပ်ငန်း



ထန်းတပင်မြို့နယ် အနောက်စုကျေးရွာ  
ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော့မှူးမြို့နယ် ပျားမွတ်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ကျောက်တန်းမြို့နယ် ရှမ်းစုကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ကော့မှူးမြို့နယ် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ထန်းတပင်မြို့နယ် ညောင်ဆိပ်ကျေးရွာ  
ရေဆိပ်ဆင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ထန်းတပင်မြို့နယ် အုဖိုလ်ကျေးရွာ  
ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း



ကော့မှူးမြို့နယ် ကျွန်းကလေးကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုပ်ငန်း

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



နမ့်ဆန်မြို့နယ် ညောင်ပင်သာကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပန်ဟိုင်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဝေမိန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းမြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း



ဆီဆိုင်မြို့နယ် လွယ်တော်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



နမ့်ဆန်မြို့နယ် မန်စပ်ကျေးရွာ  
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း



ဆီဆိုင်မြို့နယ် ရန်ကင်းကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ဆီဆိုင်မြို့နယ် ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း



နမ့်ဆန်မြို့နယ် ခွန်ပေါင်ကျေးရွာ  
မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း



နမ့်ဆန်မြို့နယ် မန်ဆာကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ဆီဆိုင်မြို့နယ် ကုလားလန်ကျေးရွာ  
မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း



ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပန်ခရိုင်ကျေးရွာ  
မြေသားရေလှောင်ပြင်တည်ဆောက်ခြင်း



နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဇယန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းလုပ်ငန်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လေးမျက်နှာမြို့နယ် ဇီးကုန်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



ငပုတောမြို့နယ် မဲခရဲကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း



ကြံခင်းမြို့နယ် ကြပ်ကလေးကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



လေးမျက်နှာမြို့နယ် ချင်းလယ်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



သာပေါင်းမြို့နယ် ဘုရားနီကျေးရွာ  
ဆိပ်ခံတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ငပုတောမြို့နယ် ဝါးကတောကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကြံခင်းမြို့နယ် ကြံတောကျေးရွာ  
ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း



လေးမျက်နှာမြို့နယ် မှန်တန်းကျေးရွာ  
ကြိုးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



သာပေါင်းမြို့နယ် သရက်တောကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ကြံခင်းမြို့နယ် သရက်ပင်ကွင်းကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း



သာပေါင်းမြို့နယ် သံကြိုးတိုင်ကျေးရွာ  
ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ဇယုတောမြို့နယ် မြက်တိုပဲကြီးကျေးရွာ  
ဆိပ်ခံတံတားတည်ဆောက်ခြင်း



ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လယ်ဝေးမြို့နယ် ကွမ်းခြံကျေးရွာ  
ရိစာလမ်းခင်းခြင်း



ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ဂမုန်းတောင်ကျေးရွာ  
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း



တပ်ကုန်းမြို့နယ် အဆုံဖီးကုန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



လယ်ဝေးမြို့နယ် ဘုရားကုန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



ပျဉ်းမနားမြို့နယ် စီခေါက်ကျေးရွာ  
ရေပေးရေးလုပ်ငန်း



တပ်ကုန်းမြို့နယ် ကြိုးကြာသာလှကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာ  
ရိစာလမ်းခင်းခြင်းနှင့်အုတ်ရေမြောင်းလုပ်ငန်း



တပ်ကုန်းမြို့နယ် သာယာအေးကျေးရွာ  
ကျောက်ချောလမ်းလမ်းခင်းခြင်း



တပ်ကုန်းမြို့နယ် နွယ်ရစ်ကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း



လယ်ဝေးမြို့နယ် ဘုရားကုန်းကျေးရွာ  
စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုပ်ငန်း



လယ်ဝေးမြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာ  
ရေပေးရေးလုပ်ငန်း



ပျဉ်းမနားမြို့နယ် တပ်ပိုးကျေးရွာ  
ရေစင်၊ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
