ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ပန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လယ်ဂေးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

Village Development Plan (VDP)

လက်ပံတန်းကျေးရွာ၊ အေးချမ်းသာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉

လယ်ဂေးမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

Cluster 1

Clsuter 2

Cluster 3

Cluster 4

လယ်ဧေးမြို့နယ်ပြပုံ

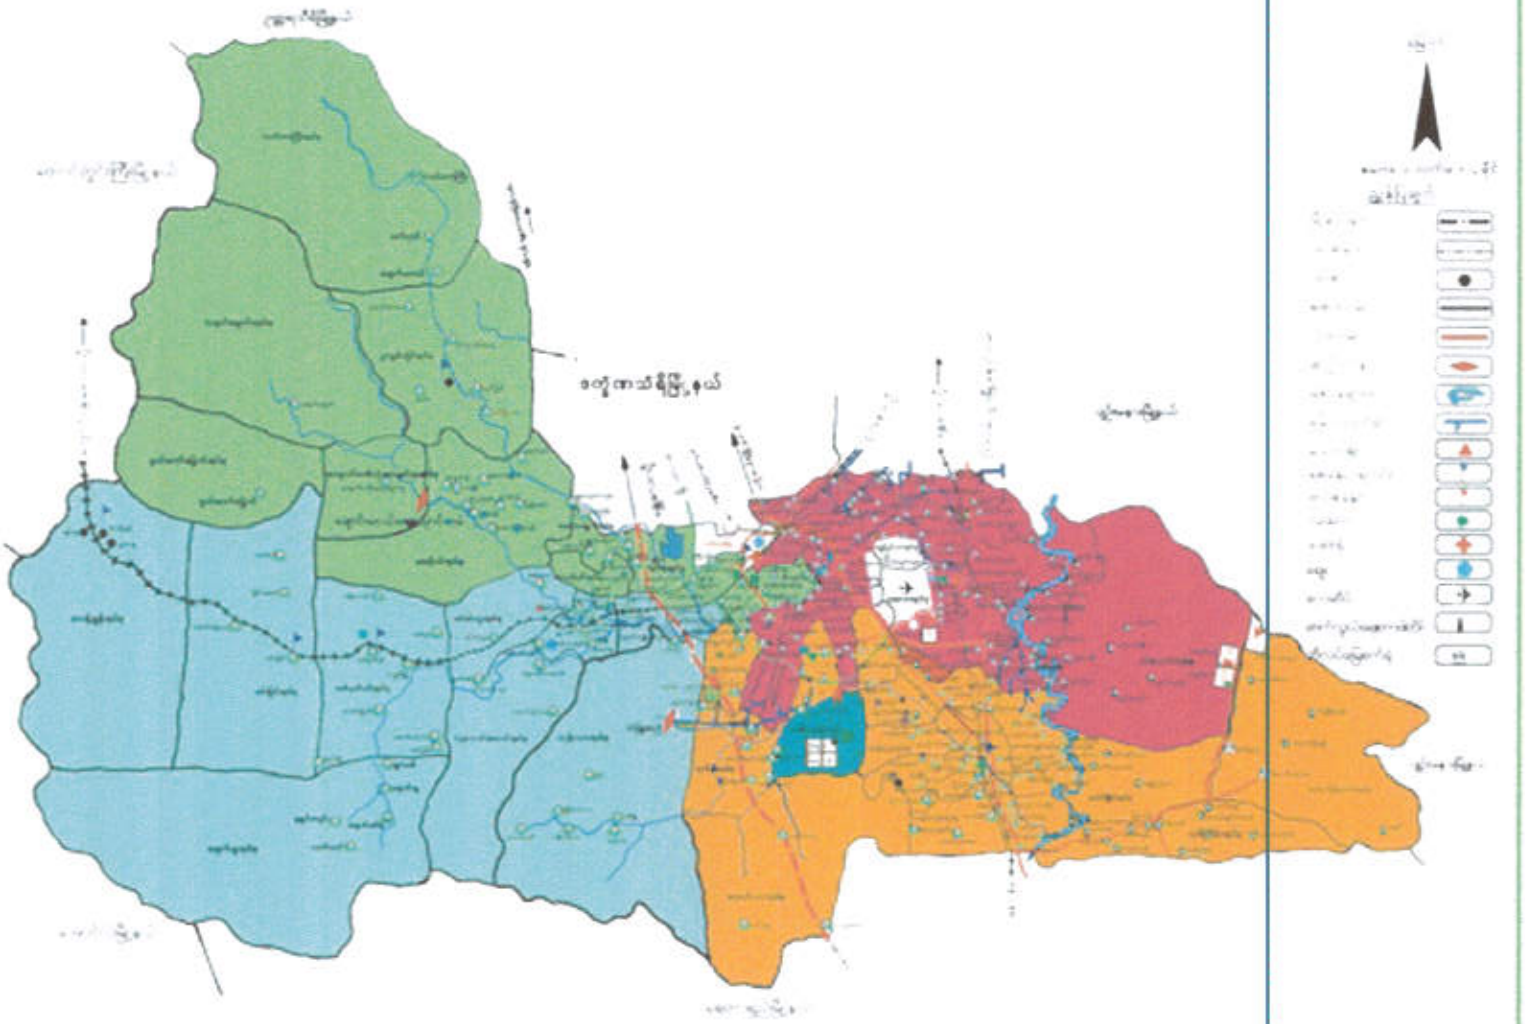

လက်ပံတန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

အေးချမ်းသာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- အေးချမ်းသာကျေးရွာ
- လက်ပံတန်းကျေးရွာ
- ညောင်ပင်သာကျေးရွာ
- အုတ်ဖိုဇောင်းကျေးရွာ
- အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

လက်ပံတန်းဈေးရွာ၏ သမိုင်းကောင်း

နေပြည်တော် လယ်ဝေးဖြိုနယ် အေးချမ်းသာဈေးရွာအုပ်စု

လက်ပံတန်းဈေးရွာသည် ယခင်က လက်ပံပင်များ စီတန်းရွာရှိသော

ကောင်း "လက်ပံတန်း" ဟု အမည်တွင်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၉၀ ခန့်မှ

ထောင်ခဲပြီး ထိုအချိန်က အိမ်ဖြေ ၃၀ ခန့်သာရှိပါသည်။

ရစ်တောင်းဖြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းပါးတွင် ရှိပြီး သွားလာရေး

အလွန်ခက်ခဲသောဈေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ဈေးရွာလူထုမှာ

တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းကျသော

အစိက အားထားလုပ်ကျင်ကြပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁.	ပျဉ်မြုတ်နှင့် အာဇီး အာမြစ်ပြဿနာ	24/5/2016	ဒေတာဒဂုဝန်တဖြာ အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	8	9	အရေခဲ အရောက် အဆိုး လန်းပန်း အက်ဆွယ်ရေး ယဉ်ယာရေး၊ မြစ်၊ချောင်း သစ်တောများ
၂.	ဒုစ္စာရဲ့ ပို့ခြင်းအိုင်ဒြပ် အာဆင်းများသုံးသပ်ခြင်း	24/5/2016	အာဆင်ပြေသောဘုတို အာလပ်အာလစ်ကျေးရွာ သာဓုခေါ်ရွာဟု	8	7	ပို့ခြင်းအိုင်ဒြပ်များသက်မှတ်ခြင်း အာဆင်ဘုဆင်တွင်ပါဝင်တော အဓိကကောင်းစားအရေးကြီး ခဲ့ကြသည်
၃.	ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (ပင်လုံအိမ်)	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	8	9	အာမျိုးသား နှင့် အာမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေ၊ တရားမျှတမှု အရေးအရေးကြီး အချေးခြေးခြင်း
၄.	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	8	8	ရာသီဥတု၊ အသက်ရှူ သန်း၊ ကြောင်း၊ လန်းပန်း၊ အက် ဆွယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေ၊ ဖွားကွဲ့ အရေးရေး
၅.	အမှိုက်အသိုက်အပုံများ ချိတ်အက်မှုပြဿနာ	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	8	10	ကျေး၊ ရွာ အတွင်းနှင့်ပြင်ပ အမှိုက်အသိုက် များ ဝင်၊ ချိတ် အက် မှုအရေးအရေး
၆.	ပြဿနာသစ်ပင်	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	85	103	ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပုံကို အရေးခံပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်း၊ အကျိုး အစီအမံ ပုံဖော်ခြင်း
၇.	အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	85	103	ကျေး၊ ရွာ အတွင်းကို လာရောက် သော အရေးခံ အဆောက် အဦး၊ အခက် အခဲ
၈.	အရင်းအမြစ်	24/5/2016	အာမျိုးသား အာမျိုးသမီး	10	19	ထိန်းသိမ်းသည် အသုံးပြုပုံသည်

အေး:ချမ်းသာခြင်းဆုပ်စု ၊ လက်ပံတန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာထဲက ယူမှုအကျေး ဘုံဝိဟာရ ဖြစ်ပေါ်ပုံ

လက်ပံတန်းရပ်ကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အေးချမ်းသာ နေထိုင်ကြသူများ ပါဝင်သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၉၃) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာနှင့်နီးစပ်ရာတွင် ဒုတ်ကိုးဆောင်းရှိ ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဆွေဘင်ပင်သာရွာ ၊ ရွာမှ ကြောက်ဘက်တွင် အေးချမ်းသာ ၊ အောင်ချမ်းသာ စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား သော ရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ဟင်းပင်းအကယ်ဖြစ် ဆေးအဖျော်ဖြင့် ဦးတွင်အစဉ်တွင် သွားဆေးကို အသက်အဝဲ ဖြိုပါသည်။ ဆွမ်းမောရေး အဖျော်ဖြင့် ဒိုးခုပ်ခြင်း ကျေးရွာသို့ သွားဆေးကုသို့ ပညာရေးအဖျော်ဖြင့် မှုပါတင်း တော်ရိုးပေးပြီး အဆိပ်သင် တန်းကျောင်း ရှိပြီး ဒိုးခုပ်စွဲရွာဖြင့် ၊ ဘုန်းကြီး ရွာ သို့ သွား ရောက်ဝတ်ပြု အဝတ်ဝတ်ခြင်း ကို ဖြုံသို့ဖြစ်ရှိသူ ရွာ သွား ရောက်ဝတ်ကျေပြု ပါသည်။ အဝတ်အစား အဖျော်ဖြင့် သဘာဝဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး ၊ ဟာတောင်း ၊ အင်း စသည်တို့ကို အဓိကိုးကွယ် တိုက်ခိုက်ဖြစ်ပြီး ယူမှုအစဉ်အဖျော်ဖြစ်သော သူရိန်ကြီး ကျောင်း ၊ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ သူ့ဆိုင်ရာ ကောင်းဖက်ဒေဝဆိုင်ရာ ဘိုးချုပ်ဖြင့် ၊ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသား ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား များဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ကျေးရွာ - လက်သံတောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 23.5.2016

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပိုးတွဲ	တပေါင်း
ရိတ်သိမ်းရေး	မြစပါး	ဖြောင့်နှမ်း	ဖြောင့်နှမ်း	မြေစပါး	မြေစပါး	မရှိ	စပါးအိုတ်	စပါးအိုတ် အတံပေါ် ဆိုက်	အတံပေါ်	ပဲမျိုးစုံ	အတံပေါ်တွင်	အတံပေါ်တွင်
ရေဂျုန်မှု	သင့်	သင့်	သင့်	များ	များ	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း
ပွဲတော်	သင်္ကြန်မြို့	-	-	ဆန်ကြီး	-	-	ဖြိုးဆွတ်ပွဲ	-	-	-	-	-
ကျန်းမာရေး	နွားစေး	ဖျားနာဘိုး	-	ဝေဒနာဆွဲ တုပ်ကွေး	-	-	-	-	များ	-	-	များ
သမဝါယမခေါင်းဆောင်များ	ကော်မီး	ကော်မီး	ကော်မီး	မဏ္ဍကော်မီး	မဏ္ဍကော်မီး	မဏ္ဍကော်မီး	မဏ္ဍကော်မီး	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း
မြေဖြန့်ရေး	→	→	→	→	→	ကုန်ခဲ့ပါပြီ		←	←	←	←	←
အရည်အကြိုင်	→	→	→	→	ကောင်းသည်	ကုန်ဆုံး	←	←	←	←	←	←
ဝင်ငွေ	×	×	×	××	×	×	××	×	×	×	×	×
တွက်ခြေ	×××	××	××	×××	×××	×××	×××	×××	××	××	×××	×××

Cluster ( ). CF ---------- TF----------

PRA form –Lewe NCDDP

ကျေးရွာငံးစီးမွားရေးအဖေအရေ

လက်ပံဆန်း ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြမီး လယ်မြေတွင် ပေါ်း၊ မတ်ပဲ၊ နှမ်းသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် ဒီနှံ တွက်ချိန်ဖြစ်သောကြောင်း ပေါ်းသည် ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလ၊ မတ်ပဲတွက်ချိန်ဖြစ်သော တစိုတွဲ၊ ဘပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိကြပါသည်။ မွဲတော်အနေဖြင့် သူ့ရာသီအလိုက် ကျင်းပဖြီး အခြားဆိုင်ရာ မွဲတော်မကျင်းပကြပေ။ လမ်းပန်းခက်သွယ် ရေးအနေဖြင့် မိုးတွင်းအဝါတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် တောင်သူနည်းသည့်အတွက် ကျသမ်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ဆားသောက်အသက်မွေးစမ်း ကြောင်း ပြုကြရပါသည်။ မွေးမြူရေးအနေဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ ဝင်ငွေ/သွက်ငွေအနေဖြင့် မည်မျှသလောက်ပင်ရှိနေကြပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၀)

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 23.5.2016

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
မြစ်	အမျိုးရှ	အမျိုးရှ	ကျေးရွာသူ/သား/မှာ
ကတောကတောင်	အမျိုးရှ	အမျိုးရှ	ကျေးရွာသူ/သား/မှာ
အုတ်	အမျိုးရှ	အမျိုးရှ	ကျေးရွာသူ/သား/မှာ
သဲနုန်းကြီးကျွန်း	ဆရာတော်	ဆရာတော်	ကျေးရွာသူ/သား/မှာ
စာသင်ကျောင်း	ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား	ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား	ကျောင်းသူ/သား/မှာ

Cluster ( ). CF ---------- TF----------

PRA form –Lewe NCDDP

ကျေးရွာအုပ်သိုရိုက်ကွယ်သောနေရပ်စု

လက်ပံဘန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၉၃ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအရ အဆင်ပြေသော အိမ်ပေါင်းစုမှ (၇) အိမ်၊ အလယ်အလတ်မှာ (၇၇) အိမ်ခြေသာရှိပါသည်။ ကျန်သော အိမ်ခြေမှာ ၁၀၉ အိမ်သာ သာမန်လက်လုပ်လက်စားမှား ဖစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသည် လူမှုရေး ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု လက်လွှမ်းမြီသော်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများတွင် ကျေးရွာဒ်ရှိသော မူလဘန်းကျောင်းမှအပ အခြားဝန်ဆောင်မှုမှား ဖြစ်သည်။ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အဝတက်တန်းကျောင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုမှားမှာ လမ်းပန်းဘက်သွယ်ရေးနှင့် ငွေကြေးခက်ခဲသောကြောင့် အရပ်စုကျေးရွာ အေးချမ်းသာရွာနှင့် မြို့သို့သွားရောက်ရန် မလွယ်ကူသောကြောင့် သာမန်လက်လုပ်လက်စား အိမ်ပေါင်းစုများမှာ လက်လွှမ်းမြီနိုင်ခြင်း မရှိသလောက်ပင် ဖစ်သည်။

ဥစ္စမန ကြွယ်ဂမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 23.5.2016

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အခာင်ပြေ	အုတ်ခံ ၊ သွပ်မိုး ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ စက်ကြက်	၇
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး ၊ တရုံကာ ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ မူလတန်း ၊ စက်ဘီး	၇
သာမန်	သက်ကယ်မိုး ၊ တရုံကာ ၊ ကြက် ၊ ဘဲ ၊ လက်လုပ်လက်စား	၁၀၉

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------
PRA form NCDDP -Lewe

ကျားမရေးရာ (၂)

ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ကမက်ပံတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အေး ချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 23.5.2016

အမျိုးသားများ

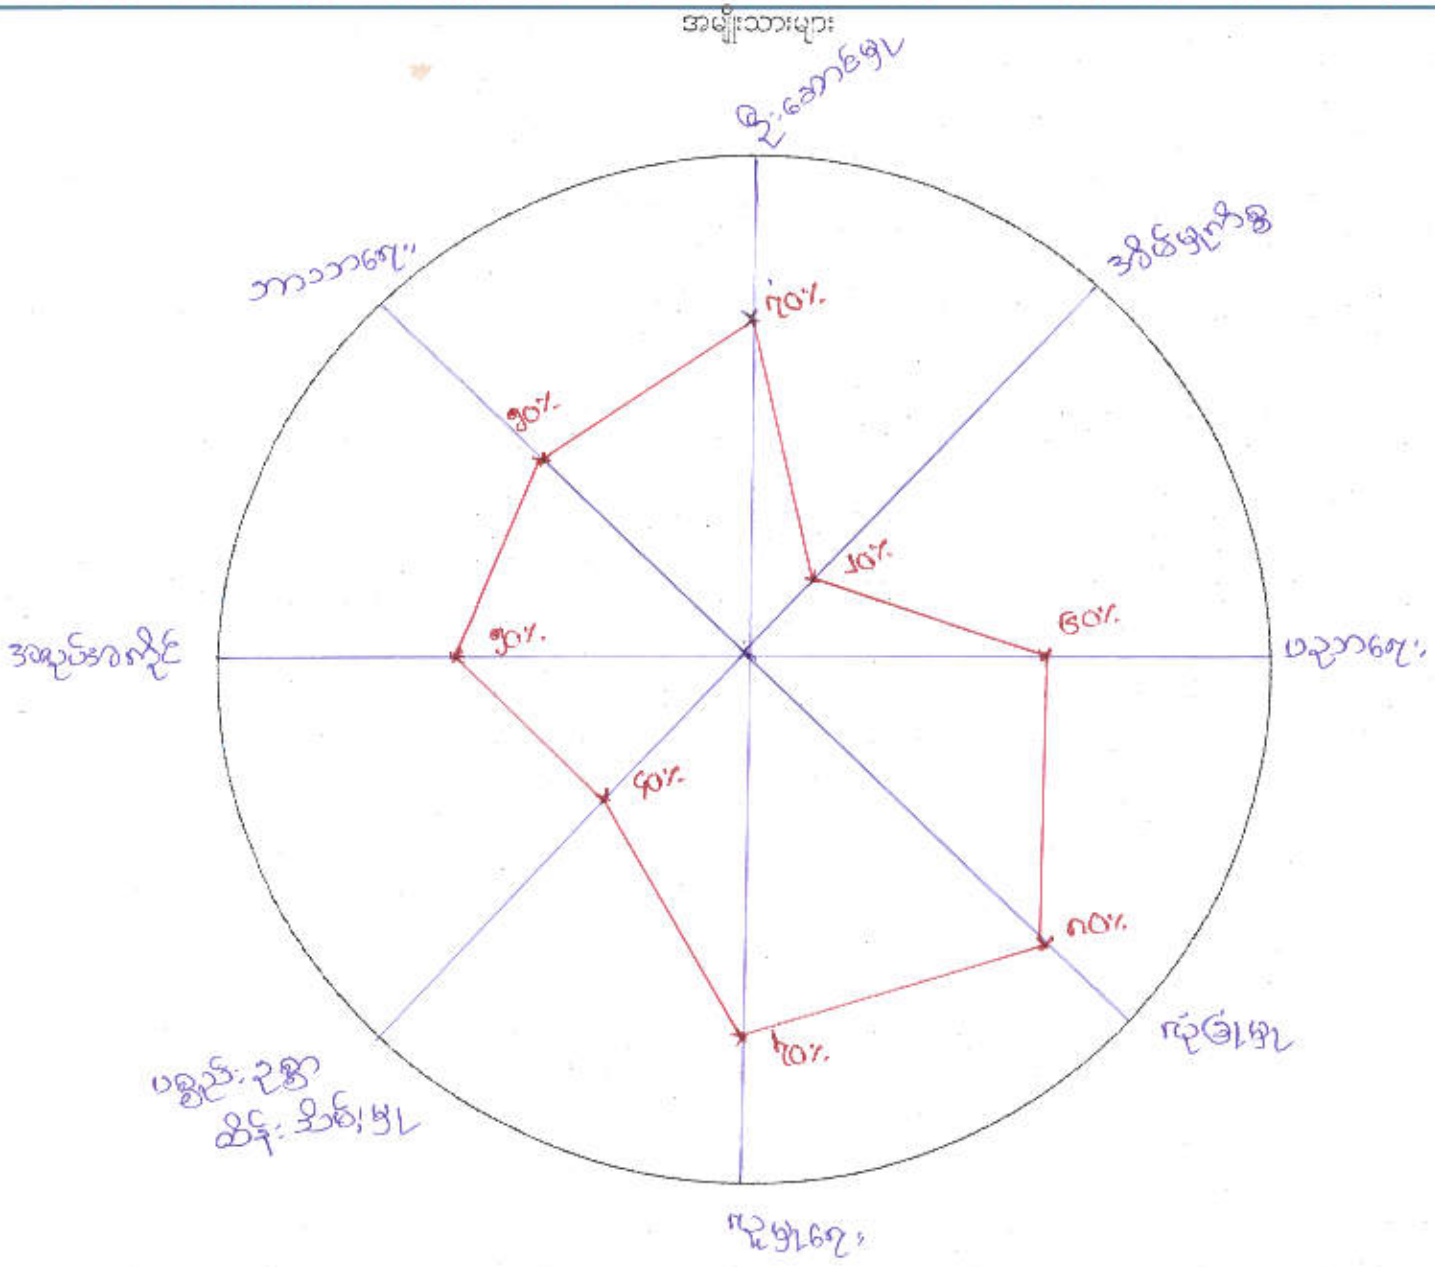

Cluster ( ), CF ----------, TF----------

PRA form –Lewe NCDDP

ကူးမရေးရာ (၂)

ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 23.5.2016

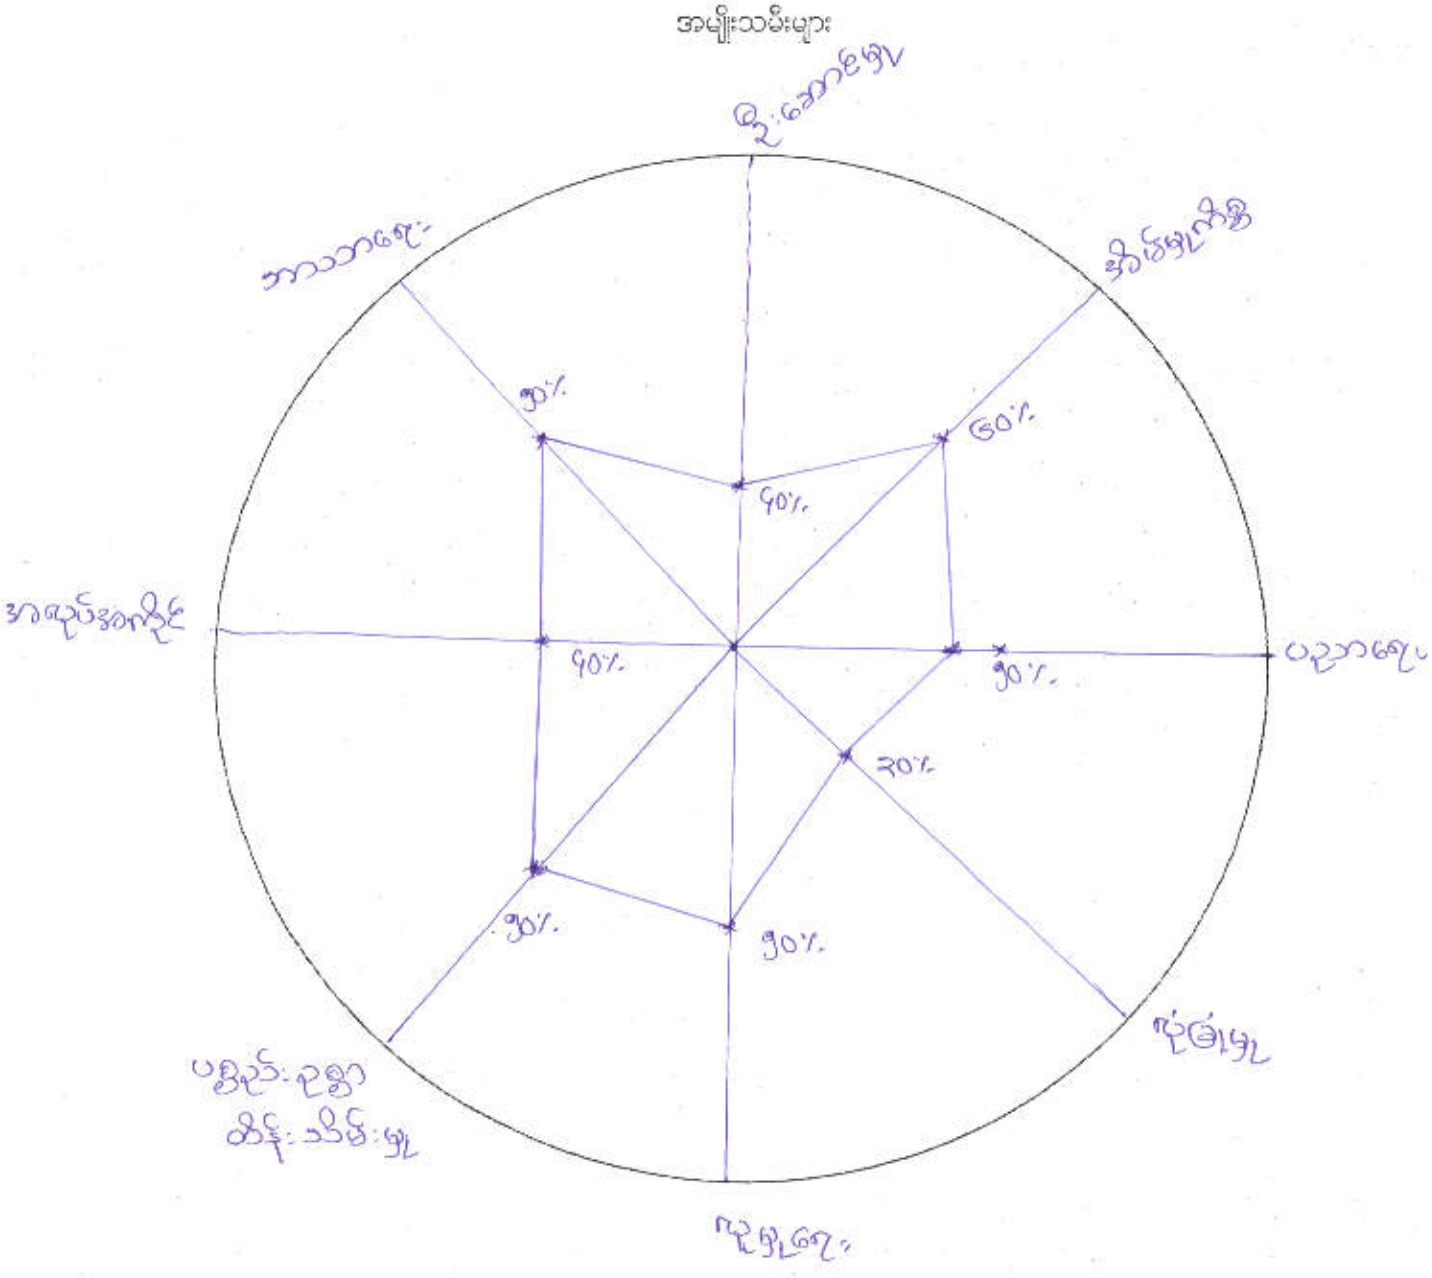

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------

PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးမရွေးရာ

ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ - ဃက်ပဲတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေဝးချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 23.5.2016

အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်

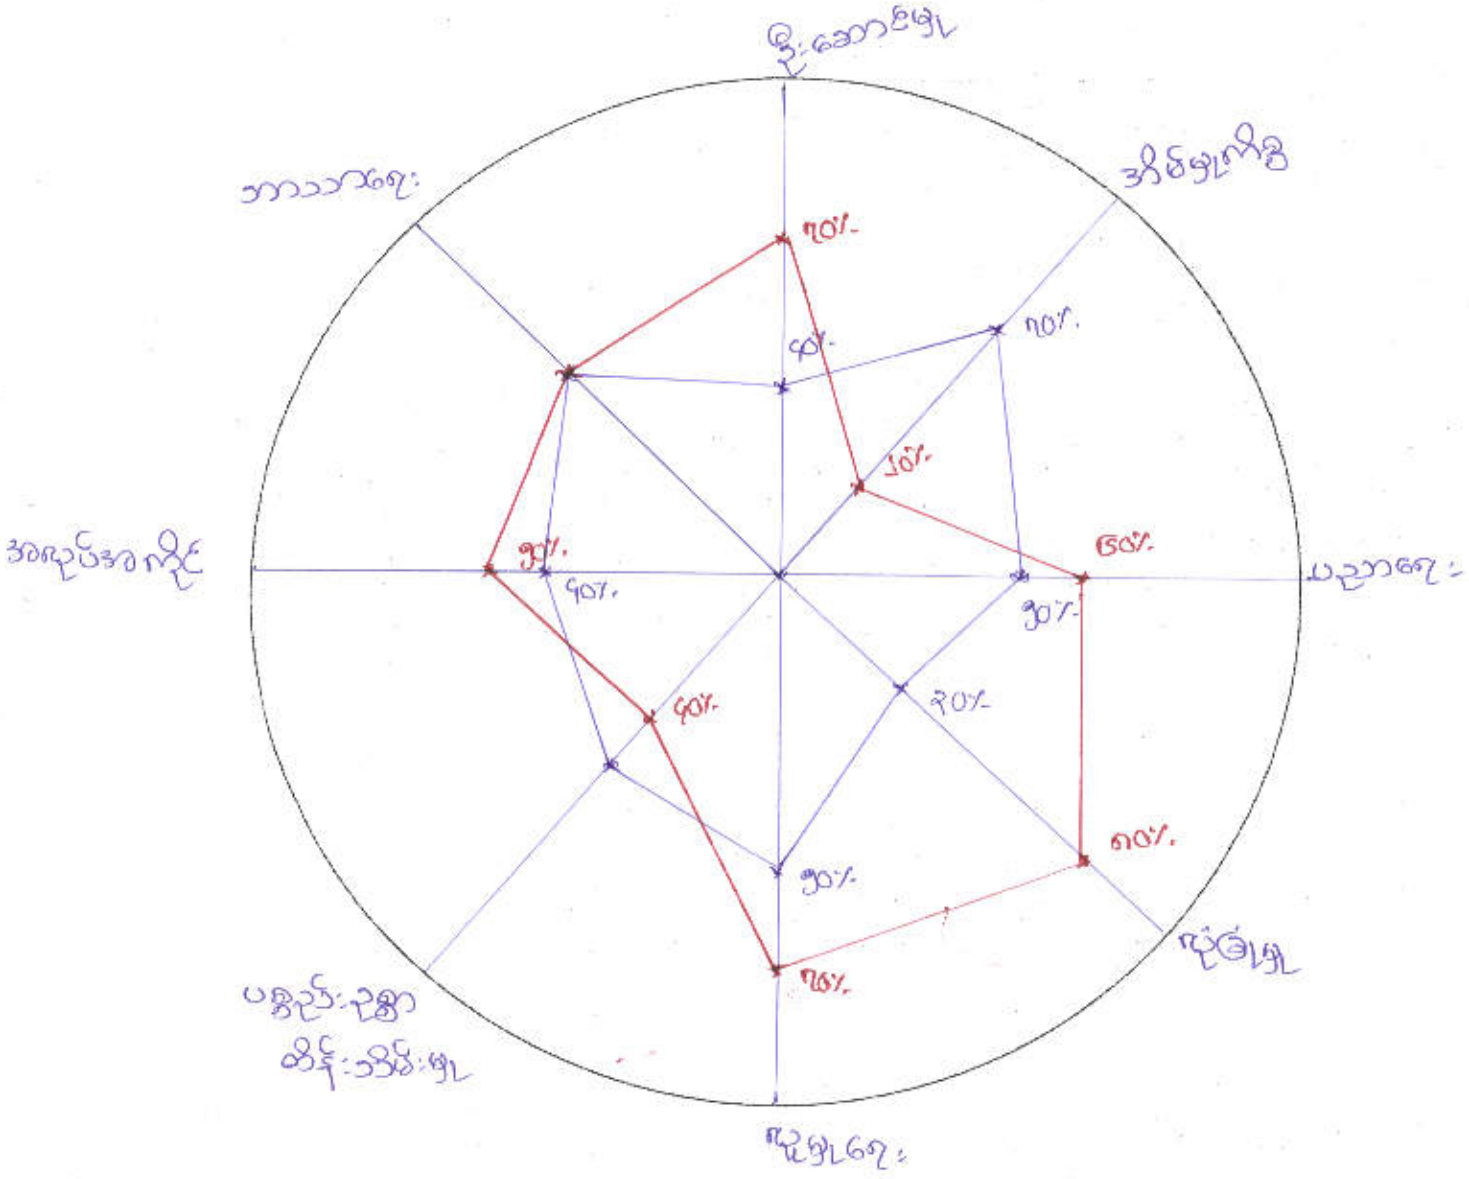

Cluster ( ) CF name----------, ---------- TF name----------

PRA form NCDDP -Lewe

အမျိုးသားဖျိုး၊ သမီးဝင့်ရှေ့အရေးအတွက် ကိုယ်ဝိုင်ရိုက်ရှိ PRA ပုံကူးပြီးဖြေပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြသွားပါမည်။ ဆည်းဝဲရေးမှူး အဆင့်အတန်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အရေးကြီးအရာ	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
မြို့ဆောင်မှု	၇၀%	၄၀%
အိမ်မှုကိစ္စ	၂၀%	၆၀%
ပညာရေး	၆၀%	၅၀%
ကုသရေး	၈၀%	၃၀%
အုပ်ချုပ်ရေး	၇၀%	၅၀%
အခွန်ဥစ္စာဝင်ငွေ သိမ်းမှု	၄၀%	၅၀%
အသုံးဝင်ဆောင်ရွက်	၅၀%	၅၀%
ဘာသာရေး	၅၀%	၅၀%

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ကွဲပြားခြားနားချက်တွင် မြို့ဆောင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကုသမှုရေး စသည်တို့တွင် သိသိသာသာကွာခြားနေပါသည်။ မြို့ဆောင်မှု၊ ကုသမှုရေး ဟူသည်ကတော့ အမျိုးသားများသည် ပေးဆပ်သည့်ကိစ္စတွင်မဟုတ် အမျိုးသမီးများသာ အရေးကြီးလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည်ပင်လျှင် ဂို့ကုသာစဉ်းစားလာအားလုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားများသာ များသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် လုပ်ကိုင်ရမှုကလောသာပင်။ အမျိုးသမီးများများ ကို ရာသစ်ဒေသခံများရ လုပ်ကိုင်ရေးရပါသည်။ ရပ်ဖြေးမှုမှာ အမျိုးသား များသည် အတိုင်းမဟုတ် သွားလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း (၅) ဖွဲ့ခန့်သည် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ခန့်သည် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုကို ကြည့်ခင်းအားဖြင့် အဓိကအားဖြင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်ပီး ရုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ကိုကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း၊ အပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ တူညီစွာရုပ်ဆောင်မှုရုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းနှင့်သာ အဓိက ချိတ်ဆက်ရုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား

(ဘိန်းမုန့် ဒိုင်ယာဂရမ်)

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 23.5.2016

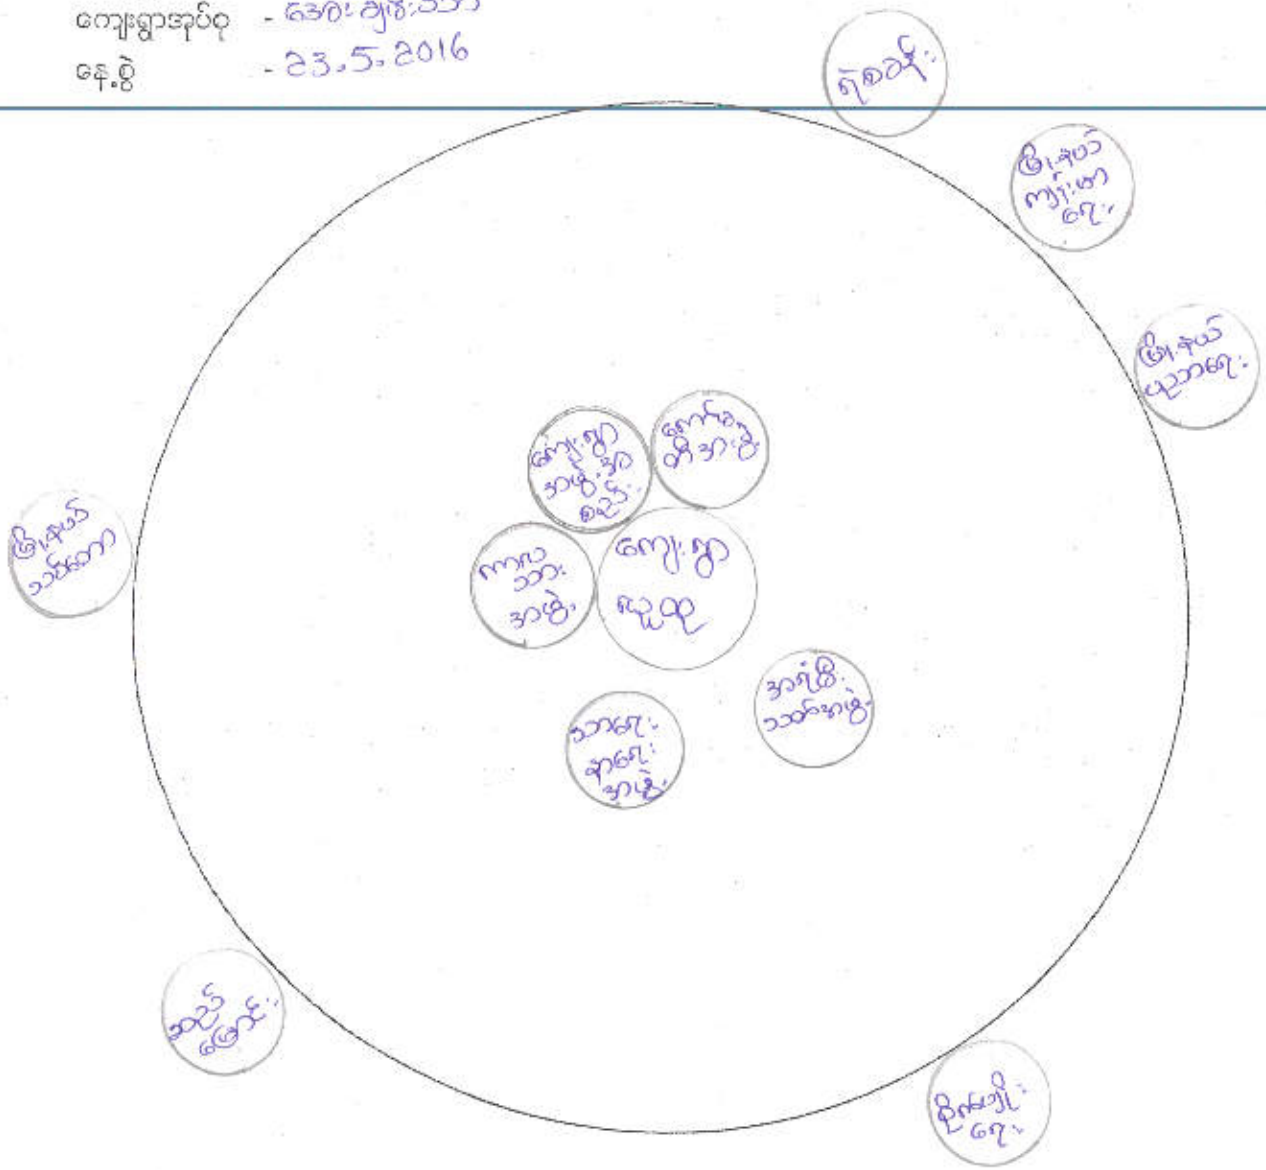

Cluster ( ), CF ----------, TF ----------

PRA form –Lewe NCDDP

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ

နေ့စွဲ - 24.5.2016

1. လျှပ်စစ်ဖီး
2. ရွာအတွင်းလမ်း
3. စာကျောင်းတိုက်
4. ဆေးပေးခန်း
5. စာသင်ကျောင်းပြုပြင်
6. အရုပ်အကိုင်
7. စာသင်ကျောင်းရေကန်
8. ကုန်ထုတ်လမ်း
9. မြစ်ကူးတံတား
10. အားကစားကွင်း
11. ရွာချင်းချက်လမ်း

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

ဦးစားပေး(၁) ရွာအတွင်းလမ်း

ဦးစားပေး(၂) ရွာချင်းခဲတ်လမ်း

ဦးစားပေး(၃) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်

ဦးစားပေး(၄) ကုန်ထုတ်လမ်း

ဦးစားပေး(၅) စာသင်ကျောင်းရေကန်

ဦးစားပေး(၆) စာကျောင်းတိုက်

ဦးစားပေး(၇) ဆေးပေးခန်း

ဦးစားပေး(၈) မြစ်ကူးတံတား

ဦးစားပေး(၉) လျှပ်စစ်ဖီး

ဦးစားပေး(၁၀) အရုပ်အကိုင်

အမျိုးသား

ဦးစားပေး(၁) ရွာအတွင်းလမ်း

ဦးစားပေး(၂) ကုန်ထုတ်လမ်း

ဦးစားပေး(၃) စာသင်ကျောင်းရေကန်

ဦးစားပေး(၄) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်

ဦးစားပေး(၅) ရွာချင်းခဲတ်လမ်း

ဦးစားပေး(၆) လျှပ်စစ်ဖီး

ဦးစားပေး(၇) စာကျောင်းတိုက်

ဦးစားပေး(၈) အားကစားကွင်း

ဦးစားပေး(၉) မြစ်ကူးတံတား

ဦးစားပေး(၁၀) ဆေးပေးခန်း

ဦးစားပေး(၁၀) အရုပ်အကိုင်

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------

PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
သွားလာရေးအခက်အခဲရှိသည်။	ရွာအတွင်းလမ်း
ကျန်းမာရေးကုသရန်အခက်အခဲရှိသည်။	ဆေးပေးခန်း
ပညာသင်ကြားရန် နေရာခက်ခဲသည်။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်
အားကစားလုပ်ရန် ခက်ခဲသည်	အားကစား
လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲရှိသည်	လျှပ်စစ်မီး
ဖြစ်ကူးရန်အခက်အခဲရှိသည်	တံတား
ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိသည်	အလုပ်အကိုင်
စာပေးလေ့လာရန် အခက်အခဲရှိသည်။	စာကြည့်တိုက်
သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိသည်	စာသင်ကျောင်းရေကန်

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------
PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသားများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ကုန်ထုတ်ရန်အခက်အခဲရှိသည်။	ကုန်ထုတ်လမ်း
အခြားရွာသို့သွားရန်အခက်အခဲရှိသည်။	ရွာချင်းဆက်လမ်း

Cluster ( ) CF name----------, ---------- TF name----------
PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - လက်ပံဘန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
သွားလာရေး အခက်အခဲ ရှိသည်	ရွာအတွင်း လမ်း
ဗဟုသုတ လေ့လာရန် အခက်အခဲ	စာကြည့်တိုက်
ယုဘာသင်ကြားရန် နေရာအခက်အခဲ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်
ကျောင်းသူ/သားများ စာကြည့်ရန်အခက်အခဲ	လျှပ်စစ်မီး
ကျန်းမာရေး ကုသရန်အခက်အခဲ ရှိသည်	ဆေးပေးခန်း
အားကစား လုပ်ရန်အခက်အခဲ ရှိသည်	အားကစားကွင်း
ဖြစ်ကူးရန်အခက်အခဲ ရှိသည်	တံတား
ဝင်ငွေ အခက်အခဲရှိသည်။	အလုပ်အကိုင်
ကုန်ထုတ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။	ကုန်ထုတ်လမ်း

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------
PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - အေးချမ်းသာ
နေ့စွဲ - 24.5.2016

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အခက်အခဲများ	မျှော်မှန်းချက်များ
တဖြားရွာသို့သွားရန်အခက်အခဲရှိသည်။	ရွာချင်းခက်လမ်း

Cluster ( ) CF name----------,---------- TF name----------
PRA form NCDDP Lewe

အမျိုးသား အမျိုးသမီး များမှ ဘင်ပြလာသော အခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ကြသော စီမံကိန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား

ဦးစားပေးအခဲ့	စီမံကိန်းအမည်	ရမှတ်
၁	ရွာအသွင်းလမ်း	၃၃၃
၂	ကုန်ထုတ်လမ်း	၁၂၉
၃	စာသင်ကျောင်းရေကန်	၁၁၇
၄	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	၉၄

အမျိုးသမီး

ဦးစားပေးအခဲ့	စီမံကိန်းအမည်	ရမှတ်
၁	ရွာအသွင်းလမ်း	၃၉၇
၂	ရွာချင်းခက်လမ်း	၂၄၉
၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	၂၀၆
၄	ကုန်ထုတ်လမ်း	၁၁၆
၅	စာသင်ကျောင်းရေကန်	၃၀

ပြဿနာဝင်းပင် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လက်ပံတန်း

ကျေးရွာ-ပြီးရွာ အေးချမ်းသာ

- 10.11.17

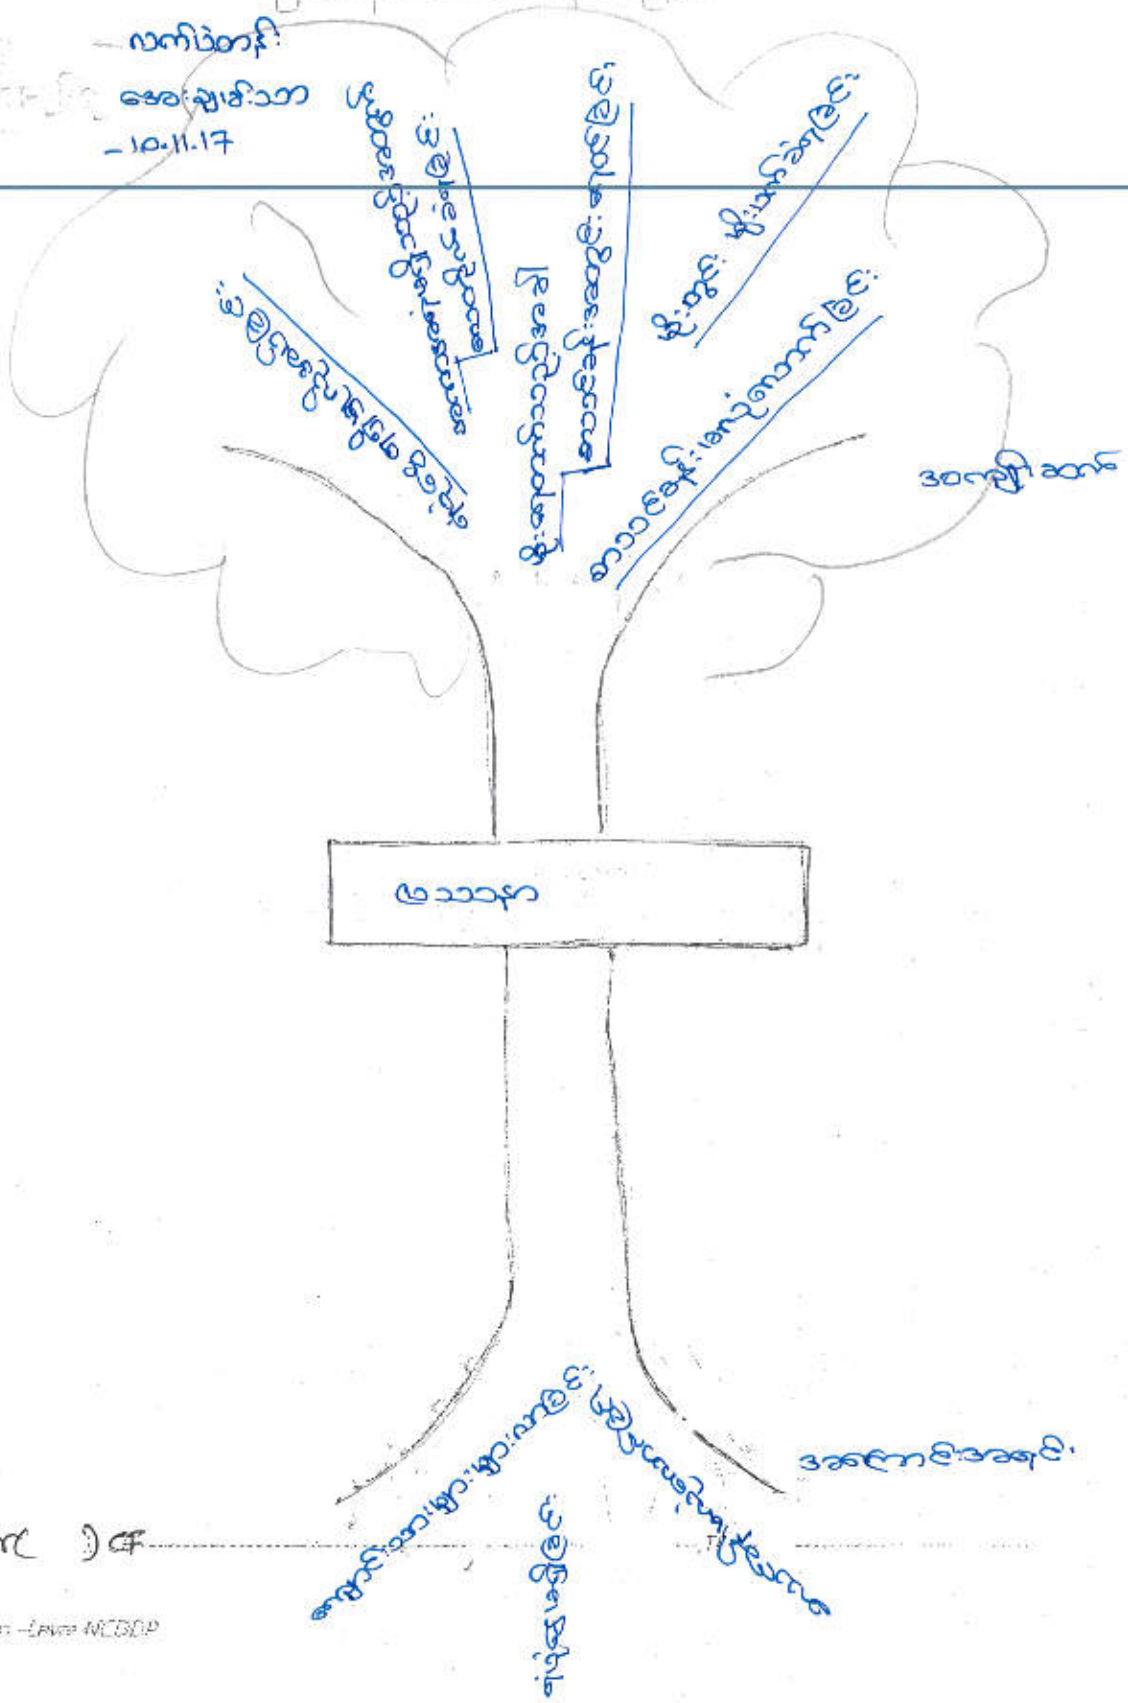

cluster( ) CF

PRA form -Levee NCDDP

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်အဖည်း - အေးချမ်းသာ

ကျေးရွာအဖည် - လက်ပံတန်း

ရက်စွဲ - 10.11.2017

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း (ကျောင်းပြုပြင်)

လက်ပံတန်းကျေးရွာတွင် အသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့် အစီက အကြောင်းအရင်းမှာ အသင်ခန်းမလုံလောက်ရှိ ကလေးမှား မှားသော်လည်း အလွှုရှင် နှင့် ကျေးရွာရံပုံတွေ မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကာ အကျိုးသက်မှားအနေဖြင့် မိုးတွင်းကျော်သည့်အခါ ကျောင်းအသင်ခန်း အတွင်းကျပ်ခြင်း၊ မိုးပက်ခံရခြင်း၊ အသင်ခန်းမလုံလောက်ရှိ ကလေးမှား ညွှန်ညွှန်သပ်သပ် အသင်ရခါ ပညာရေးတွင် မွဲမြိုးမှုနည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

သက်ပဲတန်း ရောဂါခုခံစွမ်းအားသာတိုးတက်ကြွကာကွယ်ဆေးများထိုးခြင်း

ရက်စွဲ 10.11.2017

စဉ်	အမည်	အသက်	ကျား	မ	ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်ရက်စွဲ	လက်မှတ်
1	ဦးမိုးကလျာဉာဉ်	၂၄နှစ်	✓		၁၈၊၁၀၊၂၀၁၇	
	ဒေါ်အေး	"		✓	ဝေဘဲဇုန်အောက်	
	ဦးအောင်မိုးစိုး	"	✓		ဝါးသောက်ကုန်းကြီး	
	ဒေါ်ခိုင်ကလျာဉာဉ်	"		✓	ဝါးသောက်ကုန်းကြီး	
5	ဦးအောင်ကောင်ဝိဏ္ဏ	"	✓		ပေါ်ပေါက်ရွာ၊ ကုက္ကိုင်း	
6	ဦးလိုင်းကျော်	"	✓		ဝေပါ်ပေါက်ရွာ၊ ဖြောင်းဆန်းထိပ်၊	
7	ဒေါ်ဖြူနှင်းဝေ	"		✓	ဝေပါ်ပေါက်ရွာ၊ ဆေးပေါ်ဝင်	
8	ဦးခင်မောင်ဖြိုး	"	✓		ဆောင်ကုန်းကြီး၊ ကြယ်ရွာ၊	
9	ဒေါ်ဆာဝီးဝိုင်း	"		✓	ဆောင်ကုန်းကြီး၊ ကြယ်ရွာ၊	
10	ဒေါ်ဖြိုးအိခိုင်	"		✓	ဆောင်ကုန်းကြီး၊ ကြယ်ရွာ၊	
11	ဦးဇင်ဝပိုနှိုး	"	✓		လဆုံးပတ်ထိန်းသိမ်း၊ ရွာ၊	
12	ဒေါ်ဆွေဟဉ်	"		✓	လဆုံးပတ်ထိန်းသိမ်း၊ ရွာ၊	
13	ဒေါ်အိခိုင်	"		✓	လဆုံးပတ်ထိန်းသိမ်း၊ ရွာ၊	
14	ဦးလိုလို	"	✓		ကျေးရွာဌေးကျင်းတိုင်	
15	ဦးဆောခိုင်	"	✓		ဆားပေါတိုင်ကြား၊ ဝေဖြူမြစ်၊ ရွာ၊	
16	ဒေါ်ဟဘေဝင်း	"		✓	ဆားပေါတိုင်ကြား၊ ဝေဖြူမြစ်၊ ရွာ၊	

အေးချမ်းသာ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ရက်စွဲ - 28.11.17

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာသူး / တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းဆိန်း	✓		ဥက္ကဋ္ဌ အုပ်စု စီ/ထောက်	
၂	ဒေါ်မော်မော်		✓	"	
၃	ဦးအောင်ရိုင်းဦး	✓		ဥက္ကဋ္ဌ အရွာသူး	
၄	ဒေါ်သီသီဝင်း		✓	စာရင်းကိုင် "	
၅	ဒေါ်မာမာအေး		✓	ငွေကိုင် "	
၆	ဦးကျော်ငွေ	✓		အဖွဲ့ဝင် အုပ်စု စီ/ထောက်	
၇	ဒေါ်စိန်လှတ်ညီ		✓	" "	
၈	ဦးဖိုးတုတ်	✓		" "	
၉	ဦးခောင်ငွေ	✓		" "	
၁၀	ဒေါ်ခမခလေး		✓	" "	
၁၁	ဒေါ်မာလာတ်ညီ		✓	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၁၂	ဒေါ်ငွေဦး		✓	"	
၁၃	ဦးလယ်ကျော်	✓		"	
၁၄	ဦးကိုကို	✓		"	
၁၅	ဦးကျော်စိုင်ဦး	✓		"	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လစ်လျှော့နှုန်းခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝိဘ်ခက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူဦးရေမှူးသည် ကျေးရွာ ဧရိယာဧကောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းခံတိဆက်အဝင်းဝေးတွင် လူထုဝင်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဒြိုးစနာက်တွင် လူထုဝင်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ပါသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ကြိုးကျိုးကြိုး	၀၉/၇၄၀၄၀၃၄၁၁	ကြိုးကျိုးကြိုး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	လပတ်ဝေး	အေးချမ်းသာ	လက်ပံတန်း

တး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၆
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးဒုက္ခရှင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၁၆	၄၄၂
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်စွဲးငြိး	၁၅၆	၂၁

(၅) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကဲ ကာလုံးဆောဆောင်များ

သယ်ဆောင်သူသိ	အမှတ်ပြုပြီ	ကျွန်းမောဒေး	အမှုပ ပြုပြီ	တားဆေးခြင်း အဒေသာက် ဘတ်ပုံများ	အမှုပ် ပြုပြီ
အထက်ဘန်းဒေကျာင်း	□	ဒေးရံ	□	ဒေတီ	☑
အလယ်ကန်းဒေကျာင်း	□	ကျွန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးဒေကျာင်း	☑
မူလတန်းဒေကျာင်း	☑	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားဒေကျာင်း	□
မူကြိုဒေကျာင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ဒေကျာင်း	□
အခြား	□	ဘဏ်ခြား	□	ဓလီ	□

					အခြား	☐	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(၈) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်သားမှု (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ဘို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၀) အသင်းကျောင်း			(၂) ကွန်ရက်ရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဘုရားပန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်တောက်ကုန်းဟာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ၊	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၀၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်တြိမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ဟွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဂျိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၀) လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဒီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြုစုခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်---------/မသိပါ

(၃) ဤဒီမံချက်ကို ဖြန့်ဝေမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၀) ဤကျေးရွာနှင့်ဗဟို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောင်းကြီးသို့ရောက်ရန် ---------

အခြား ---------

ခွဲရောင်းဆိုင်သို့ ---------

အခြား ---------

(၈) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခဲ့ဖူးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဝင်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လုထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------
(၂) ----------

(၃) အထွေထွေအစိုးရှုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအစိုးရှုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ်

အမည်

နေ့စွဲ 10.11.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ်

အမည်

နေ့စွဲ 10.11.17

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစောင့်ကြပ်အစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစောင့်ကြပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီပြီးဆုံးပါက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာနှင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်းတမ်း အမည် ခြိ. ကျိုက်ခိုင်

ဒေသ.စွဲ

စောင့်ကြပ်အားအားမှတ်ခြစ်ပါ ☐ ၁ကိမ်ပြီး(၁) ☐ စောင့်ကြပ်ပြီး (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် | မြို့နယ် လသင်းစေ: | ကျေးရွာအုပ်စု အေစကျေးခါး သဘာ | ကျေးရွာ လက်ပံတန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူဦးရေ		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်ဒေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀-၁၁-၁၇	၁၀-၁၁-၁၇	၁၇	၆၄	၁၂၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀-၁၁-၁၇	၁၀-၁၁-၁၇	၁၇	၆၄	၁၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈-၁၁-၁၇	၂၈-၁၁-၁၇	၂	၂	၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	5.1.18	5.1.18	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄၂	၅၃	၉၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄၂	၅၃	၉၇

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄၂	၅၃	၉၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄၂	၅၃	၉၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၄၂	၅၃	၉၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁	၁	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁	၁	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၅.၁၈	၁၅.၅.၁၈	၁	၁	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၁၈	၂၄.၅.၁၈	၁၁	၃၁	၁၂၆
၉။ လုထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၅.၁၈	၂၄.၅.၁၈	၁၁	၃၁	၁၂၆

လူထုစတိုပြု စီမံကိန်း၊ ဝီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

[illegible]

[illegible]

၈။ အစက်အစဲအစာအစက်များအားစွေးစွေးခြင်း - ပဉ္စလက်စ်အဝင်ကျသောဇယား ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစ်ကျအစက်အစဲအစာအစက်များသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား သမီး အမည်းဆုံအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အစဲအစာအစက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အစဲအစာအစက်များ	
၁	မိုးတွင်းအစါသွားလာရန်ခက်ခဲ	၁	မိုးတွင်းအစါသွားလာရန်ခက်ခဲ
၂	စာသင်ကျောင်းမကောင်းသည်းအခက်ခဲ	၂	စာသင်ကျောင်းမကောင်းသည်းအခက်ခဲ
၃	မိုးတွင်းအစါမျောင်းကမ်းပါးမျှားရေတိုက်စာရေ	၃	မိုးတွင်းအစါမျောင်းကမ်းပါးမျှားရေတိုက်စာရေ
၄		၄	သည်းခက်ခဲ
၅		၅	

၁။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	မိုးတွင်းအစါသွားလာရန်ပြုပြင်ရမည်	၁	မိုးတွင်းအစါသွားလာရန်ပြုပြင်ရမည်
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ပေးပါကကျောင်းသား/သူ	၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ပေးပါကကျောင်းသား/သူ
၃	မျှားစာသင်ကြားရာတွင်ပြုပြင်ရမည်	၃	မျှားစာသင်ကြားရာတွင်ပြုပြင်ရမည်
၄	ကျေးရွာပိုင်ရေးမျှားကာကွယ်ရိုင်းခဲ	၄	ကျေးရွာပိုင်ရေးမျှားကာကွယ်ရိုင်းခဲ
၅		၅	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်	
၁	ရွာချင်းခတက် + နိုးရွာနှင်လမ်း	၈ + ၁၁			အကျုံးမဝင် အညီအောင်
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	၈ + ၁၁			
၃	ရေကာတာ	၈ + ၁၁			
၄					
၅					

လူထုဇတ်ပြု ဝိမံကိန်း၊ ဝိမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ယ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမပင်သော ဦးတည်ရာ ဖွံ့ဖြိုးလိုလာကိမ္မ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

၁			
၂			
၃			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်၊

အမည် ဦးအောင်မြင့်မျိုး လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 10-11-17

ဒေါ်ခိုင်လှကည် [signature] 10-11-17

ဆရာမကြီး သဘာ ဘုရားပန်း ၊ လောက်ပဲတန်း ကျောင်းမှာ လူသုံးဖတ်ပြုစီမံခန့်ခွဲရေး

တတိယသင်ခန်းစာကိုပါ

ပထမအခြေခံပြီးဆုံးကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝနိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်ရေးအတွက် အလွန်လည်း အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းသားဘဝကစပြီး ဆရာဘဝကိုရောက်လာသည်အထိ — အများအပြားသော အခွင့်အလမ်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါသည်။ ခဏကလေးကျ တာဝန်ကျ စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့မှ စ၍ တိတ်ဆောက်စကား ပြောကြားပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ (၃၅) ချက်အထား ရှင်းလင်းခွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တို့အောက် တတိယဘဏ္ဍာစီစနစ်ဝန်းတွင် ကျောင်းသားတွေက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ မပေးခင် ကျောင်းသားတွေ ဦးစားပေး ① ဘာသာရပ်ခုတက် (၃ အတွဲ၊ ၁၀၀)

① စာသင်ကျောင်းကြည့်ခြင်း

② ဆရာလောင်း

တို့ကို ကျွေးမွေးသင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ခြင်းများသည်၊ အပေး ကျောင်းဘဏ္ဍာစီခန့်ခွဲရေးအတွက် အရေးကြီးသည်။ ကျောင်းဘဏ္ဍာတွင် အသုံးပြု ပေးပို့ကြပါသည်။ ပေးပေး ကျွေးမွေးသင်ကြားပြီးသော ခေတ်ကောလာဝတီတစ်ခုချင်းစီကို ပေးပေး ကျွေးမွေးသင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယတန်းမှ ကောလာဝတီဝင် (၃၀၀) ဦးကို ကျွေးမွေးသင်ကြား ပြီးသော ပထမကောလာဝတီဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ တာဝန်ကျ ကျောင်းတစ်ခုလုံးတွင် ခွဲတမ်းချက်များ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝနှစ်ချုပ်အခွေးအနေ ဖြင့် အစည်းဆေးကို ဖေဆော်ဖြင့် ချွေးသပ်သပ်ခြင်း ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်တော်၏ တင်ပြသူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဦးကျော်ဇင်ဦး

ရာထူး - ၄

သက်ဝင်တင်ပုံ

ရောဂါဆေးသွဲ့(၄) ကြားများသောအဆိုပ်များအတွက် ဦးစားပေးပေးနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း
အကဲဖြတ်ပုံ

မှတ်ချက်။ ။ VPSC တွင်ဆောင်ရွက်သည့်အသွင်အပြင်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန် ဤပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့်အကွက်များကို မိတ္တူကူးယူ TPTC သို့ပို့ဆောင်ပေးပါရန် ဖော်ပြပါရသည်။

	စဉ်	ကုမ္ပဏီအမည်	ထုတ်လုပ်သည့်ဆေးအမျိုးအစား	ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည် (ယူနစ်) ဖော်ပြပါ	မြို့နယ်အလိုက် ဆေးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှု
ဦးစားပေးကုမ္ပဏီများ	၁	ရွှေချမ်းဆက်ဆေး (ဆည်းဖြောင့်ဖေါ်)	☑ ၁ ☑ ကျား		
	၂	ရေကာတာ	☑ ၂ ☑ ကျား		
	၃		☐ ၃ ☐ ကျား		
	၄		☐ ၄ ☐ ကျား		
	၅		☐ ၅ ☐ ကျား		
ဒုတိယအဆင့်ကုမ္ပဏီများ	၆		☐ ၆ ☐ ကျား		
	၇		☐ ၇ ☐ ကျား		
	၈		☐ ၈ ☐ ကျား		
	၉		☐ ၉ ☐ ကျား		
	၁၀		☐ ၁၀ ☐ ကျား		
ပြင်ပကုမ္ပဏီများ	၁၁		☐ ၁၁ ☐ ကျား		
	၁၂		☐ ၁၂ ☐ ကျား		
	၁၃		☐ ၁၃ ☐ ကျား		
	၁၄		☐ ၁၄ ☐ ကျား		
	၁၅		☐ ၁၅ ☐ ကျား		
	၁၆	စာသင်ကျောင်း ဖြူပြင်	☑ ၁၆ ☑ ကျား		
			☐ ☐ ကျား		
			☐ ☐ ကျား		

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာစေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး ကိုကို	09-250097896	63ကသက်မာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဟသံ60:	ကျေးရွာအုပ်စု ဂြဲးချိုးဘား	ကျေးရွာ လမ်းပေါ်: တန်:

64 ပြည်60က

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	176	ဘာသာ (၁) ----------	176
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	0		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	8		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	416	442
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	156	20

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	မူကြိုကျောင်း	☐		တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐		ဓေတီ	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလွန်ကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
	အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
	အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရိုဆလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------- ၁၀ မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---------- ၁၅ မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

~~(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်~~

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------- ၆ ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကိုကို

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်မာဝင်း	
ရက်စွဲ 3 - 8 - 2018	စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) ကဲ့သက်ပန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေပြာ၁၆ကာ	မြို့နယ် ၈၀၁၆၀ : ကျေးရွာအုပ်စု ၆၈ : ချဉ်း ၁၁၁ ကျေးရွာ လက်ပတ်တန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.8.2018	3.8.2018	46	82	128	128	ဗမာ		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.8.2018	3.8.2018	46	82	128	128	ဗမာ		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	23.8.2018	23.8.2018							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	16.1.2019	16.1.2019	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8.2.2019	8.2.2019	52	49	101	101	ဗမာ		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.2019	14.2.2019	66	73	139	139	ဗမာ		

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.2019	14.2.2019	66	73	139	139	ပြီး		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.2019	14.2.2019	66	73	139	139	ပြီး		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.2019	14.2.2019	66	73	139	139	ပြီး		
၇။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.3.2019	28.3.2019	41	25	66	66	ပြီး		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	28.3.2019	28.3.2019	41	25	66	66	ပြီး		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	28.3.2019	28.3.2019	41	25	66	66	ပြီး		
၈။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	18.7.2019	18.7.2019	59	83	142	142	ပြီး		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	18.7.2019	18.7.2019	59	83	142	142	ပြီး		

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သောက်ချောဝင်း

နေ့စွဲ ၃.၆.၂၀၁၈	စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ပန်း(၀) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)ဆိုက်ပန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် လယ်ဝေး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ဆျန်းသာ	ကျေးရွာ လက်ပဒင်တန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ဥင်္ဂုတ်တုတ်လမ်း၊ မျှားဖောက်၊ သဘွား၊ လာဇရ၊ ခမာခံ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆာဘင်ကျောင်း၊ ခြံဆည်း၊ ဥင်္ဂုတ်၊ အိုးခေါဘကိုသတ်၊ ဘခမာခံ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆာဘင်ကျောင်း၊ ရေဝင်ရေထွက်ဆည်း၊ ဘခမာခံ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဇီးဆား၊ လေးခရိ၊ မြက်ခေါဘကြောင်ကျရိ၊ မောကြာ၊ ဘတွင်းခုပ်၊ ဂိုးဖြစ် ဂျသဘွဲ့ခမာခံ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
မြို့၊ တွင်း၊ ဘခါ၊ ခရောင်း၊ ကဖြစ်၊ ပါး၊ မျှား၊ ရေဝင်ရေထွက်၊ ဂိုးဖြစ် ဂျသဘွဲ့ ဘခမာခံ	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ဥင်္ဂုတ်တုတ်လမ်း၊ မျှားဖောက်၊ လှိုင်သဘွား၊ လာဇရ၊ လှိုဟင်းကျေးဖောင့်	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆာဘင်ကျောင်း၊ခြံဆည်း၊ ဥင်္ဂုတ်၊ အိုးခေါဘကိုလှိုင်သဘွဲ့ခမာခံ ရေဝင်ရေထွက်	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဆာဘင်ကျောင်း၊ ဖြေဖျောက်လှိုင်ဆာဝေး၊ မျှား၊ အဘင်ရေဝင်ရေထွက်ဆည်	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ဇီးဆား၊ လေးခရိ၊ ဂျသိုလှိုင်ကျရိ၊ မောရေ၊ အတွင်းခုပ်ဂိုးဖြစ် ကောင်းမွန်မည်	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
ခြစ်ဝေကောင်၊ ဖြစ်ရေ၊ ကာဝတာ ဖြည်ပျံဝေး၊ လှိုင်သဘွဲ့ ဘခမာခံ ရေဝင်ရေထွက်ဆည်	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင်သတ် မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာသျှင်းစက်လယ်ကုန်တင်လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၁	15360000	416	442	
၂	စာသင်ကျောင်းဖြိုသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	〃		၂		416	442	
၃	စာသင်ကျောင်းဖြေဖျို	〃		၃		416	442	
၄	ကျန်းမာရေးစင်းပေးခြင်း	〃		၄		416	442	
၅	ရေတွင်းဖြစ်ရေကာတာ	〃		၅		416	442	
၆								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှပဝစ်မြို့အသစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ	〃	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---- ဦးရဲအောင်ရိုးမြို့ ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ---- 3.8.2018

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဝဲဒေး၊ချမ်း၊သာဒုယ (လက်ပန်းတန်း၊ မီကျေးကွင်း)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကွင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန်	ရေလယ် (၁၀) နာရီ
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန်	နေ့လယ် (၄:၃၀) နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ	၃၊ ၈၊ ၂၀၁၈
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ	ကျား-46 ဦး ၊ မ-82 ဦး
ရည်ညွှန်းချက်	ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

(၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
(၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရုံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(800)ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

(၁) ကွ ချင်းဆက်ယန်း + ကုန်ထုတ်ယန်း
(၂) ဆာသင်ကျောင်းမြို့ခုံးဂိုး ၅၄. ဗိုလ်ဘာ
(၃) ဆာသင်ကျောင်းမြေဖို့
(၄) ကျန်မာရေးဝေးပေးဆန်း
(၅) ခစ်တောင်းမြစ်ရေကာတာ

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(46)ဦး၊ အမျိုးသမီး (82)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်သက်မာဝင်း
မှတ်တမ်းတင်သူ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းဘိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်မော်မော်	"		✓	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးအောင်ရိုင်မိုး	"	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဘီဘီဝင်း	"		✓	အုပ်စု စာရင်းကိုင်	
၅	ဦးခန်းရိုင်	"	✓		ငွေကိုင်	
၆	ဦးကိုဇော်	"	✓		အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးဖိုးတုပ်	"	✓		အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဘန်းဘန်းအေး	"		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်မာမာအေး	"		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်ခိန်လှကြည်	"		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁					အဖွဲ့ဝင်	
၁၂					အဖွဲ့ဝင်	
၁၃					အဖွဲ့ဝင်	
၁၄					အဖွဲ့ဝင်	
၁၅					အဖွဲ့ဝင်	
၁၆					အဖွဲ့ဝင်	
၁၇					အဖွဲ့ဝင်	
၁၈					အဖွဲ့ဝင်	
၁၉					အဖွဲ့ဝင်	
၂၀					အဖွဲ့ဝင်	

လက်ပန်ကျ်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမဲလေး	မုဒ္ဓ	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်တင်အေးတွေ	မုဒ္ဓ		✓	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဦးအောင်ရိုင်မိုး	မုဒ္ဓ	✓		စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခိန်လှကြည်	မုဒ္ဓ		✓	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၅	ဦးအောင်ကြည်ဂွေ	မုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)	
၆	ဦးတိုင်းကျော်	မုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေး(မှတ်တမ်းထိန်း)	
၇	ဒေါ်ဆလီမိုး	မုဒ္ဓ		✓	ဝယ်ယူရေး(အဖွဲ့ဝင်)	
၈	ဦးခင်မောင်မြင့်	မုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်တင်မာဝင်း	မုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်ခင်သန်းမြိုင်	မုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးမြင့်သိန်း	မုဒ္ဓ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂	ဒေါ်ဒေစီ	မုဒ္ဓ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၃	ဒေါ်ဂွေယူ	မုဒ္ဓ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၄	ဦးကိုကို	မုဒ္ဓ	✓		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၁၅	ဦးဆောရိုင်	မုဒ္ဓ	✓		အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	
၁၆	ဒေါ်မော်လီဆိုး	မုဒ္ဓ		✓	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအဝဥ်များ

လက်ပံတန်း ကျေးရွာ အေးချမ်းသာ ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဝဥ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	မြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
	၀	ဘာသာရေးကျောင်း	ကျား [46] မ [82]			
ဦးစားပေးလေ့လာစေလိုသည့်ကိစ္စရပ်များ	၂	ဒေသခံ ၆၀ ခန့် မရရှိကာတာ	ကျား [ ] မ [ ]			
	၃	ကွန်ကရစ်တံတား	ကျား [ ] မ [ ]			
	၄	ကြိုးတုတ်လမ်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၅	ဘာကွန်ကရစ်ကိုက်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၆	ဂတ်စ်တန်းကျောင်	ကျား [ ] မ [ ]			
ဒေသခံပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ	၀	ခရိုင်နှိမ့်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂	ဆက်သွယ်ရေး + ပင်ရင်းဆန်ခြင်း	ကျား [ ] မ [ ]			
	၃	တိုက်ဆွန်မှုနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၄	ဆက်ဒ်သုံးပြဿနာတွင်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအတွက်	၀	စေး ပေး ချ	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂	ကြေးစီးဘူတာမြို့	ကျား [ ] မ [ ]			
	၃	ဇင်း ခါး ကျွမ်းကျင်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအတွက်	၀	လျှပ်စစ်မီး	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
အခြား	၀	ဒေသန္တရပန်းချီပုံစံများ	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
